

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial Loja**

**PROYECTO: K005** MTOP - Ampliación de la carretera El Emplame-Celica-Alamor y su mantenimiento, incluye la construcción del Puente Laramine

Líder del Proyecto:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina (bhurtado@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA EL EMPALME - CELICA - ALAMOR Y SU MANTENIMIENTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAR, Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Rojas Cazar, Walter Emilio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.35
CUP:	175200000.506.4188	TIR:	15.20 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	10,569.14
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	42,845,998.22
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/07/2010 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	23/03/2018	Fecha de Fin Base:	30/11/2015
Modificado por:	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: En este proyecto se ejecutara la ampliación de la vía El Emplame-Celica-Alamor y rectificación del eje de la misma con un ancho promedio de 8.70 m cuya calzada será construída de hormigón rígido, con una longitud de 50.80 Km.

Contratista: Cía Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
 Fiscalizador: Asociación VG (Viastra - Geovial).

LINEA BASE: El proyecto permite la conexión intercantonal, el proyecto concluyó en el mes de agosto de 2013, a partir de esta fecha inicia la etapa de mantenimiento rutinario.

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

**Beneficios Cualitativos**

La construcción de la vía beneficia al turismo  
 Favorece al comercio interprovincial  
 Mejora la calidad de vida de los usuarios

**Tipo de Beneficiario**

Se benefician el sector agricultor, los transportistas, comerciantes, etc.  
 Se benefician los pueblos de Celica-Alamor.

**Restricciones**

El contrato se debe realizar conforme al cronograma establecido.


**Restricciones**

Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad que brinde mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado, y que sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 22/07/2010 Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

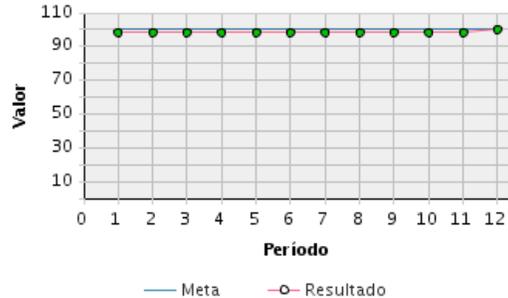

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Pendiente de pago planilla de trabajo emergente a la contratista CEE.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/01/2018 - 03:54 PM
Noviembre 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Pendiente de pago planilla de trabajo emergente a la contratista CEE.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/12/2017 - 02:52 PM
Octubre 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Pendiente de pago planilla de trabajo emergente a la contratista CEE.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/12/2017 - 02:50 PM
SEPTIEMBRE 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía. Pendiente de pago planillas de mantenimiento	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/10/2017 - 11:47 AM
AGOSTO 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/09/2017 - 11:20 AM
JULIO 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/08/2017 - 10:42 AM
JUNIO 2017:		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.		
MAYO 2017: Proyecto terminado, con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	09/06/2017 - 11:03 AM
abril 2017  Personal y maquinaria del MTOP-Loja realiza trabajos de mantenimiento de la vía	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 09:59 AM
enero - marzo 2017  Personal y maquinaria del MTOP-Loja realiza trabajos de mantenimiento de la vía Marzo 2016.- Con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 09:59 AM
ABRIL - DICIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP-Loja realiza trabajos de mantenimiento de la vía Marzo 2016.- Con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	05/05/2017 - 09:59 AM
Mayo 2016.- Personal y maquinaria del MTOP-Loja realiza trabajos de mantenimiento de la vía	CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA	03/06/2016 - 12:47 PM
Abril 2016.- Personal y maquinaria del MTOP-Loja realiza trabajos de mantenimiento de la vía Marzo 2016.- Con fecha 29 de marzo de 2016 se aprueba Acta de Recepción Definitiva. Personal y maquinaria del MTOP-Loja, realiza trabajos de mantenimiento de la vía, especialmente en limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	04/05/2016 - 02:10 PM
Febrero 2016.-Revisión y suscripción de Acta de Recepción Definitiva del proyecto.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	06/04/2016 - 12:20 PM
Enero 2016.- En trámite Recepción Definitiva del proyecto.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	03/03/2016 - 01:39 PM
Diciembre 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/01/2016 - 04:09 PM
Noviembre 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	07/12/2015 - 12:13 PM
Octubre 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/11/2015 - 03:07 PM
Septiembre 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/11/2015 - 03:07 PM
Agosto 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbos trabajos realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	10/09/2015 - 09:52 AM
Julio 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbos trabajos realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	10/09/2015 - 09:52 AM
Junio 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Ludeña Granda, Luis Alfredo	16/07/2015 - 10:45 AM
Mayo 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbos ocasionados por la fuerte estación invernal, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	01/07/2015 - 09:56 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2015.- Se encuentra en etapa de mantenimiento, realizando trabajos de limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbes por la fuerte estación invernal, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Ludeña Granda, Luis Alfredo	08/06/2015 - 02:40 PM
Febrero 2015.- En este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento, como limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/03/2015 - 12:16 PM
Enero 2015.- En este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento, como limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/03/2015 - 09:53 AM
Diciembre 2014.- En este proyecto se encuentra en etapa de mantenimiento, como limpieza de cunetas, roza mano, limpieza de alcantarillas por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/02/2015 - 10:15 AM
NOVIEMBRE.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, como limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	08/12/2014 - 08:02 AM
OCTUBRE.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/11/2014 - 10:11 AM
SEPTIEMBRE.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	09/10/2014 - 02:42 PM
AGOSTO.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	03/09/2014 - 10:56 AM
JULIO.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	04/08/2014 - 08:02 AM
JUNIO.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:36 PM
MAYO.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	04/06/2014 - 10:05 AM
ABRIL.- 2014. El proyecto se encuentra en la etapa de mantenimiento, se realiza el mantenimiento de la vía, con limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, derrumbes etc.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/05/2014 - 04:12 PM
Marzo 2104.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento, la vía se encuentra en la etapa de mantenimiento rutinario.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 05:30 PM
Febrero 2104.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento, la vía se encuentra en la etapa de mantenimiento rutinario.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	07/03/2014 - 10:40 AM
Enero 2104.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento, obra en etapa de mantenimiento.	Ramon Bustamante, Victor Manuel	09/02/2014 - 12:19 PM
Diciembre 2013: En trámite planilla de liquidación; una vez aprobada planilla de liquidación se procederá a suscribir el acta de recepción provisional.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	07/01/2014 - 01:28 PM
Noviembre 2013: En trámite planilla de liquidación; una vez aprobada planilla de liquidación se procederá a suscribir el acta de recepción provisional	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/12/2013 - 11:11 AM
Octubre: En trámite planilla de liquidación; una vez aprobada planilla de liquidación se procederá a suscribir al ectat de recepción provisional	Carrión Rojas, Hernán	04/11/2013 - 04:21 PM
Septiembre 2013.- El 27 de septiembre de 2013 se realiza la recepción provisional de los trabajos, que estuvo a cargo de la comisión que fue designada por el Director Provincial, se está elaborando la planilla final de liquidación, a partir de esta fecha el proyecto entra en la etapa de mantenimiento el mismo que durará 24 meses.	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 10:02 PM
Agosto 2013.- Los trabajos se encuentran terminados al 30 de agosto de 2013, fecha de terminación de las obras de acuerdo al contrato complementario No. 2, por lo que se ha cumplido con lo programado, y los trabajos estan listos para la recepción provisional.	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:01 PM
JULIO 2013.- Los trabajos se desarrollan con normalidad, se aprobó el contrato complementario No. 02, con ampliación de plazo de 60 días sin incremento de monto, por la ejecución de trabajos adicionales de acuerdo al Decreto Presidencial 451. Se establece la fecha de terminación de los trabajos el 30 de agosto de 2013.	Ludeña Granda, Luis Alfredo	05/08/2013 - 03:32 PM
JUNIO 2013.- Luego de haber terminado la estación invernal, los trabajos se reiniciaron con normalidad, está en tramite un contrato complementario con ampliación de plazo de 60 días por obras adicionales, sin incremento de monto, teniendo previsto terminar la obra el 30 de agosto de 2013. MAYO 2013.- Los trabajos están suspendidos por la presencia de la fuerte temporada invernal en la zona de desarrollo del proyecto, por lo que el Hito 11 y 12 (terminación de trabajos y liquidación económica), e indicadores se encuentran en amarillo. Los trabajos se reiniciarán una vez que la temporada invernal se termine, esto es el 01 de junio de 2013. El contratista realiza trabajos de mantenimiento en la vía.	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 04:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2013: Los trabajos están suspéndidos por la presencia rigurosa del invierno, por lo que hito no. 11 y 12(terminacion de trabajos y liquidación económica) e indicadores se encuentran en amarillo. Se anexa informe de suspensión de trabajos. El contratista reraliza trabajos de mantenimiento en la vía.</p>	Ludeña Granda, Luis Alfredo	06/06/2013 - 11:23 AM
<p>MARZO 2013: Los trabajos están suspéndidos por la presencia rigurosa del invierno, por lo que hito no. 11 y 12(terminacion de trabajos y liquidación económica) e indicadores se encuentran en amarillo. Se anexa informe de suspensión de trabajos. El contratista reraliza trabajos de mantenimiento en la vía. FEBRERO 2013.- Tramos 2: Se continua colocando el hormigón hidráulico en la calzada en el tramo Mercadillo-Alamor en dos frentes de trabajo, además de la colocación de la sub-base, base, sub-drenes y construccion de cabezales en alcantarillas. se termina el lanzamiento de las vigas en el puente Laramine y se realiza el encofrado para el tendido del hierro. Tramo 1: Se realiza trabajos de señalización, colocación de guardavías y construcción de cunetas en algunos sectores. ENERO 2013.- Se realizan trabajos de colocación de hormigón hidráulico en la capa de rodadura en el tramo Mercadillo-Alamor, además de la construcción de obras de arte y drenaje. Se está realizando trabajos de señalización vertical en ambos tramos. En falla geológica de Celica se está proponiendo realizar los estudios respectivos. Además se realiza lanzamiento de vigas de puente Laramine.</p>	Carión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 11:01 AM
<p>DICIEMBRE 2012.- En el tramo 1 El Empalme- "Y" de Pozul, se continúa colocando material para afirmados, colocación de hormigón hidráulico en la calzada de la vía, así como construcción de cunetas revestidas y obras de arte; en el tramo 2 "Y" de Pozul-Alamor, se trabaja en la colocación y tendido del material para afirmados, colocación de hormigón hidráulico en la calzada de la vía, construcción de alcantarillas metálicas, construcción de cunetas revestidas y muros de hormigón armado, así como continúa la construcción del puente Laramine.</p>	Ludeña Granda, Luis Alfredo	08/01/2013 - 07:49 AM
<p>NOVIEMBRE 2012. Continúa colocación de hormigón hidráulico en la capa de rodadura en ambos tramos; movimiento de tierras por concluir; siguen en: construcción de alcantarillas, colocación de material de mejoramiento, sub-base y base, construcción de cunetas revestidas en los dos tramos y construcción del puente laramine; los trabajos se realizan con normalidad. Se legalizó el contrato complementario Nro. 1 por USD 3'891.323,08 y ampliación de plazo por 162 días, estableciéndose la nueva fecha para terminación de obra el 31 de marzo de 2013. OCTUBRE 2012. Continúa colocación de hormigón hidráulico en la capa de rodadura en ambos tramos; movimiento de tierras por concluir; siguen en: construcción de alcantarillas, colocación de material de mejoramiento, sub-base y base, construcción de cunetas revestidas en los dos tramos y construcción del puente laramine; los trabajos se realizan con normalidad. Se presentan lluvias en la zona del proyecto. Se legalizó el contrato complementario Nro. 1 por USD 3'891.323,08 y ampliación de plazo por 162 días, estableciéndose la nueva fecha para terminación de obra el 31 de marzo de 2013. SEPTIEMBRE 2012. Al momento se realizan los siguientes trabajos: colocación de hormigón hidráulico en la capa de rodadura en ambos tramos; movimiento de tierras; construcción de alcantarillas; colocación de material de mejoramiento, sub-base y base; construcción de cunetas revestidas, en ambos tramos, se continua con la construcción del puente laramine, los trabajos se realizan con normalidad. La nueva fecha para terminación de obra por la estación invernal es el 20 de octubre de 2012. Adicionalmente por incremento de cantidades se tramita un contrato complementario con ampliación de plazo. AGOSTO 2012. Al momento se realizan los siguientes trabajos: colocación de hormigón hidráulico en la capa de rodadura en ambos tramos; movimiento de tierras; construcción de alcantarillas; colocación de mejoramiento, sub-base y base; construcción de cunetas; además se continúa con la construcción del puenete Laramine, los trabajos se realizan con normalidad. La nueva fecha para terminación obra por estación invernal es el 20 de octubre de 2012. Adicionalmente por incremento de cantidades se tramitqa un contrato complementario con ampliación de plazo. JULIO 2012. Se trabaja en la colocación de la capa de rodadura de hormigón hidráulico en los dos tramos, en movimiento de tierras, construcción de alcantarillas, afirmados, construcción de cunetas y colocación de mejoramiento, sub-base y base, además se construye el puente Laramine. JUNIO 2012. Se realizan trabajos de movimiento de tierras, afirmados y colocación de hormigón en calzada, así como en obras de arte. MAYO 2012. Tramo I (El Empalme - Y de Pozul): Trabajos en estabilidad de taludes con la construcción de terrazas; limpieza de derrumbes, reconfiguración de la subrasante desde la abscisa 11+350 hasta la 13+820; acabado de obra básica abscisas 8+000 hasta la 13+500; tendido de subbase</p>	Piedra Gálvez, José Salvador	10/12/2012 - 08:47 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y base clase 1, colocación de pavimento rígido, construcción de sobreanchos, cabezales de alcantarillas, cunetas. Tramo II (Y de Pozul - Alamor): Se realiza limpieza de derrumbes y mejoramiento de la subrasante con material de mejoramiento.</p> <p>ABRIL 2012.</p> <p>El contratista realiza trabajos de limpieza de derrumbes, bacheos, encauzamientos de cunetas, limpieza de alcantarillas y drenajes, la</p> <p>Fiscalización realiza trabajos de controles de obra y de laboratorio con el chequeo de los hormigones a compresión y flexión de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.</p>		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>3- REGIONAL. Ambiental.</b></p> <p>La estación invernal en la etapa de mantenimiento CAUSARÍA riesgo de cierre de la vía</p>	20/04/2017	Blanca Paulina Hurtado Angamarca	20 %	20	4	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Celica

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Contrato Firmado	3-Adjudicación	29/07/2010		29/07/2010		Sí	3.0
2	EJECUCIÓN: Anticipo Entregado	4-Inicio de Trabajo	17/08/2010		17/08/2010		Sí	3.0
3	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos, entregado.	4-Inicio de Trabajo	17/08/2010		17/08/2010		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Trabajo de muros de retención ejecutados año 2012, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.21
5	EJECUCIÓN: Trabajos ambientales año 2012, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.4
6	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada año 2012, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	34.94
7	EJECUCIÓN: Trabajos de movimiento de tierras año 2012, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	19.34
8	EJECUCIÓN: Trabajos de señalización, año 2012, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.45
9	EJECUCIÓN: Trabajos de drenaje año 2012, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	11.89
10	EJECUCIÓN: Infraestructura Puente Laramine, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.75
11	EJECUCIÓN: Superestructura Puente Laramine, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.75

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	CIERRE: Liquidación económica ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		31/12/2017		Sí	1.5
13	EJECUCIÓN: Trabajos de la obra, terminados.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	17.27
14	CIERRE: Acta de recepción provisional ejecutada.	5-Entregables Intermedios	27/09/2013		27/09/2013		Sí	1.5
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario primer semestre año 2014 (Limpieza de cunetas, alcantarillas, derrumbes, roza a mano), ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario segundo semestre año 2014 (Limpieza de cunetas, alcantarillas, derrumbes, roza a mano), ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.5
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes), primer trimestre año 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes), segundo trimestre año 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes), tercer trimestre año 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes), cuarto trimestre año 2015, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	14/01/2016		14/01/2016		Sí	0.25
21	COMPLETADO: Acta de recepción definitiva, ejecutada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva, acta de recepción definitiva, ejecutada.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/04/2016
2	Finaliza mantenimiento rutinario del proyecto, supervisión positiva	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/01/2016
3	Supervisión positiva, 85% de avance de conservación vial	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/06/2015
4	Recorrido tramo El Empalme Celica	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	22/12/2014
5	Estado de la vía El Empalme-Celica-Alamor	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/10/2014
6	Recorrido en la vía El Empalme-Celica-Alamor	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	26/08/2014
7	Constatación del avance físico del proyecto El Empalme-Celica-Alamor	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	14/02/2013
8	Historico - El avance económico es 48,53%, mientras que el físico es 52%. La obra ha reiniciado las actividades. El plazo	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	03/08/2012

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
	de terminación vigente es el 16-08-2012. Se han presentado justificativos p			
9	Historico - El avance económico es 43.23%, mientras que el físico es 49%. La obra ha reiniciado las actividades. El plazo de terminación vigente es el 16-08-2012.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	10/07/2012
10	Historico - El avance económico es 39.40%, mientras que el físico es 48%. La obra ha reiniciado las actividades. No se da solución a los propietarios de los terrenos donde se ha establecido los s	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/06/2012
11	Historico - El avance económico es 39.40%, mientras que el físico es 44%. La obra está suspendida oficialmente por la temporada invernal. No se da solución a los propietarios de los terrenos dond	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	07/05/2012
12	Historico - El avance económico es del 38% mientras que el físico es del 42%. Se trabaja en tres jornadas. No se soluciona la indemnización de terrenos particulares establecidos para escombrera.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	11/04/2012
13	Historico - El avance económico es del 38% mientras que el físico es del 42%. Se trabaja en tres jornadas. No se soluciona la indemnización de terrenos particulares establecidos para escombrera.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	22/03/2012
14	Historico - El avance económico del proyecto es 31.18% mientras que el físico es 33.41%, el plazo de terminación es 16-08-2012. Se alerta sobre pagos no realizados a propietarios de terrenos en d	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	08/02/2012

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en movimiento de tierras, estabilización taludes y limpieza de derrumbes.		100.00 %	1	1	01/01/2011	Diciembre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	11,635,527.05
Estimado Al Fin Del Proyecto:	42,845,998.22 **
Costo Total:	42,676,412.26
Total Devengado:	42,920,252.64
% Costo Total Devengado:	100.57 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 100.57 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	40,377,702.72	1,201,930.14	0.00	41,579,632.86
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	817,266.65	0.00	0.00	817,266.65
Ppto. Codificado	47,649,164.02	693,315.94	0.00	48,342,479.96
Ppto. Comprometido	39,753,739.56	690,516.02	0.00	40,444,255.58
Planeado - Codificado (2017)		508,614.20		
Programado a Devengar	40,923,756.93	614,402.65	0.00	41,538,159.58
Ppto. Devengado	42,231,595.57	688,657.07	0.00	42,920,252.64
Pagado Real	487,968.52	688,657.07	0.00	1,176,625.59
Estimado a fin de año	* 42,231,595.57	0.00	0.00	42,231,595.57
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,307,838.64	614,402.65	0.00	-693,435.99
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 103.20 %	112.09 %	0.00 %	103.33 %
Ppto. Codificado 998	9,421,175.13	0.00	0.00	9,421,175.13
Ppto. Devengado 998	9,392,905.63	0.00	0.00	9,392,905.63

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017**

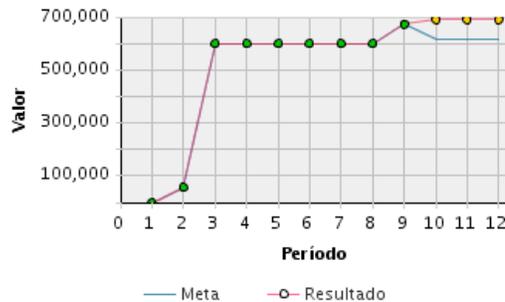

**Presupuesto Mensual 2017**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	57,062.49	57,062.49	57,062.49	57,062.49	100.00 %	●	9.29 %
Mar	541,095.38	541,095.38	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
Abr	0.00	0.00	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
May	0.00	0.00	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
Jun	0.00	0.00	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
Jul	0.00	0.00	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
Ago	0.00	0.00	598,157.87	598,157.87	100.00 %	●	97.36 %
Sep	74,254.30	74,254.30	672,412.17	672,412.17	100.00 %	●	109.44 %
Oct	-58,009.52	16,244.90	614,402.65	688,657.07	112.09 %	▼	112.09 %
Nov	0.00	0.00	614,402.65	688,657.07	112.09 %	▼	112.09 %
Dic	0.00	0.00	614,402.65	688,657.07	112.09 %	▼	112.09 %
<b>Total</b>	<b>614,402.65</b>	<b>688,657.07</b>				▼	

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
11	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Informe_sitop.pdf	06/11/2014
2	1. Contrato Original	CCONTRATO_ORIGINAL.pdf	29/12/2016
3	2. Contrato Complementario No. 1	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No.1.pdf	29/12/2016
4	3. Contrato Complementario No. 2	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No._2.pdf	29/12/2016
5	4. Acta de Recepción Definitiva	Acta_Definitiva_EI_Empalme_Celica_Alamor.pdf	29/12/2016
6	6. Dictamen de prioridad Senplades	DICTAMEN__PRIORIDAD_SENPLADES.pdf	29/12/2016
7	A.2 Informe ejecutivo febrero 2012	Infor-ejecutivo_FEBRERO_2012.pdf	09/09/2014
8	A.3 Informe ejecutivo marzo-2012	Infor-ejecutivo_MARZO_2012.pdf	09/09/2014
9	A.4 Informe ejecutivo abril 2012	Infor-ejecutivo_ABRIL_2012.pdf	09/09/2014
10	A.5 Informe ejecutivo mayo 2012	Infor-ejecutivo_MAYO-2012.pdf	09/09/2014
11	A.6 Informe ejecutivo junio 2012	Infor-ejecutivo_JUNIO_2012.pdf	09/09/2014
12	A.7 Informe ejecutivo julio 2012	Infor-ejecutivo_JULIO_2012.pdf	09/09/2014
13	A.8 Informe ejecutivo agosto 2012	Infor-ejecutivo_agosto_2012.pdf	09/09/2014
14	A.9 Informe ejecutivo septiembre 2012	Infor-ejecutivo_SEPTIEMBRE_2012.pdf	09/09/2014
15	A10 Informe ejecutivo octubre 2012	Infor-ejecutivo_OCTUBRE_2012.pdf	09/09/2014
16	A11 Informe ejecutivo noviembre 2012	Infor-Ejecutivo_NOVIEMBRE_2012_.pdf	09/09/2014
17	A12 Informe ejecutivo diciembre 2012	infor-ejecutivo_DICIEMBRE_2012.pdf	09/09/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Actas Recepción definitiva del proyecto. Ampliación de la carretera El Empalme-Celica-Alamor	Acta_de_Recepción_Definitiva_EIEmpalme-Celica-Alamor-1.pdf	29/04/2016
19	B.1 Informe ejecutivo enero 2013	Infor-Ejecutivo_ENERO_2013.pdf	09/09/2014
20	B.2 Informe ejecutivo febrero 2013	Infor-Ejecutivo_FEBRERO_2013.pdf	09/09/2014
21	B.3 Informe ejecutivo marzo 2013	Infor-ejecutivo_MARZO_2012.pdf	09/09/2014
22	B.4 Informe ejecutivo abril 2013	Infor-Ejecutivo_ABRIL-2013.pdf	09/09/2014
23	B.5 Informe ejecutivo mayo 2013	Infor-Ejecutivo_MAYO_2013.pdf	09/09/2014
24	B.6 Informe ejecutivo junio 2013	Infor-ejecutivo_JUNIO_2013.pdf	09/09/2014
25	B.7 Informe ejecutivo julio 2013	Infor-ejecutivo_JULIO_2013.pdf	09/09/2014
26	B.8 Informe ejecutivo agosto 2013	info-ejecutivo_AGOSTO_2013.pdf	09/09/2014
27	B.9 Informe ejecutivo septiembre 2013	Infor-ejecutivo_SEPTIEMBRE_2013.pdf	09/09/2014
28	B10 Informe ejecutivo octubre 2013	Infor-ejecutivo_OCTUBRE_2013.pdf	09/09/2014
29	B11 Informe ejecutivo noviembre 2013	Infor-ejecutivo_NOVIEMBRE_2013.pdf	09/09/2014
30	B12 Informe ejecutivo diciembre 2013	Infor-ejecutivo_DICIEMBRE_2013.pdf	09/09/2014
31	C.1 Informe ejecutivo enero 2014	Info.ejecutivo_enero_2014.pdf	09/09/2014
32	C.2 Informe ejecutivo febrero 2014	Infor-ejecutivo_febrero_2014.pdf	09/09/2014
33	C.3 Informe ejecutivo marzo 2014	Info.ejecutivo_marzo_2014.pdf	09/09/2014
34	C.4 Informe ejecutivo abril 2014	info.ejecutivo_abril_2014.pdf	09/09/2014
35	C.5 Informe ejecutivo mayo 2014	Infor.ejecutivo_mayo2014.pdf	09/09/2014
36	C.6 Informe ejecutivo junio 2014	Infor.ejecutivo_junio2014.pdf	09/09/2014
37	C.7 Informe ejecutivo julio 2014	Infor._ejecutivo_julio2014.pdf	09/09/2014
38	C.8 Informe ejecutivo agosto 2014	Infor._ejecutivo_agosto2014.pdf	09/09/2014
39	C.9 Informe ejecutivo septiembre 2014	Infor-ejecutivo_sept-2014.pdf	06/10/2014
40	C10 Informe ejecutivo octubre 2014	Infor-ejecutivo_oct-2014.pdf	11/11/2014
41	C11 Informe ejecutivo noviembre 2014	Infor-ejecutivo_nov-2014.pdf	08/12/2014
42	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
43	D.1 Informe ejecutivo enero-2015	Infor-ejecutivo_enero-2015.pdf	06/02/2015
44	D.2 Informe ejecutivo feb-2015	Infor-ejecutivo_feb-2015.pdf	06/03/2015
45	D.3 Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
46	D.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril_2015.pdf	06/05/2015
47	D.5 Informe ejecutivo mayo 2015	Infor-ejecutivo_mayo_2015.pdf	09/06/2015
48	D.6 Informe ejecutivo jun-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	09/07/2015
49	D.7 Informe Ejecutivo Jul-2015	Informes_Ejecutivos_Jul-2015.pdf	14/09/2015
50	D.8 Informe ejecutivo Ago-2015	Informes_Ejecutivos_Agos-2015.pdf	14/09/2015
51	D.9 Informe ejecutivo sept-2015	Informes_Ejecutivos_Sept-2015.pdf	08/10/2015
52	D10 Informe ejecutivo octubre-2015	Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf	09/12/2015
53	D11 Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	09/12/2015
54	D12 Informe Ejecutivo Diciembre 2015	Diciembre_2015.pdf	05/05/2016
55	E.1 Informe Ejecutivo Enero 2016	Enero_2016.pdf	05/05/2016
56	E.2 Informe Ejecutivio Febrero 2016	Febrero_2016.pdf	05/05/2016
57	E.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	Marzo_2016.pdf	05/05/2016
58	E.4 Informe Ejecutivo Abril 2016	Abril_2016.pdf	05/05/2016
59	E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016-2778	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016-2778.pdf	03/06/2016
60	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME-VIABILIDAD_EMPALME_ALAMOR.DOC	20/08/2012
61	Resumen ejecutivo y problemas no resueltos de meses anteriores	RESUMEN_EJECUTIVO_Y_PROBLEMAS_NO_RESUELTOS	05/05/2012
62	Resumen mensual ejecutivo del mes de junio.	Resumen_mensual_ejecutivo.pdf	09/07/2012

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Director Distrital MTOP-Loja			
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Supervisor de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	bhurtado@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Vega Silva, Andrea Karla	Coordinador de Infraestructura Provincial	Coordinadora de Infraestructura Provincial	avega@mtop.gob.ec	023974600
