

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K021 MTOP - Mantenimiento por resultados Carretera Puente San Miguel - Lago Agrio-Coca-Loreto-Huataraco - (Sucumbios)

Líder del Proyecto:	López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ordoñez Zuñiga, Alfonso Vicente	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-COCA-LORETO-HUATARACO, Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.1077.7118	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,749,336.95
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/07/2017
Fecha de última actualización:	12/03/2018	Fecha de Fin Base:	30/09/2016
Modificado por:	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:
Realizar el MANTENIMIENTO POR RESULTADOS de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca - Huataraco, incrementando el nivel de servicio de la carretera en mención, disminuyendo los tiempos de viaje con el conciente ahorro en el costo de transportación.

PRODUCTO / SERVICIO:
Mantenimiento de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca - Huataraco, con optimos niveles de servicio.

LINEA BASE:
La línea base para el MANTENIMIENTO POR RESULTADOS de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca - Huataraco, inicia a partir de cero y avanza a medida en que se desarrollan los trabajos; el 100% corresponde a la terminación total de los trabajos obligatorios.

OBJETIVO GENERAL:
Mantener la Red Vial Estatal de la provincia en optimas condiciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Disminuir la tasa de accidentes de transito.
Incrementar el nivel de servicio en la carretera San Miguel - Lago Agrio - Coca - Huataraco.

CONTRATISTA:
Consermin S.A.

VALOR CONTRACTUAL:
29'325.022.29

Beneficios Cualitativos

Incrementar de manera significativa el Nivel de Servicio de esta importante arteria Vial.
Disminuir los tiempos de viaje entre las ciudades que se encuentran a los largo de esta carretera
Disminuir costos de transporte.
Permitir mayor afluencia turística al sector.

Tipo de Beneficiario

Habitantes de las Provincias de Napo, Orellana y Sucumbios

Restricciones

Tiempo : Los trabajos se deben ejecutar en el plazo estipulado en el contrato.

Costo : El presupuesto estimado en el contrato

Alcance : Es necesario se cumpla con el Objeto del contrato

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación


Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO


Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2011

Fecha de Fin: 31/07/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL


— Meta

—●— Resultado

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	100 %	0 %				
	Avance real acumulado											
	97 %	97 %	97 %	97 %								
	Estado											
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2018: En base al informe N° DAPyA-0020-2017 aprobado el 27 de julio 2017, la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentra dando cumplimiento a las recomendaciones del mismo, ya que en el proyecto fue abandonado por el contratista y el informe manifiesta textualmente que se debe dar Terminación unilateral del contrato y en proceso de la fiscalización, con VORSEVI- CIEPER se debiera terminar por mutuo acuerdo.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:27 AM
Diciembre 2017: según el informe N° DAPyA-0020-2017 aprobado el 27 de julio 2017, la Dirección Distrital de Sucumbíos se encuentra dando cumplimiento a las recomendaciones del mismo ya que en la Obra se manifiesta textualmente que debe dar Terminación unilateral del contrato y en proceso de la fiscalización, con VORSEVI- CIEPER se debiera terminar por mutuo acuerdo.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 01:48 PM
Noviembre 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningún trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato. Se encuentra en proceso la liquidación económica, debido a que la Contratista aduce deudas por parte del Ministerio.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/12/2017 - 12:03 PM
Octubre 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningún trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato. Se	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
encuentra en proceso la liquidación económica, debido a que la Contratista aduce deudas por parte del Ministerio.		
Septiembre 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/10/2017 - 10:36 AM
Agosto 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/10/2017 - 09:24 AM
Agosto 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo. La subsecretaría Regional 1 autorizó seguir el procedimiento de acuerdo a la Ley de Contratación, situación que se está implementando.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:34 PM
Julio 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:17 PM
Junio 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 08:52 AM
Mayo 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:12 AM
Abril 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:17 PM
Marzo 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/03/2017 - 09:52 AM
Febrero 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:21 PM
Enero 2017: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 10:58 AM
Noviembre 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 10:57 AM
Octubre 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 12:19 PM
Septiembre 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Benavides Morillo, Omar Alexander	06/10/2016 - 04:42 PM
Julio 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo. Cabe recalcar que al no haber actividades de trabajo, esto está generando multas.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	29/07/2016 - 11:17 AM
Junio 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó al Director Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo. Cabe recalcar que al no haber actividades de trabajo, esto está generando multas.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	28/06/2016 - 03:01 PM
Mayo 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La Asociación Vorsevi Cieper presentó al Director Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente. Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	02/06/2016 - 03:10 PM
Abril 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. Por orden de las autoridades la Asociación Vorsevi Cieper (Fiscalización del proyecto) esta realizando una liquidación económica del proyecto para presentar y esperar que se decida si al contratista se le aplica la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/05/2016 - 10:36 AM
Marzo 2016: Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. Por orden de las autoridades la Asociación Vorsevi Cieper (Fiscalización del proyecto) esta realizando una liquidación económica del proyecto para presentar y esperar que se decida si al contratista se le aplica la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/04/2016 - 10:43 AM
Febrero 2016: La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	08/03/2016 - 03:43 PM
Enero 2016: La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	10/02/2016 - 09:35 AM
Diciembre 2015: La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/01/2016 - 03:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2015: Con oficio Nro. 405-2015-FLAC, la fiscalización del proyecto indica que el contratante se reserva el derecho de rescindir el contrato por el incumplimiento del contratista cuando el índice de servicio de un tramo en particular sea inferior al 80% o el índice de servicio del contrato en general sea inferior al 85%. La fiscalización indico que el índice de servicio correspondiente al mes de septiembre de 2015 tiene un promedio general del 73%. Se espera que las autoridades del MTOP basándose en este informe tomen la resolución sobre este particular.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	07/12/2015 - 10:37 AM
Octubre 2015: Hasta la presente fecha la Cia. CONSERMIN no presenta planillas de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del presente año; No realiza ningún trabajo en el proyecto durante los meses de septiembre y octubre, no hay personal técnico ni administrativo; Un grupo pequeño de trabajadores se ha tomado el campamento de CONSERMIN ubicado en el sector del Aguarico solicitando pagos de sus haberes por meses atrasados. Como Dirección Provincial se ha comunicado a las autoridades esperando pronta definición sobre el particular. Se espera de manera urgente una resolución de las autoridades del MTOP con el fin de resolver el problema que esta pasando la Cia. CONSERMIN que segun contrato estaría con declaración unilateral	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	09/11/2015 - 04:29 PM
Septiembre 2015: Hasta la presente fecha la Cia. CONSERMIN no presenta planillas de los meses de julio, agosto y septiembre del presente año; No realiza ningún trabajo en el proyecto durante el mes de septiembre, no hay personal técnico ni administrativo; Un grupo pequeño de trabajadores se ha tomado el campamento de CONSERMIN ubicado en el sector del Aguarico solicitando pagos de sus haberes por meses atrasados. Como Dirección Provincial se ha comunicado a las autoridades esperando pronta definición sobre el particular.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	29/09/2015 - 08:47 AM
Agosto 2015: La Cia Consermin no presenta para el trámite respectivo las planillas correspondientes a los meses de Julio y Agosto indicando en forma verbal que no están de acuerdo con las multas impuestas por fiscalización, tampoco quieren recibir ninguna documentación de parte de la fiscalización. La Dirección Provincial de Sucumbíos está solicitando para que las planillas sean presentadas lo más pronto posible y mensualmente de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	04/09/2015 - 09:27 AM
JULIO 2015 La fiscalización mediante los estándares de servicio ha solicitado al contratista realice las correcciones a las señales defectuosas de la pintura horizontal a lo largo de la carretera, la reparación de las barandas y barreras deficientes en los puentes, el cambio de las señales defectuosas y deterioradas, delineadores deficientes, completamiento de las tachas. La Cia Contratista aduce que no tiene recursos económicos para realizar estos trabajos, razón por la cual la fiscalización les notifico y las multas seran presentadas en las planillas del mes de Julio del 2015.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	12/08/2015 - 02:55 PM
JUNIO 2015 La fiscalización mediante los estándares de servicio ha solicitado al contratista realice las correcciones a las señales defectuosas de la pintura horizontal a lo largo de la carretera, la reparación de las barandas y barreras deficientes en los puentes, el cambio de las señales defectuosas y deterioradas, delineadores deficientes, completamiento de las tachas.	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	03/07/2015 - 02:51 PM
MAYO 2015: La compañía sigue realizando el mantenimiento principalmente utilizando a las microempresas en la limpieza de cunetas y roza a mano, tapado de fisuras y completamiento de la señalización horizontal como es tachas y balizas. Los contratistas de los Gobiernos seccionales, es decir, Consejo Provincial y Alcaldía de la Provincia de Orellana continúan contaminando la vía con material de excavación de los taludes de la carretera por lo que se ha solicitado al Director Provincial de Orellana trate de evitar estos acontecimientos. La fiscalización ha notificado al contratista para realizar trabajos en el km. 52 de la vía, lugar donde esta fallada la mesa de la carretera.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/06/2015 - 11:32 AM
Abril 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente el proyecto continúa en la etapa de mantenimiento, misma que dura tres años.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/05/2015 - 09:27 PM
Marzo 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente el proyecto continúa en la etapa de mantenimiento, misma que dura tres años.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/04/2015 - 11:33 AM
Febrero 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente el proyecto continúa en la etapa de mantenimiento, misma que dura tres años.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/03/2015 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/02/2015 - 08:20 AM
Diciembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 10:54 AM
Noviembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/12/2014 - 11:00 AM
El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.		
Octubre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia de obras entregará en certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:12 PM
El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.		
Septiembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia de obras entregará en certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/10/2014 - 08:22 AM
El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.		
Agosto 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/09/2014 - 04:08 PM
Las planillas N°21 correspondientes a Mantenimiento por Resultados y las planillas 6, 7 y 8 de los accesos al puente Aguarico, fueron presentados por la Cia. Consermin y Avalizados por la Fiscalización del proyecto, la Cia. contratista no entrega hasta la presente fecha las facturas correspondientes, razón por la cual el departamento financiero de la Dirección Provincial no ha podido cancelar estos valores.		
Julio 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra. Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% fisico, los accesos 88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:03 AM
Fiscalizacion solicita a la Contratista Consermin se atienda a la mayor premura posible las observaciones realizadas mediante oficio No 282-2014-FLAC para poder así realizar la recepción de las obras obligatorias del proyecto.		
Junio 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/07/2014 - 11:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% físico, los accesos 88.4% de avance físico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013. La fiscalización ha solicitado a la contratista la terminación de los trabajos materia de contratos con el fin de realizar el acta de recepción de las obras obligatorias del proyecto.		
Mayo 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a cláusulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra. Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% físico, los accesos 88.4% de avance físico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/06/2014 - 08:18 AM
Abril 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a cláusulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra. Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% físico, los accesos 88.4% de avance físico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/06/2014 - 08:16 AM
Marzo 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a cláusulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra. Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% físico, los accesos 88.4% de avance físico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/04/2014 - 04:03 PM
Febrero 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inaugurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a cláusulas contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/03/2014 - 03:42 PM
Enero 2014.-La contratista se encuentra trabajando en la construcción de los accesos viales, que contiene iluminación, obras paisajísticas y distribuidores de tráfico para el ingreso al puente atirantado sobre el río Aguarico ubicado en la ciudad de Nueva Loja. El Contrato tiene un monto de 6'153147.00, y un plazo de ejecución de 6 meses, mismo que finalizó el 31 de Diciembre del 2013.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/03/2014 - 03:31 PM
Diciembre 2013.- En esel mes de Diciembre se aprobó el Contrao Complementario N° 1 con el fin de unir la red EStatal E-45 y la E-45A, en la que se incluyó la construcción de los accesos viales, que contiene iluminación, obras paisajísticas y distribuidores de tráfico para el ingreso al puente atirantado sobre el río Aguarico ubicado en la ciudad de Nueva Loja. El Contrato tiene un monto de 6'153147.00, y un plazo de ejecución de 6 meses, mismo que finaliza el 31 de Diciembre del 2013. En el Mantenimiento por Resultados, falta 22 Km de obra, correspondiente al tramo Coca-Puente Huataraco, teniendo un avance del 88%. En lo referente a los accesos del puente Aguarico, se encuentran trabajando en las instalaciones electricas, plataformas paisajísticas, teniendo un avance del 35%. Actualmente la contratista se encuentra fuera de plazo; Sin emabargo no ha cumplido con los hitos 23,25,27 y 28, por lo que se encuentra trabajando actualmente, el MTOP procederá a aplicar las cláusulas del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/02/2014 - 09:43 AM
Noviembre 2013.- Los trabajos continúan avanzando con normalidad, en Noviembre se ha realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta; en lo que respecta a señalización, se ha colocado guardacaminos, marcas de pavimento, chevrones. Una vez que fue aprobada el Acta de la Comisión tecnica, en cumplimiento al decreto presidencial 451 la Dirección de Conservación Vial ha solicitado a Asesoría Jurídica la elaboración del respectivo contrato complementario en el que contemple la aprobación del presupuesto solicitado para la construcción de los accesos al puente Aguarico y el plazo de terminación de las obras obligatorias.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2014 - 11:19 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2013.- Porcentaje de avance físico a Octubre 79.52%, los trabajos continúan avanzando con normalidad, en Octubre se ha realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta; en lo que respecta a señalización, se ha colocado guardacaminos, marcas de pavimento, chevrone. Una vez que fue aprobada el Acta de la Comisión técnica, en cumplimiento al decreto presidencial 451 la Dirección de Conservación Vial ha solicitado a Asesoría Jurídica la elaboración del respectivo contrato complementario en el que contemple la aprobación del presupuesto solicitado para la construcción de los accesos al puente Aguarico y el plazo de terminación de las obras obligatorias.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 01:13 AM
Septiembre 2013.- Porcentaje de avance físico a Agosto 68%, los trabajos continúan avanzando con normalidad, en Septiembre se ha realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta, sellado de fisuras superficiales; en lo que respecta a señalización, se ha colocado guardacaminos, marcas de pavimento, chevrone. Se espera que las autoridades del MTOP convoquen a la comisión encargada de solicitar la ampliación de plazo y el aumento de presupuesto con el fin de dar cumplimiento al decreto presidencial N° 451, por lo tanto no se ha podido cumplir el hito N° 17 y el hito N°21 y 23, debido al problema de minas, mismo que se encuentra como asunto pendiente en GPR (Actualmente la Cia. Contratista se encuentra trabajando).	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 09:04 AM
Agosto 2013.- Porcentaje de avance físico a Agosto 68%, desde Lago Agrio hasta el Puente San Miguel - "Y" del Eno - Coca se encuentran los trabajos al 100% con carpeta asfáltica y señalización horizontal y vertical. En el tramo Coca - Río Huataraco, se tiene realizado el recapeo de los primeros 17 kilómetros, desde esta abscisa hasta el Km 25 se tiene realizado el bacheo en su totalidad, se espera que las autoridades del MTOP convoquen a la comisión encargada de solicitar la ampliación de plazo y el aumento de presupuesto con el fin de dar cumplimiento al decreto presidencial N° 451, por lo tanto no se ha podido cumplir el hito N° 17 y el hito N°21, debido al problema de minas, mismo que se encuentra como asunto pendiente en GPR (Actualmente la Cia. Contratista se encuentra trabajando).	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 11:21 AM
Julio 2013.- Porcentaje de avance físico a Julio 66.85%, desde Lago Agrio hasta el Puente San Miguel - "Y" del Eno - Sacha se encuentran los trabajos al 100% con carpeta asfáltica y señalización horizontal y vertical. Desde el Sacha hasta el Coca, faltan 5 Km de recapeo y falta señalización horizontal y vertical, se estima terminar hasta el mes de Diciembre. En tramo Coca - Loreto recapeo 7+200 Km se encuentra terminado el recapeo, falta señalización horizontal y vertical, falta 45.80 Km, Desde Loreto - Puente Huataraco no se ha realizado trabajos, por lo tanto no se ha podido cumplir el hito N° 17, debido al problema de minas, mismo que se encuentra como asunto pendiente en GPR.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2013 - 08:52 AM
Mayo 2013.- Bacheo asfáltico, sector Sacha - Coca desde el Km 50 hasta el Km 78+200. Carpeta Asfáltica.- Sector Sacha desde el Km 46+500 hasta el 48+900 Marcas de pavimento.- Desde el Km 49+000 hasta el 78+000 Tachas reflectivas.- San Miguel - Lago desde el Km 22 hasta el Km 25+100 Chevrone.- Desde Lago El Eno Km 15 hasta el 20+000	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 10:30 AM
Abril 2013.-Capa de rodadura de hormigón asfáltico, señalización horizontal en el tramo El Eno - Limite provincial Coca.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 02:02 PM
Marzo 2013.- Bacheo asfáltico desde el km 34+800 al 39+800, en la vía Aguarico - Sacha; Carpeta asfáltica desde el el 29+800 hasta el 39+800. y en el tramo Lago Agrio - "Y" del Eno, desde 5+700 hasta el 8+400. Colocación de Guardavías (señalización), en el Tramo Lago Agrio - Puente San Miguel desde el Km 0+000 hasta el 5+000, en el Tramo Lago agrio -"Y" del Eno desde el 0+000 hasta el 11+000	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	24/04/2013 - 04:38 PM
Febrero 2013.- Bacheo asfáltico 1745 m3, capa de rodadura 5660 m3, marcas de pavimento 65535 m, marcas sobre salidas de pavimentos bidireccionales 12300 m, guardacaminos sencillo 915m, trabajos de microempresas 182 km/12 meses.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	27/03/2013 - 11:39 AM
Enero 2013.- Bacheo asfáltico en un acantidad de 3,970.76 m3, capa de rodadura de hormigon asfáltico 7,285.44 capa de rodadura, Guardacaminos 1892 m, chevrone 662 U, Delineadores 65 U, relleno con mejoramiento 660 m3, gaviones 60 m3.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:21 PM
Diciembre 2012.- Hormigón estructural clase "c", desde la abscisa 15+900 hasta la 16+020, Gaviones desde la abscisa 12+000 hasta la 15+000, reparación de barandas de puentes en la abscisa 68+250, Mantenimiento rutinario (limpieza de maleza) desde la abscisa 0+000 hasta la 78+000.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/01/2013 - 03:02 PM
Noviembre.- Bacheo Asfáltico desde las abscisa 8+179 hasta la 20+673, Sellado de fisuras superficiales, desde la abscisa 34+200 hasta la 49+000, Asfalto para riego de adherencia desde la abscisa 19+050 hasta la 25+088, capa de rodadura de hormigón asfáltico 19+050, hasta la 26+800, transporte de mezcla asfáltica desde la 19+050 hasta la 26+800, señales al lado de la carretera (Preventivas) desde la 19+000 hasta la 78+200, guardacaminos desde la abscisa 17+900 hasta 19+016.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/01/2013 - 02:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2012 Sellado de fisuras en el Km 6+000 al 38+000, de la vía Lago Agrio - Coca; desde el 0+000 al 21+300, en la vía "Y" del Eno; desde 48+000 hasta el 68+000, en la vía Sacha "Y" de Loreto, desde 0+000 hasta el 25+300, en la vía Lago Agrio - San Miguel. Bacheo Asfáltico, desde el 6+000 al 28+400, en la vía Lago AGrio - Coca; desde el 55+000 hasta el 75+250, en la vía Sacha - Loreto. Carpeta Asfáltica, desde el 6+000 al 15+000 en la vía Lago Agrio - Coca; desde el 68+000 al 78+000, en la vía Sacha - LOreto.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/01/2013 - 02:47 PM
SEPTIEMBRE 2012.- Contratista Consermin S.A. Tapado de fisuras, fresado y colocación de carpeta asfáltica, construcción de muro de gaviones, limpieza de alcantarillas. AGOSTO 2012.- Contratista Consermin S.A. Con fecha 03 de Agosto del 2012, se firma el Acta de inicio de trabajos conjuntamente la supervisión del MTOP, la Asociación Volvevi - Cieper y la Constructora CONSERMIN S.A. JULIO 2012.- Contratista Consermin S.A. La Cia. Contratista se encuentra trabajando a partir del 06 de Julio del 2012, sin embargo la Fiscalización (Volvevi - Cieper) aún no emite el aviso de comenzar y no cuenta con el personal ni el equipo de trabajo necesario para el control de la calidad de la obra. JUNIO 2012.- Contratista Consermin S.A. Según información del departamento Financiero, indican que existe un memorando en el que el Director de Asesoría Jurídica remite el contrato, las pólizas y todo el proceso a la Provincia de Orellana, por lo que ellos van a ser los administradores y se remite la documentación. MAYO 2012 : Contratista Consermin S.A. Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso LPI-OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR ABRIL 2012 : Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso LPI-OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO DEL PROCESO EN EL INCOP. MARZO 2012 : Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso LPI-OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO DEL PROCESO EN EL INCOP. FEBRERO 2012 : Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso LPI-OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" ENERO 2012: Revisión y calificación de Ofertal. DICIEMBRE 2011: Publicación en el portal de Compras Públicas.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/11/2012 - 02:52 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Trabajos paralizados por parte de la contratista.	01/04/2017	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	80	50	40	0/1

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de recursos económicos CAUSARÍA el retraso en el plazo establecido del proyecto.	07/06/2017	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	100 %	10	10	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio
2	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi
3	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Sucumbios
4	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > La Joya de los Sachas
5	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Loreto
6	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
7	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Aprobación Interna, autorizado.	1-Solicitud de Información	14/01/2011		15/01/2011		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Dictamen Senplades, obtenido.	1-Solicitud de Información	14/01/2011		14/01/2011		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, obtenida.	1-Solicitud de Información	31/03/2011		31/03/2011		Sí	1.25
4	PLANEACIÓN: Documentos precontractuales, realizado.	1-Solicitud de Información	08/12/2011		08/12/2011		Sí	1.25
5	PLANEACIÓN: Publicación en el portal compras públicas, realizado.	2-Publicación de Pliegos	16/12/2011		16/12/2011		Sí	1.25
6	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicación, realizado.	3-Adjudicación	03/03/2012		03/03/2012		Sí	1.25
7	EJECUCIÓN: Contrato suscrito, firmado.	4-Inicio de Trabajo	30/07/2012		30/07/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 0+000 AL KM 25+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 25+000 AL KM 50+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/10/2012		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 50+000 AL KM 75+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de	5-Entregables Intermedios	30/12/2012		30/12/2012		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 75+000 AL KM 100+000, realizado.							
12	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 0+000 AL KM 25+000, realizado.	1-Solicitud de Información	30/01/2013		30/01/2013		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 100+000 AL KM 125+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 25+000 AL KM 50+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/03/2013		30/03/2013		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 125+000 AL KM 150+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	5.0
16	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 50+000 AL KM 75+000, realizado.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Limpieza, Desbroce y Reposición de calzada, sellado de fisuras superficiales y bacheo asfáltico mayor KM 150+000 AL KM 186+980, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/10/2013		Sí	5.0
18	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 100+000 AL KM 125+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	5.0
19	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 75+000 AL KM 100+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: Sellado de fisuras desde el Coca Hasta Loreto, realizado.	1-Solicitud de Información	15/08/2013		15/08/2013		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 125+000 AL KM 150+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		29/11/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Recapeo desde el Coca hasta Loreto, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta y reposición de cunetas KM 150+000 AL KM 186+980, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		28/02/2014		Sí	5.0
24	EJECUCIÓN: Impacto Ambiental (Libre aprovechamiento Mina), realizado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/12/2013		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: Construcción de Accesos viales a puente Aguarico, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		30/11/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas de accesos, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		20/01/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas del puente, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		20/01/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Ornamentación de los accesos al Puente Aguarico, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		20/01/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento por resultados de la carretera Puente Internacional San Miguel - Coca - Huataraco del Km 0+000 al Km 186.98 (desde el 01 de abril del 2013 hasta el 30/03/2016), realizado.	5-Entregables Intermedios	29/03/2016		29/03/2016		Sí	4.0
32	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de guardavías, KM 0+000 AL KM 25+00 realizado.							
34	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 25+000 AL KM 50+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.0
35	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 50+000 AL KM 75+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/01/2017		01/01/2017		Sí	0.0
36	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 75+000 AL KM 100+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/02/2017		01/02/2017		Sí	0.0
37	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 100+000 AL KM 125+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/03/2017		01/03/2017		Sí	0.0
38	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 125+000 AL KM 150+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/04/2017		01/04/2017		Sí	0.0
39	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo de guardavías KM 150+000 AL KM 175+000, realizado.	5-Entregables Intermedios	01/05/2017	31/07/2017			No	0.0
40	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de cunetas, lipieza de alcantarillas, reposición de señalización vertical, señalización horizontal, colocación de tachas reflectivas, reposición y arreglo	5-Entregables Intermedios	01/06/2017	31/07/2017			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de guardavías KM 175+000 AL KM 186+980, realizado.							
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento por resultados de la carretera Puente Internacional San Miguel - Coca - Huataraco del Km 0+000 al Km 186.98 (desde el 03 de abril del 2016 hasta el 31/07/2017), realizado.	9-Entregables Formales	01/07/2017	31/07/2017		▼	No	0.0
42	CIERRE: Liquidación económica del contrato, realizado.	9-Entregables Formales	30/07/2017	31/07/2017		▼	No	1.0
43	CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizado.	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017		▼	No	1.0
44	COMPLETADO: Acta entrega recepción definitiva, realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2017	31/07/2017		▼	No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	11/05/2016
2	PARALIZADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	13/04/2016
3	PARALIZADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	17/11/2015
4	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2015
5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/04/2015
6	LA OBRA TIENE INCUMPLIMIENTO LAS VIAS EN MAL ESTADO	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/05/2015
7	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	31/03/2015
8	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	28/02/2015
9	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/01/2015
10	Mantenimiento En Ejecucion del las vías Puente San Miguel - Lago Agrio-Coca-Loreto-Huataraco-SUCUMBÍOS	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	11/12/2014
11	Trabajos de ejecución de aceras y bordillos de la vía Aguariño que se conecta al Puente atirantado	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	01/04/2014
12	TRAMO ACCESOS AL PUENTE AGURICO	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/01/2014
13	Obra terminada e inaugurada	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	27/02/2014
14	TRAMO DE SUCUMBÍOS TERMINADO	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2013
15	AVANCE DE LA OBRA EN ESTADO NORMAL	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	14/05/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance del Mantenimiento por resultados de la		0.00 %	3	0	01/01/2017	Oct-Dic

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	carretera Puente San Miguel - Nueva Loja - Coca - Huataraco						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,951,562.59
Estimado Al Fin Del Proyecto:	38,749,336.95 **
Costo Total:	36,007,910.86
Total Devengado:	36,112,490.34
% Costo Total Devengado:	100.29 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 100.29 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	28,317,317.37	4,376,090.43	0.00	32,693,407.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	5,853,657.01	0.00	5,853,657.01
Ppto. Aprobado Inicial	27,286,026.37	2,317,187.53	0.00	29,603,213.90
Ppto. Codificado	37,756,741.95	26,186.88	0.00	37,782,928.83
Ppto. Comprometido	13,242,469.75	26,186.88	0.00	13,268,656.63
Planeado - Codificado (2017)		4,349,903.55		
Programado a Devengar	35,948,367.80	2,663,033.49	0.00	38,611,401.29
Ppto. Devengado	36,086,303.46	26,186.88	0.00	36,112,490.34
Pagado Real	12,971,292.14	26,186.88	0.00	12,997,479.02
Estimado a fin de año	* 36,086,303.46	0.00	0.00	36,086,303.46
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-137,935.66	2,663,033.49	0.00	2,525,097.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.38 %	0.98 %	0.00 %	93.53 %
Ppto. Codificado 998	3,198,538.90	0.00	0.00	3,198,538.90
Ppto. Devengado 998	3,198,538.90	0.00	0.00	3,198,538.90

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

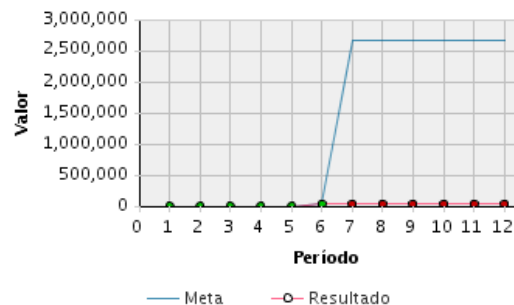

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	26,186.88	26,186.88	26,186.88	26,186.88	100.00 %		0.98 %
Jul	2,636,846.61	0.00	2,663,033.49	26,186.88	0.98 %		0.98 %
Ago	0.00	0.00	2,663,033.49	26,186.88	0.98 %		0.98 %
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	2,663,033.49	26,186.88					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
11	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
12	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0040 INFORME EJECUTIVO Diciembre 2017	informe_ejecutivo_4789.pdf	05/01/2018
2	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_id-4789.pdf	05/12/2017
3	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K020111	02/11/2017
4	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4789.pdf	04/10/2017
5	A.0044 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_4789.pdf	05/09/2017
6	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4789.pdf	02/08/2017
7	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4789.pdf	04/07/2017
8	A.0048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_K21.pdf	07/06/2017
9	A.0050 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4789.pdf	29/03/2017
10	A1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE FEBRERO 2014	A1_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MES_DE_FEBRERO_2014.pdf	12/03/2014
11	A2 INFORME EJECUTIVO SITOP (FEBRERO 2014)	A2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_(FEBRERO_2014).pdf	14/03/2014
12	A3 DEVENGADO MARZO	A3_DEVENGADO_MARZO.pdf	07/04/2014
13	A4 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014	A4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP.pdf	07/04/2014
14	A5 APROBACION DE FORMULA POLINOMICA	A5_APROBACION_DE_FORMULA_POLINOMICA.pdf	02/07/2014
15	A6 SOPORTE INDICADOR KM REV EN BUEN ESTADO	A6_SOPORTE_INDICADOR_KM_REV_EN_BUEN_ESTADO.pdf	02/07/2014
16	A7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2014	A8_REPORTE_JUNIO[2].pdf	03/07/2014
17	A8 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2014	A8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2014.pdf	21/08/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	A9 EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2014	A9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_JULIO_2014.pdf	21/08/2014
19	B1 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014	B1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf	10/09/2014
20	B2 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 MANT POR RESU	B2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014_MANT_POR_RESULTADOS.pdf	23/08/2015
21	B3 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2015 MANT POR RESULTADOS	B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_FEBRERO_2015_MANT_POR_RESULTADOS.pdf	11/02/2015
22	B3 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE FEB 2015 MANT POR RESULTADOS	B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_FEB_2015_MANT_POR_RESULTADOS.pdf	22/03/2015
23	B4 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015	B4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015.pdf	08/04/2015
24	B5 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf	11/05/2015
25	B6 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	03/07/2015
26	B7 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	B7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf	28/08/2015
27	B8 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	B8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2015.pdf	28/08/2015
28	B9 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015	B9_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2015.pdf	29/09/2015
29	C1 Acta acuerdo 451, Mantenimiento por Resultados No. 1	acta_acuerdo_451__Mantenimiento_por_Resultados_No._1.pdf	02/10/2015
30	C2 Acta acuerdo 451, Mantenimiento por Resultados No. 2	acta_acuerdo_451__Mantenimiento_por_Resultados_No._2.pdf	02/10/2015
31	C3 INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	C3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2015.pdf	29/10/2015
32	C4 INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015	C4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2015.pdf	10/11/2015
33	C5 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2015	NOV_2015.pdf	07/12/2015
34	C6 INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2016	MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS_ENERO_2016.pdf	10/02/2016
35	C7 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2015.pdf	08/03/2016
36	C8 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2016	MARZO_2016-MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf	07/04/2016
37	C9 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016	ABRIL_ID_4789.pdf	04/05/2016
38	CONTRATO COMPLEMENTARIO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf	29/09/2015
39	CONTRATO COMPLEMENTARIO/ADENDA/ MODIFICATORIO	COMPLEMENTARIOADENDAMODIFICATORIO.pdf	29/09/2015
40	CONTRATO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS Carretera Puente San Miguel - Lago Agrio-Coca-Loreto-Huataraco - (Sucumbios)	CONTRATO_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS_Carretera_Puente_San_Miguel_-_Lago_Agrio-Coca-Loreto-Huataraco_-_ (Sucumbios).pdf	30/09/2015
41	CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	CROQUIS_DE_UBICACION_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf	06/09/2015
42	D1 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2016	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf	28/06/2016
43	D1 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016	D1_INFORME_SITOP_MAYO_2016.pdf	06/06/2016
44	D1 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016	D1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2016.pdf	01/11/2016
45	D2 INFORME EJECUTIVO SITOP 2016	INFORME_SITOP.pdf	05/01/2017
46	DEVENGADO MES DE ENERO 2013	Reporte_Ejecucion_Enero_2013.pdf	31/03/2013
47	DEVENGADO MES DE FEBRERO 2013	REPORTE_MES_FEBRERO_2013.pdf	31/03/2013
48	DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE 2013	REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf	10/12/2013
49	DEVENGADO MES DE MAYO	REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf	07/06/2013
50	DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	DICTAMEN_SENPLADES_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf	07/09/2016
51	EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL	REPORTE_ABRIL.pdf	06/05/2013
52	EJECUCION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE	EJECUCION_DICIEMBRE_2012[1].pdf	08/01/2013
53	EJECUCION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2013	Reporte_Ejecucion_Dic2013.pdf	08/01/2014
54	EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2013	Reporte_de_Octubre_del_2013[1].pdf	12/11/2013
55	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2013	devengado_septiembre.pdf	07/10/2013
56	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
57	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE JULIO	REPORTE_JULIO-2013[1]_ejecucion_presupuestaria.pdf	02/08/2013
58	Ejecución Presupuestaria Septiembre	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION	procesp.bmp	09/04/2012
60	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO, AL MES DE AGOSTO 2013	IMG-20130824-01118.jpg	05/09/2013
61	FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO	FOTOS_AVANCE_AGOSTO1_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.xlsx	07/09/2013
62	INFOME EJECUTIVO SITOP MES DE JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_SAN_MIGUEL.pdf	05/07/2013
63	informe ejecutivo oct 2013	informe_ejecutivo_oct.pdf	14/11/2013
64	informe ejecutivo oct 2013	informe_ejecutivo_oct.pdf	14/11/2013
65	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_FEBRERO.pdf	31/03/2013
66	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO	JULIO_INF_EJECUTIVO_MANTE_RESULTADOS.pdf	27/08/2013
67	INFORME EJECUTIVO SITOP ME DE MARZO	REPORTE_EJECUTIVO_MARZO_SITOP_MANTN_POR_RESULTADOS.pdf	03/05/2013
68	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_AGOSTO_2013_SAN_MIGUEL_POR_RESULTADOS.pdf	06/09/2013
69	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	san_miguel_informe_ejecutivo_sitop_septiembre.pdf	07/10/2013
70	PLANILLA DE TRABAJOS MES DE AGOSTO	MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS_PLANILLA_AGOSTO.pdf	06/09/2012
71	SOLICITUD DE CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nro_1_MANTEN_POR_RESULTADOS.pdf	29/11/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	Supervisor	Supervisor de Construcciones	aarizaga@mtop.gob.ec	023974600
Benavides Morillo, Omar Alexander	Administrador	Subsecretario Zonal 1	obenavides@mtop.gob.ec	023974600
Noroña Castellano, Víctor Hugo	Supervisora Financiera	Analista de Presupuesto	vnorona@mtop.gob.ec	
Vorsevi Ciepper , Asociación	Fiscalizador		vpacheco	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
19682_1.jpg	06/10/2015
