

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**

**Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas**

**PROYECTO: K014 MTOP - Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo**

Líder del Proyecto:	Linzán Mora, Luciano Vicente (linsan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Molina Cedeno, Yuver Alexander	Programas Relacionados:	
Titular:	Sanchez Granda, Freddy Ernesto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.383243	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,501,019.05
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	12/02/2018 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	05/04/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Linzán Mora, Luciano Vicente	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2022

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios, disminuyendo el tiempo de traslado y mejorando la conectividad con las distintas poblaciones., así como contribuir al desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y logístico.

**Tipo de Beneficiario**

Usuarios de la Red Vial Estatal correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y ciudadanía en general, este proyecto beneficia directamente a 368.013 habitantes e indirectamente a 1'500.000


**Restricciones**

El proyecto debe ejecutarse en el plazo establecido y que las políticas del estado respeten los programas de vialidad que fomentan la productividad, desarrollo económico y empleo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 86.38 %  
 Fecha de Inicio: 12/02/2018      Fecha de Fin: 31/12/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

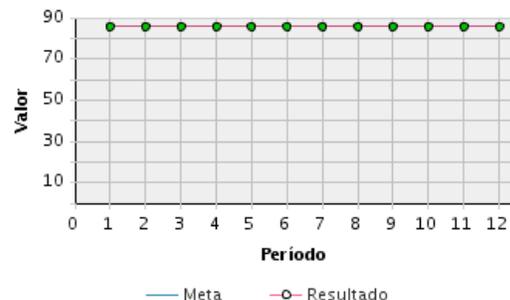

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
	Avance real acumulado											
	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2022.- Mediante memorando Nro. MTOP-DPSCH-GI-CONSV-2022-56-ME, de fecha 18 de marzo de 2022, se legaliza el trámite para el pago de la planilla No. 23-</p> <p>FEBRERO 2022.- Mediante memorando Nro. MTOP-DPSCH-GI-CONSV-2022-37-ME, de fecha 16 de febrero de 2022, se legaliza el trámite para el pago de la planilla No. 22</p> <p>ENERO 2022.- Mediante memorando Nro. MTOP-CGP-2022-126-ME, de fecha 07 de febrero de 2022, se autoriza la ampliación de la fecha fin del proyecto K014 MTOP hasta el 31/12/2022.</p> <p>DICIEMBRE 2021.- Mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-21-254-OF, de fecha 29 de diciembre de 2021 suscrito por el Ing. Freddy Ernesto Sánchez, Director Distrital De Santo Domingo de los Tsáchilas Administrador del Contrato, lautoriza la ampliación de plazo por 16 días.</p> <p>NOVIEMBRE 2021.- Mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-21-215-OF, de fecha 15 de noviembre de 2021 suscrito por el Ing. Freddy Ernesto Sánchez, Director Distrital De Santo Domingo de los Tsáchilas Administrador del Contrato, se legalizó el contrato complementario No. 2, los trabajos se ejecutan con normalidad.</p> <p>OCTUBRE 2021.- por falta de pago de planillas pendientes, la contratista solicito la suspensión de los trabajos, la misma que fue aceptada desde el 09/09/2021, los trabajos tanto de la construcción como de la fiscalización. se encuentran suspendidos.</p> <p>SEPTIEMBRE 2021.- Con fecha 3 de septiembre, se reiniciaron los trabajos una vez que se legalizó el contrato complementario No. 2, la firma de este contrato no implica aumento del monto contractual, solo cambio de rubros eléctricos, por falta de pago de planillas pendientes, el 09/09/2021, se suspendieron los trabajos tanto de la construcción como de la fiscalización.</p> <p>AGOSTO 2021.- los trabajos se encuentran suspendido por la legalización del contrato complementario No. 2, la firma del contrato no implica aumento de monto contractual, solo cambio de rubros eléctricos</p> <p>JULIO 2021.- los trabajos se encuentran suspendido por la legalización del contrato complementario No. 2, la firma del contrato no implica aumento de monto contractual, solo cambio de rubros eléctricos</p> <p>JUNIO 2021.- Continuan los trabajos de ampliación en el tramo KFC - vía Quevedo, actualmente se trabaja en la colocación de la carpeta asfáltica, los trabajos se encuentran suspendido por la legalización de u contrato complementario No. 2.</p> <p>MAYO 2021.- Se trabaja en la instalación de señalización vertical y horizontal en el tramo 3, Redondel Orangine - Sueño de Bolívar, se continuan los trabajos de ampliación en el tramo KFC - vía Quevedo, actualmente se trabaja en la colocación de material de base .</p> <p>ABRIL 2021.- Continuan los trabajos de ampliación, actualmente se trabaja en la colocación de material de mejoramiento, sub base y base en el tramo KFC - vía Quevedo.</p> <p>MARZO 2021.- los trabajos se encuentran suspendidos, desde el 05/02/2021, debido a la legalización de un contrato complementario, sobre balanceo de cantidades, lo cual no implica incremento de monto pero si ampliación de plazo, con fecha 24/03/2021, se reinican los trabajos, actualmente se trabaja en la excavación y desalojo de la estructura existente en el tramo KFC - vía Quevedo .</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/04/2022 - 11:21 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2021.- En este periodo se continua con la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo 1 (Redondel Sueño de Bolívar - Redondel Orangine) . el porcentaje de avance físico del proyecto es del 82.60%, los trabajos se encuentran suspendidos, desde el 05/02/2021, debido a la legalización de un contrato complementario, sobre balanceo de cantidades, lo cual no implica incremento de monto pero si ampliación de plazo.</p> <p>ENERO 2021.- En este periodo se realizó la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo 1 (Redondel Sueño de Bolívar - Redondel Orangine) . el porcentaje de avance físico del proyecto es del 80.50%.</p>		
<p>DICIEMBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de semáforo en el tramo 3 (vía Quevedo - vía Quito); instalación de señalización vertical en el tramo 2 (vía Quevedo-vía Chone); en el tramo 1 (Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar) se realizó el fresado y colocación de carpetas asfáltica. Actualmente el porcentaje de avance físico del proyecto es del 79.10%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/01/2021 - 05:22 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de chevrone en el tramo 3 By Pass Vía Quevedo - Quito desde la abscisa 7+400 a la 7+800, en el tramo 2 Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar, se realizó el fresado y colocación de carpetas asfáltica. Actualmente el porcentaje de avance físico es del 76.50%</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>02/12/2020 - 12:23 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de guardavías en el tramo 3 By Pass Vía Quevedo - Quito desde la abscisa 7+440 a la 7+800 y tramo 2 Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar en diferentes abscisas. Actualmente el porcentaje de avance físico es del 75.5%</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/11/2020 - 10:43 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020.- En este periodo se procedió con la colocación de Geomalla de Fibra de Vidrio Redondel Orangine, Fresado de carpeta asfáltica por bacheo de nivelación y Colocación de Guardavías tramo 3 abscisa 3+700 lado derecho By Pass Quevedo - Quito. Actualmente cuenta con un avance físico de 70,20%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>02/10/2020 - 01:07 PM</p>
<p>AGOSTO 2020.- En este período, continúan los trabajos correspondientes a la colocación de carpeta asfáltica en los tramos 2 y 3, redondel orangine - vía Quevedo, Vía Quevedo - Vía Quito, adicionalmente realizó el cambio de alcantarillas de armico en el tramo 2 redondel orangine - Vía Quevedo, en las abscisas 0+258 - 1+600 - 2+140, incluyendo la construcción de aceras y bordillos tramo 2. El avance físico del proyecto es del 67.00%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>04/09/2020 - 02:05 PM</p>
<p>JULIO 2020.- En este período, continúan los trabajos correspondientes a la colocación de carpeta asfáltica y geogrilla de fibra de vidrio en la abscisa 6+971 del Tramo 3 (By Pass Quevedo - Quito), y se realiza el cambio de 48 metros de alcantarilla de 1800mm en la abscisa 1+117 del Tramo 2 (By Pass Quevedo - Redondel Orangine), excavación de cajas en la rampa de acceso del Tramo 2. El avance físico del proyecto es del 62.50%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/08/2020 - 01:12 PM</p>
<p>JUNIO 2020.- Mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-71-OF de fecha 09 de junio de 2020, suscrito por el Mgs. Washington Patricio Navarro Batallas - Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, del numeral 408-16 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; además, en analogía con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-118-2020-OF de fecha 04 de junio de 2020, que en su parte pertinente reza: "En este sentido y valorando los aspectos eminentemente técnicos y legales citados, está fiscalización recomienda bajo su mejor criterio y sus competencias como administrador que se podría levantar la suspensión de los trabajos, 1/4". La Administración de Contrato, DISPONE el Levantamiento de la Suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 11 de junio del 2020.</p> <p>En razón de lo expuesto, en este período se realizaron los trabajos correspondientes a la colocación de la tercera capa de carpeta asfáltica y geogrilla de fibra de vidrio desde el Km 0+000 al 3+500, en el tramo 3 By Pass Quito - Quevedo.</p>	<p>Navarro Batallas, Washington Patricio</p>	<p>03/07/2020 - 01:21 PM</p>
<p>MAYO 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/06/2020 - 12:04 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p> <p>En este período no se ejecutaron avance en el proyecto, debido a las restricciones por parte de las Autoridades nacionales.</p>		
<p>ABRIL 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p> <p>En este período no se ejecutaron avance en el proyecto, debido que aún se encuentra vigente la restricción de movilidad en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>04/05/2020 - 08:44 PM</p>
<p>MARZO 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p> <p>Es importante indicar, que la compañía contratista Constructora Nacional S.A., debe mantener al menos un equipo de trabajo, conformado por personal, equipos y maquinaria; para que en caso de presentarse alguna emergencia en cualquiera de los tramos de intervención, sea de inmediato atendida y solucionada, a fin de garantizar la transitabilidad vehicular continua y segura.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>06/04/2020 - 07:40 AM</p>
<p>FEBRERO 2020.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 10" en el tramo 3 y tramo 2, Construcción de cunetas en el tramo 2 desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 1+500 , el avance físico actualmento es de 51.50%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>05/03/2020 - 07:45 PM</p>
<p>ENERO 2020.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 10", desde el km 0+000 hasta el 4+400 en ambos costados de la vía en el By Pass Quito - Quevedo, en el mismo By Pass desde la abscisa 4+400 hasta el 8+000 se construyen cunetas de hormigón simple, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la y construcción de cunetas de hormigón simple desde el kilómetro 0+000 hasta el 2+000 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 46.00%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>04/02/2020 - 02:42 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 8+400 hasta el 9+200 en ambos costados de la vía en el By Pass Quevedo - Quito, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la colocación de material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 2+500 hasta el 3+100 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 42.10%.</p>	<p>Linzán Mora, Luciano Vicente</p>	<p>03/01/2020 - 03:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 8+400 hasta el 9+200 en ambos costados de la vía en el By Pass Quevedo - Quito, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la colocación de material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 2+500 hasta el 3+100 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 37.10%.	Navarro Batallas, Washington Patricio	05/12/2019 - 03:16 PM
OCTUBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 5+200 hasta el 8+400 en ambos costados de la vía, en el By Pass Chone - Quevedo, se colocó material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 0+000 hasta el 2+500 en ambos costados de la vía, el avance físico actualmento es de 24.10%.	Linzán Mora, Luciano Vicente	05/11/2019 - 04:22 PM
SEPTIEMBRE 2019.- en este periodo se efectuó la colocación de base desde el km 0+000 hasta el 8+900 del By Pass Quito - Quevedo, paralelamente se continuó con la imprimación asfáltica y riego de liga, luego de esto se colocó la carpeta asfáltica de 3", todos estos trabajos se realizaron desde el km 3+200 hasta el 5+400 en el By Pass Quito - Quevedo, adicionalmente se iniciaron los trabajos de construcción de cunetas de hormigón simple en el sector antes indicado. Iniciaron los trabajos de excavación en cajas desde el km 0+000 hasta el km 2+000 del By Pass Quevedo - Chone. El avance físico durante este periodo es del 18.10%.	Linzán Mora, Luciano Vicente	04/10/2019 - 08:44 AM
AGOSTO 2019.- en este periodo la compañía contratista ejecutó los trabajos de excavación en cajoneras, transporte y colocación de material de mejoramiento, piedra escollera (Terraplene) y material para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del 12.42%. Adicionalmente se efectuó el cambio de alcantarilla en la abscisa 2+740 de 1.50 m de diámetro, la prolongación de la alcantarilla super luz tipo elipse en la abscisa 6+491, así como la imprimación desde la abscisa 3+500 hasta la 5+100 lado izquierdo (sentido By Pass Quito - Quevedo).	Linzán Mora, Luciano Vicente	03/09/2019 - 03:21 PM
JULIO 2019.- en este periodo la compañía contratista ejecutó el de excavación sin clasificar, gransporte y colocación de material de mejoramiento, piedra escollera (Terraplene) y material para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del 8%. Adicionalmente se efectuaron charlas de socialización con la comunidad, así como realizar un recorrido a la obra convocado por el señor Gobernador y Autoridades de la provincia, a efecto de constatar el avance físico de los trabajos.	Linzán Mora, Luciano Vicente	05/08/2019 - 10:01 AM
JUNIO 2019.- en este periodo la compañía contratista continua con la excavación en cajera desde la abscisa 0+600 hasta la 1+200 del By Pass Quito - Quevedo, así como realizar el relleno con material de mejoramiento de las cajas, de igual manera se realizan trabajos de estabilizacion de taludes con piedra escollera y cambio de tubería de agua potable de 500 y 600 mm respectivamente.	Linzán Mora, Luciano Vicente	04/07/2019 - 04:55 PM
MAYO 2019.- en este periodo se designa al Supervisor y Fiscalizador del proyecto, se efectuó el pago correspondiente al 30% del valor del anticipo, adicionalmente se coordinó con CNEL EP la reubicación de los postes de red eléctrica ubicados en la obra, razón por la cual aún no se han podido realizar trabajos de excavación en el proyecto.	Vera Marcillo, Carlos Leonidas	05/06/2019 - 05:37 PM
ABRIL 2019.- Con fecha 17 de Abril del 2019, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de Infraestructura de Transporte (E) y delegado del señor Ministro, firmó el contrato correspondiente proceso de contratación LO-MTOP-002-2018, mismo que tiene por objeto la "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO", con un presupuesto referencial de 24'079.492,91 y un plazo de ejecución de 450 días contados a partir de la suscripción del contrato y un anticipo 30%.	Vera Marcillo, Carlos Leonidas	02/05/2019 - 04:17 PM
MARAZO 2019.- en este periodo, en cumplimiento a las etapas del proceso de contratación del proyecto de "AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO", se efectuó la calificación de las ofertas técnicas presentadas. Con fecha 25 de marzo, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de Infraestructura del Transporte, aprueba el informe de recomendación de adjudicación para el proceso de contratación LO-MTOP-002-2018, así como autorizar a la Dirección de Contratación Pública del MTOP Administración Central, el acto administrativo correspondiente a la adjudicación del contrato.	Vera Marcillo, Carlos Leonidas	05/04/2019 - 12:48 PM
FEBRERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en etapa de entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de adjudicación el 08 de Marzo del 2019.	Vera Marcillo, Carlos Leonidas	01/03/2019 - 03:59 PM
ENERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en etapa de entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de adjudicación el 08 de Marzo del 2019.	Vera Marcillo, Carlos Leonidas	05/02/2019 - 05:15 PM

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Terminación a tiempo, los trabajos de ampliación a cuatro carriles	05/04/2022	Luciano Vicente Linzán Mora	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>3- REGIONAL. * General.</b> La falta de planificación considerando los periodos invernales y tipo de terreno CAUSARIA que NO se cumpla con la ejecución efectiva de los trabajos en el proyecto.	08/02/2022	Luciano Vicente Linzán Mora	40 %	60	24	1/3

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	25/07/2018		25/07/2018		Sí	0.5
2	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	25/07/2018		25/07/2018		Sí	0.25
3	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	03/12/2018		03/12/2018		Sí	0.25
4	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.4
6	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	1-Solicitud de Información	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
9	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	31/12/2018		20/12/2018		Sí	0.25
10	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	31/12/2018		28/03/2019		Sí	0.25
11	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	1-Solicitud de Información	15/03/2019		01/04/2019		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Contrato Principal suscrito	1-Solicitud de Información	31/03/2019		17/04/2019		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MAYO 2019	V - Verificación ejecutiva	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JUNIO 2019	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.4
15	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JULIO 2019	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	2.5
16	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período AGOSTO 2019	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	3.5
17	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período SEPTIEMBRE 2019	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	3.8
18	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período OCTUBRE 2019	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	4.9
19	EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito (En caso que aplique)	1-Solicitud de Información	31/10/2019		31/10/2019		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período NOVIEMBRE 2019	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019		30/11/2019		Sí	8.7
21	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período DICIEMBRE 2019	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019		31/12/2019		Sí	7.7
22	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ENERO 2020	V - Verificación ejecutiva	31/01/2020		31/01/2020		Sí	7.2
23	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período FEBRERO 2020	V - Verificación ejecutiva	29/02/2020		29/02/2020		Sí	6.5
24	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MARZO 2020	V - Verificación ejecutiva	31/03/2020		31/03/2020		Sí	7.0
25	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ABRIL 2020	V - Verificación ejecutiva	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.0
26	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MAYO 2020	V - Verificación ejecutiva	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.0
27	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JUNIO 2020	V - Verificación ejecutiva	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JULIO 2020	V - Verificación ejecutiva	10/07/2020		10/07/2020		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período AGOSTO 2020	1-Solicitud de Información	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período SEPTIEMBRE 2020	1-Solicitud de Información	30/09/2020		30/09/2020		Sí	3.0
31	EJECUCIÓN: Legalización Orden de Cambio 01	1-Solicitud de Información	30/09/2020		30/09/2020		Sí	3.0
32	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período OCTUBRE 2020	1-Solicitud de Información	31/10/2020		31/10/2020		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
33	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período NOVIEMBRE 2020	1-Solicitud de Información	30/11/2020		30/11/2020		Sí	3.0
34	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período DICIEMBRE 2020	1-Solicitud de Información	31/12/2020		31/12/2020		Sí	3.0
35	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ENERO 2021	1-Solicitud de Información	31/01/2021		31/01/2021		Sí	3.0
36	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ENERO 2022	1-Solicitud de Información	01/01/2022		28/02/2022		Sí	0.74
37	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período FEBRERO 2022	1-Solicitud de Información	01/02/2022		02/03/2022		Sí	0.74
38	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MARZO 2022	1-Solicitud de Información	01/03/2022		31/03/2022		Sí	0.74
39	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ABRIL 2022	1-Solicitud de Información	01/04/2022	31/05/2022			No	0.74
40	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MAYO 2022	1-Solicitud de Información	01/05/2022	30/06/2022			No	0.74
41	EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JUNIO 2022	1-Solicitud de Información	01/06/2022	31/07/2022			No	0.7
42	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	30/07/2022	30/10/2022			No	1.12
43	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	30/07/2022	31/08/2022			No	1.13
44	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	30/07/2022	30/10/2022			No	1.1
45	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	30/07/2022	28/10/2022			No	1.1
46	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/07/2022	28/10/2022			No	1.1
47	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	31/08/2022			No	1.12
48	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	28/11/2022	28/12/2022			No	1.1
49	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	9-Entregables Formales	30/11/2022	15/12/2022			No	1.13
50	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/12/2022	31/12/2022			No	1.1

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Avance de Obra		99.98 %	0.4991	0.499	17/04/2019	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,501,019.05 **
Costo Total:	33,949,275.06
Total Devengado:	19,144,426.06
% Costo Total Devengado:	56.39 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 56.39 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	32,412,320.73	3,000,000.00	0.00	35,412,320.73
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	19,265,471.38	10,268,797.21	0.00	29,534,268.59
Ppto. Codificado	16,547,045.41	3,746,108.68	0.00	20,293,154.09
Ppto. Comprometido	15,756,091.14	3,746,108.68	0.00	19,502,199.82
Planeado - Codificado (2021)		-746,108.68		
Programado a Devengar	16,547,045.41	3,746,108.68	0.00	20,293,154.09
Ppto. Devengado	15,754,910.37	3,389,515.69	0.00	19,144,426.06
Pagado Real	11,864,691.23	3,389,515.69	0.00	15,254,206.92
Estimado a fin de año	* 15,754,910.37	3,746,108.68	0.00	19,501,019.05
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	792,135.04	0.00	0.00	792,135.04
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 95.21 %	90.48 %	0.00 %	94.34 %
Ppto. Codificado 998	2,573,193.23	873,877.92	0.00	3,447,071.15
Ppto. Devengado 998	2,572,577.29	873,877.92	0.00	3,446,455.21

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	750,659.70	0.00	750,659.70	115.00 %		20.04 %
Abr	1,056,470.13	59,174.52	1,056,470.13	809,834.22	76.65 %		21.62 %
May	0.00	1,200,170.29	1,056,470.13	2,010,004.51	190.26 %		53.66 %
Jun	1,604,705.20	97,242.73	2,661,175.33	2,107,247.24	79.18 %		56.25 %
Jul	338,824.67	0.00	3,000,000.00	2,107,247.24	70.24 %		56.25 %
Ago	0.00	0.00	3,000,000.00	2,107,247.24	70.24 %		56.25 %
Sep	0.00	0.00	3,000,000.00	2,107,247.24	70.24 %		56.25 %
Oct	746,108.68	1,034,318.93	3,746,108.68	3,141,566.17	83.86 %		83.86 %
Nov	0.00	80,581.09	3,746,108.68	3,222,147.26	86.01 %		86.01 %
Dic	0.00	167,368.43	3,746,108.68	3,389,515.69	90.48 %		90.48 %
<b>Total</b>	<b>3,746,108.68</b>	<b>3,389,515.69</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	01042019 RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO LO-MTOP-002-2018	A.4.pdf	04/07/2019
2	01072021 Suspensión de plazo Anillo Vial Sto Dgo	E.4.pdf	01/07/2021
3	01102019 PLANILLA 03 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.5.pdf	01/10/2019
4	01102019 PLANILLA 04 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.6.pdf	01/10/2019
5	01102021 Contrato Complementario No. 2 legalizado	E_8_contrato_complementario_No_2.pdf	01/10/2021
6	01122021 Oficio de levantamiento de suspensión 15_11_2021	F.1_levantamiento_de_suspension_15_11_2021.pdf	01/12/2021
7	02052019 DESIGNACION SUPERVISOR Y FISCALIZADOR ANILLO VIAL STODGO MTOP-DDSCH-Z4-2019-1086-ME	A.9.pdf	04/07/2019
8	02092021 Contrato Complementario No. 2 para legalización	E.5.pdf	02/09/2021
9	02092021 PLAN DE ACCION SDT_MTOP-DDSCH-Z4-2021-2394-ME	E.6.pdf	02/09/2021
10	03012022 Ampliación de plazo	F.2.pdf	03/01/2022
11	03052021 PLANILLA 18 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	E.2.pdf	03/05/2021
12	04012021 PLANILLA 16 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STO DGO	D.4.pdf	30/12/2020
13	04022021 PLANILLA 17 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STO DGO	D.5.pdf	02/02/2021

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	04042019 CERTIFICACION PLURIANUAL ANILLO VIAL STODGO MTOP-SUBZ4-2019-0464-ME	A.5.pdf	04/07/2019
15	04062021 Planilla 19	E.3.pdf	04/06/2021
16	04102019 INICIO DE TRABAJOS BY PASS QUEVEDO - CHONE	B.7.pdf	04/10/2019
17	04122020 PLANILLA 15 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	D.3.pdf	03/12/2020
18	05022021 Oficio de suspension de plazo Anillo vial Sto Dgo feb 2021	D.6.pdf	02/03/2021
19	05042022 MTOP-DPSCH-GI-CONSV-2022-56-ME	F.4.pdf	05/04/2022
20	05062020 PLANILLA 10 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	C.5.pdf	05/06/2020
21	05082019 PLANILLA 02 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.4.pdf	05/08/2019
22	05112019 PLANILLA 05 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.8.pdf	05/11/2019
23	05112020 PLANILLA 13 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	D.1.pdf	05/11/2020
24	05112020 PLANILLA 14 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	D.2.pdf	05/11/2020
25	05122019 PLANILLA 06 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.9.pdf	06/12/2019
26	08022022 AMPLIACION FECHA FIN 31DIC2022	F3_ampliacion_fecha_fin.pdf	08/02/2022
27	08052019 PAGO DE ANTICIPO ANILLO VIAL STODGO MTOP-DF-2019-368-ME	B.1.pdf	04/07/2019
28	09062020 LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION MTOP-DDSCH-Z4-20-71-OF	C.6.pdf	03/07/2020
29	09092021 Oficio suspension de plazo AVSD sept 2021 por falta de pago	E.9.pdf	07/10/2021
30	10122018 CRONOGRAMA VALORADO PROYECTO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO	A.3.pdf	04/07/2019
31	10122018 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO	A.2.pdf	04/07/2019
32	12062019 PLANILLA 01 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	B.3.pdf	04/07/2019
33	17042019 Contrato Anillo Vial	D.7.pdf	12/03/2021
34	17042019 CONTRATO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO	A.6.pdf	04/07/2019
35	18022020 K014 - CEDULA PRESUPUESTARIA - ENERO 2020	C.1.pdf	18/02/2020
36	18042019 ACTA DE INICIO DE PROYECTO ANILLO VIAL STODGO	A.7.pdf	04/07/2019
37	18042019 EJECUCION DE TRABAJOS EMERGENTES ALCANTARILLA KM 8+240 MTOP-DDSCH-Z4-19-012-OF-I	A.8.pdf	04/07/2019
38	19032020 AUTORIZCION DE SUSPENSION DE TRABAJOS DE AMPLIACION AVSD	C.4.pdf	06/04/2020
39	21052019 SOLICITUD DE PEDIDO PROYECTO ELECTRICO AVSDT MTOP-DDSCH-Z4-2019-1232-ME	B.2.pdf	04/07/2019
40	22042021 Ratificacion de lideres_MTOP-DDSCH-Z4-2021-1181-ME	E.1.pdf	22/04/2021
41	25062018 DICTAMEN DE PRIORIDAD ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO SENPLADES-SIP-2018-0625-OF	C.7.pdf	03/07/2020
42	25072018 DICTAMEN PRIORIDAD ANILLO VIAL STODGO SENPLADES-SIP-2018-0625-OF	A.1.pdf	04/07/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
43	30112019 PLANILLA 07 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	C.1.pdf	06/04/2020
44	31012020 PLANILLA 09 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	C.3.pdf	06/04/2020
45	31032021 Oficio de reinicio de obra, una vez que se legalizó el contrato complementario-parte 1	D.8.jpg	31/03/2021
46	31032021 Oficio de reinicio de obra, una vez que se legalizó el contrato complementario-parte 2	D.9.jpg	31/03/2021
47	31052021 Designación de líder de proyecto Abr 2021	Memorando_Nro._MTOB-DDSCH-Z4-2021-1181-ME_(Santo_Domingo).pdf	31/05/2021
48	31122019 PLANILLA 08 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO	C.2.pdf	06/04/2020
49	Oficio levantamiento suspension No. 2	E.7.pdf	07/09/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Molina Cedeño, Yuver Alexander	Subsecretario Regional 4	Subsecretario Zonal 4	ymolina@mtop.gob.ec	
Quimiz Loor, Victor Hugo	Supervisor del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	vquimiz@mtop.gob.ec	022750044 EXT 41721
Quimiz Loor, Victor Hugo	Fiscalizador del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	vquimiz@mtop.gob.ec	022750044 EXT 41721
Sánchez Granda, Freddy Ernesto	Administrador de Contrato	Director Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas	fsanchez@mtop.gob.ec	0994232804

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
132282_1.jpg	05/10/2021
