

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua

PROYECTO: K026 MTOP - Estudios definitivos para la rectificación mejoramiento y ampliación a cuatro carriles la carretera Pelileo - Baños - Puyo y construcción del paso lateral de Mera y Shell

Líder del Proyecto:	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín (wpulluquitin@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MTOP - MANTA MANAOS, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO INCLUYE PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
Titular:	Galarza García, Diego Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.7392	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	333,110.82
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/11/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	02/08/2018	Fecha de Fin Base:	01/11/2013
Modificado por:	Galarza García, Diego Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2018

DATOS GENERALES

Descripción

CONTRATO: Estudios pre-preliminares para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, incluye paso lateral de Mera y Shell.
 DESCRIPCION: Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I003 el 06/01/2014
 Convertido del Proyecto de Inversión K063 el 06/01/2014
 para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, incluye paso lateral de Mera y Shell para determinar la viabilidad para la construcción de la carretera Pelileo-Baños-Puyo.

LINEA BASE: Los estrudios pre preliminares para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, incluye paso lateral de Mera y Shell están ubicados en la Zona de la Provincia de Tungurahua, los mismos que servirán para mejorar la vía con incremento de capacidad de tráfico vehicular y de calidad de servicio en las zonas sierra y oriente.

PRODUCTO: Entrega de los estudios pre preliminares.

OBJETIVO: Se realizarán los estudios de factibilidad, impactos ambientales a nivel prepreliminar de la carretera Pepileo-Baños-Puyo de una longitud aproximada de 125 km, ubicado en las provincias de Tungurahua y Pastaza. (Plazao para entrega de estudio prepreliminares 120 días a partir de la entrega del anticipo). Posteriormente se procederán a realizar los estudios preliminares y finalmente los definitivos.

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento se reducirá.
 El comercio va a mejorar en la provincia.
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.

Tipo de Beneficiario

Turístico
 -Industrial
 -Agrícola
 -Ganadero

Restricciones

Tiempo: El estudio tiene una duración de 3 años y se espera terminar en nov/2014. La comunidad y el país tendrán que esperar hasta el 2016 para contar con la carretera.


Fuertes Lluvias: hacen que impiden el avance de los Estudios para la carretera Pelileo-Baños-Puyo, y a que al grupo de trabajo afecta la lluvia en el rendimiento.

Erupcion del Volcán Tungurahua: caída de ceniza y material peroplástico, afecta en el rendimiento de los estudios

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 95.42 %
 Fecha de Inicio: 01/11/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

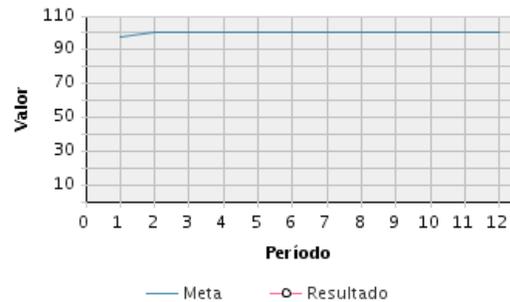

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2018: 1. El avance general del estudio es el 90% 2. Se está trabajando en l aplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 10:18 PM
JUNIO 2018: 1. El avance general del estudio es el 85% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #2 del contrato complementario #2.	Galarza García, Diego Fernando	05/07/2018 - 06:07 PM
MAYO 2018: 1. El avance general del estudio es el 82% 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9 y se está trabajando en laplanilla #1 del contrato complementario.	Galarza García, Diego Fernando	05/06/2018 - 11:45 AM
ABRIL 2018: 1. El avance general del estudio es el 75% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #10	Galarza García, Diego Fernando	04/05/2018 - 05:44 PM
FEBRERO 2018: 1. El avance general del estudio es el 70% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. 2. Los pagos de planillas están cumplidos hasta la #9	Galarza García, Diego Fernando	05/04/2018 - 12:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo. Se entregó planillas y se iniciará el proceso de pago de las mismas</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/03/2018 - 08:05 PM
<p>ENERO 2018: El avance general del estudio es el 55% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.</p>	Galarza García, Diego Fernando	28/02/2018 - 06:23 PM
<p>DICIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario. El avance general del estudio es el 40% y se está trabajando en la socialización para la apertura del paso lateral Pelileo.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 05:54 PM
<p>NOVIEMBRE 2017: Se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se ha firmado un contrato complementario.</p>	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 04:46 PM
<p>OCTUBRE 2017: Al ser aprobado la ruta no. 04 del paso lateral de Pelileo, se ha iniciado los trabajos correspondientes de topografía, se está gestionando un contrato complementario por parte de la consultora en el mismo que se ajustaran rubros, cantidades y valores con el mismo valor contractual vigente, y se remitirá la correspondiente ampliación de plazo respectiva.</p>	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 02:36 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizó el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inició el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continúa con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 07:59 PM
<p>AGOSTO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizó el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inició el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continúa con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	12/09/2017 - 04:04 PM
<p>JULIO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizó el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inició el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito, se continúa con el rubro ambiental, se ha ingresado un avance del estudio de factibilidad</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 08:07 PM
<p>JUNIO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizó el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inició el proyecto, se ha ingresado el estudio de selección de ruta del paso lateral de pelileo mismo que se encuentra en revisión en matriz quito</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 05:35 PM
<p>MAYO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizó el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inició el proyecto</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 06:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto	Gamboa López, Enma Katherine	05/05/2017 - 10:29 AM
MARZO 2017: Se procedió con la firma del contrato de los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se legalizo el 07 de Marzo del 2017 y de acuerdo al contrato se procedió con el pago del anticipo al contratista con fecha 22 de Marzo del 2017, con lo cual se inicio el proyecto	Gamboa López, Enma Katherine	21/04/2017 - 01:44 PM
FEBRERO 2017: Se publicó el proceso de contatación de los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que concluyó con la suscripción de la resolución el 20/02/2017 fecha en la cual se adjudicó el contrato al "Consortio Pelileo - Baños".	Gamboa López, Enma Katherine	21/04/2017 - 01:42 PM
ENERO 2017: Se iincia el proceso de contratación para los estudios de "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", mismo que se planifica su publicación para el mes de Febrero del 2017	Gamboa López, Enma Katherine	21/04/2017 - 01:35 PM
FEBRERO 2015: Se ha procedido por parte de la Empresa Consultora a entregar el producto final de la Consultoría con sus respectivas copias según contrato, y a la firma del Acta Unica de Recepción del Estudio.	Gamboa López, Enma Katherine	21/04/2017 - 01:35 PM
ENERO DEL 2015: SE HA NOMBRADO LA COMISION TECNICA PARA LA ELABORACION Y FIRMA DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	24/02/2015 - 02:53 PM
DICIEMBRE DEL 2014: SE HA INFORMADO MEDIANTE QUIPUX AL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA, EN LO RELACIONADO A LAS APROBACIONES DEL MISMO, SE DEBE AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA ELABORACION DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, A LA VEZ QUE REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION TECNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	03/02/2015 - 04:14 PM
NOVIEMBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	09/12/2014 - 04:32 PM
OCTUBRE DEL 2014: LA CONSULTORA HA INGRESADO EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORIA (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), PARA SU REVISION Y APROBACION DE SER EL CASO, A LA VEZ SE HA INGRESADO LA PLANILLA UNICA POR PRODUCTO TERMINADO, Y SE ESTA PREPARANDO LA LIQUIDACION ECONOMICA Y EL BORRADOR DEL ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	10/11/2014 - 05:17 PM
SEPTIEMBRE 2014: SE HA SOLICITADO LA INFORMACION DE SUSTENTO CORRESPONDIENTE A LOS EX-SUPERVISORES DEL PROYECTO, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2. se ha procedido a prestar atención a Memorando Nro. MTOP-SUBREG3-2014-2725-ME de fecha , Ambato, 22 de septiembre de 2014, y se ha procedido a instalar la reunión a las 10h00 de este mes y día, con la presencia del Ing. Luis Salvador (Matriz Quito - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS), la Consultora CIEPER representada por el Ing. Luis Vallejo (Director del Proyecto de la Pelileo - Baños - Puyo) e Ing. Iván Mier, los Ex - Supervisores del proyecto de la referencia por parte del MTOP, Ing. Juan Carlos Hidalgo e Ing. Milton León, y mi persona.	Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín	07/10/2014 - 10:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se ha solicitado que los Ex - Supervisores , presenten y justifiquen absolutamente todos los documentos generados en el transcurso de dichas supervisiones, para lo que me permito informar que así se ha procedido, de tal manera que una vez analizada exhaustiva y detalladamente dicha información muy importante para continuar con el proceso de la Supervisión a mi encomendada, se constató entre los presentes que el Proyecto ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS PUYO DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 125 KM UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y PASTAZA, puede continuar con trámite correspondiente, es así que la fecha tope para la presentación del producto final de consultoría (INFORMES Y PLANOS DEFINITIVOS), se estableció para el día Jueves 02 de Octubre del 2014.</p> <p>En el caso de que la empresa consultora no acate dicha disposición, se procederá al cobro de multas correspondientes según contrato de manera irrevocable.</p> <p>Además me cumple también informar que la elaboración del ACTA UNICA DE RECEPCION DEL ESTUDIO, está en el proceso de elaboración y corrección para trámite correspondiente.</p> <p>Se ha procedido también a elaborar el proceso de la liquidación del proyecto, de lo que se ha definido ya los valores a ser planillados en PLANILLA UNICA que será presentada por el Consultor para proceder a la liquidación definitiva por parte del Departamento financiero del MTOP, a la vez debo informar que también del valor planillado será descontado el valor correspondiente de multas según Memorando Nro. MTOP-CONS_PAZ-2014-121-ME, Siendo aproximadamente las 14h00, se procede a clausurar la reunión, previo hacer incapié en todos los detalles a ser cumplidos y que han sido detallados anteriormente.</p>		
<p>AGOSTO: SE A NOMBRADO COMO NUEVO SUPERVISOR AL ING. WASHINGTON PULLUQUITIN, LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>26/09/2014 - 03:33 PM</p>
<p>JULIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>26/09/2014 - 03:32 PM</p>
<p>JUNIO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>26/09/2014 - 03:32 PM</p>
<p>MAYO 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO. CABE INDICAR QUE LA SUBSECRETARIA REGIONAL 3 NO DISPONE DE LOS ESPECIALISTAS DE AREA COMPLETOS, POR LO QUE SE HA SOLICITADO AYUDA A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE PASTAZA, CHIMBORAZO, SUBSECRETARIA REGIONAL 2.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>26/09/2014 - 03:31 PM</p>
<p>ABRIL 2014: LOS ESTUDIOS HAN SIDO ENTREGADOS AL 100%, POR PARTE DE LA CONSULTORA CIEPER, EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REVISIÓN - CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES - Y APROBACIONES DE SER EL CASO.</p>	<p>Pulluquitín Tutasig, Washington Efraín</p>	<p>26/09/2014 - 02:56 PM</p>
<p>FEBRERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.</p>	<p>León Jácome, Milton</p>	<p>11/03/2014 - 09:41 AM</p>
<p>ENERO 2014: Los estudios en proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 , cada quien en su especialidad.</p>	<p>Guevara Rodríguez, Luis</p>	<p>07/02/2014 - 12:05 PM</p>
<p>NOVIEMBRE: Los estudios en proceso de revisión, observación, corrección y aprobación por parte de los Profesionales de la Subsecretaría cada quien en su especialidad.</p>	<p>León Jácome, Milton</p>	<p>29/11/2013 - 10:27 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013: Periodo que debe informar el Supervisor de la Provincia de Pasta, ya que entrega documentos del Proyecto a Tungurahua, mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_PAS-2013-148-ME de fecha 12 de Noviembre de 2013.</p>	<p>León Jácome, Milton</p>	<p>29/11/2013 - 10:23 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE DEL 2013:</p>	<p>Barreno Lombeida, Jorge Washington</p>	<p>08/10/2013 - 12:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.		
AGOSTO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/09/2013 - 11:53 AM
JULIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:48 AM
JUNIO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	09/07/2013 - 09:50 AM
MAYO DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/06/2013 - 03:27 PM
ABRIL DEL 2013: -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	10/05/2013 - 04:00 PM
MARZO 2013 - -Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM
FEBRERO 2013: - Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 09:29 AM
	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/03/2013 - 04:09 PM
Enero 2013: - Revisión de informes finales por parte de técnicos de la Dirección de Pastaza y la subsecretaría R3.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:08 AM
DICIEMBRE 2012: - Revisión de informes finales por parte de técnicos de la dirección Provincial de Pastaza y subsecretaría R3	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 09:07 AM
NOVIEMBRE DEL 2012: - Se requiere los informes técnicos de Geotécnica, Geología e Hidrología que se solicitó a la subsecretaría su revisión y aprobación, ya que en la Dirección Provincial de Pastaza no se cuenta con técnicos en el área. Se espera contar con los informes finales y proceder al pago de planillas e informes finales.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:46 AM
OCTUBRE 2012: Con OFICIO-CIEPER-PELILEO-BAÑOS-015-2012, la Consultora Cieper presenta los informes de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, para su revisión y aprobación. SEPTIEMBRE 2012: Mediante Oficio Nro. MTOP-CONS_PAS-12-12-OF, se le comunica a la Consultora CIEPER; que por no presentar la información completa de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA A NIVEL PRE-PRELIMINAR DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS-PUYO DE 125 KM, dentro del tiempo contractual y por los retrasos en la entrega de dichos estudios se procederá a las multas respectivas de acuerdo a la Cláusula Décima Segunda del contrato. AGOSTO 2012: Entregan informe final de estudios para revisión. Consultora CIEPER entrega informes incompletos.	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Junio-Julio 2012: ESTUDIO DE CARTAS TOPOGRAFICAS Y EXPLORACIÓN TERRESTRE, ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE SELECCIÓN DE RUTA, DISEÑO Y DIBUJO DEL ANTEPROYECTO, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y IMPACTO AMBIENTAL.</p> <p>Mayo 2012: La contratista realiza el estudio AEREOFOTOGRAFOMETRICO, se espera la presentacion del informe por escrito.</p> <p>Abril 2012: Con fecha 2 de abril se firma el contrato con la Consultora CIEPER CIA. Ltda. El contrato se encuentra en ejecución. Con fecha 12 de abril inician trabajos Consultora CIEPER</p> <p>Febrero 2012: Se espera que CIEPER CIA. Ltda. Presente toda la información necesaria para proceder a la firma del contrato.</p> <p>Enero 2012: El 18 de enero se realizó la apertura de ofertas por parte de la comisión técnica y el 28 de enero se adjudicó el proyecto a CIEPER CIA. Ltda.</p> <p>Diciembre 2011: Se publico en el portal de compras públicas el 27 de diciembre de 2012.</p>		

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos económicos CAUSARÍA que el proyecto se retrase</p>	02/08/2018	Washington Efraín Pulluquitín Tutasig	30 %	50	15	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Mera
2	Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza
3	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa
4	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Patate

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Contratacion realizada	1-Solicitud de Información	01/11/2011		01/11/2011		Sí	2.0
2	PLANEACION: Recursos economicos tramitado	1-Solicitud de Información	05/11/2011		05/11/2011		Sí	12.0
3	PLANEACION: Publicacion en el portal realizado	1-Solicitud de Información	27/12/2011		27/12/2011		Sí	10.0
4	EJECUCION: Contrato adjudicado	3-Adjudicación	27/01/2012		27/01/2012		Sí	10.0
5	PLANEACION: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	02/04/2012		02/04/2012		Sí	10.0
6	EJECUCION:Cartas topográficas y exploración terrestre realizado restitución	5-Entregables Intermedios	05/06/2012		05/06/2012		Sí	16.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000							
7	EJECUCION: Estudio geológico-geotécnico de selección de ruta Restitución aerofotogramétrica, ancho de 500m, escala 1:5000 Diseño y dibujo del anteproyecto. Estudio de prefactibilidad. Impacto ambiental realizado	5-Entregables Intermedios	05/07/2012		05/07/2012		Sí	12.0
8	EJECUCION:Inspecciones en el campo realizado	5-Entregables Intermedios	09/08/2012		09/08/2012		Sí	7.0
9	EJECUCION:Observaciones efectuadas por los Profesionales de la Subsecretaría Regional 3 a las correcciones de la Consultora realizado.	5-Entregables Intermedios	20/08/2013		20/08/2013		Sí	2.0
10	EJECUCION: Inspecciones de trabajos en el campo realizados	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	2.0
11	CIERRE: Informe final de ingeniería entregado	9-Entregables Formales	06/10/2014		06/10/2014		Sí	2.0
12	CIERRE: Acta de entrega y recepción definitiva entregada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	2.0
13	CIERRE: Liquidación económica, pagada	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	2.0
14	PLANEACION: Publicacion en el portal realizado	1-Solicitud de Información	23/01/2017		23/01/2017		Sí	1.0
15	EJECUCION: Contrato adjudicado	3-Adjudicación	20/02/2017		20/02/2017		Sí	2.0
16	PLANEACION: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	07/03/2017		07/03/2017		Sí	1.0
17	EJECUCION:Estudio de Tráfico	5-Entregables Intermedios	19/06/2017		19/06/2017		Sí	2.0
18	EJECUCION: Estudio Preliminar Paso Lateral de Pelileo	5-Entregables Intermedios	18/09/2017	31/07/2018			No	1.0
19	EJECUCION: Estudio de Ingeniería Definitivo	5-Entregables Intermedios	15/01/2018	31/07/2018			No	1.0
20	EJECUCION: Desarrollo de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental	5-Entregables Intermedios	19/01/2018	31/07/2018			No	1.0
21	CIERRE: Acta de entrega y recepción definitiva entregada.	9-Entregables Formales	20/02/2018	31/07/2018			No	1.0
22	CIERRE: Liquidación económica, pagada	9-Entregables Formales	28/02/2018	31/07/2018			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ESTUDIO		100.00 %	95	95	01/01/2017	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	127,402.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	333,110.82 **
Costo Total:	177,903.39
Total Devengado:	333,110.82
% Costo Total Devengado:	187.24 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 187.24 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,233,507.20	0.00	0.00	2,233,507.20
Ppto. Externo Planeado	254,804.00	0.00	0.00	254,804.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,791,680.28	0.00	0.00	4,791,680.28
Ppto. Codificado	1,795,749.00	0.00	0.00	1,795,749.00
Ppto. Comprometido	985,193.57	0.00	0.00	985,193.57
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	1,274,064.39	0.00	0.00	1,274,064.39
Ppto. Devengado	333,110.82	0.00	0.00	333,110.82
Pagado Real	285,565.12	0.00	0.00	285,565.12
Estimado a fin de año	* 333,110.82	0.00	0.00	333,110.82
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	940,953.57	0.00	0.00	940,953.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 26.15 %	0.00 %	0.00 %	26.15 %
Ppto. Codificado 998	127,402.00	0.00	0.00	127,402.00
Ppto. Devengado 998	127,402.00	0.00	0.00	127,402.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		MTOP-SUBREG3-2014-2741-ME.pdf	26/09/2014
2		PELILEO_BAÑOS_PUYO_MTOP.pdf	07/10/2014
3		INFORME_EJECUTIVO_-PELILEO_BAÑOS_PUYO_MTOP-OCTUBRE_DEL_2014.pdf	07/10/2014
4		INFORME_EJECUTIVO_-PELILEO_BAÑOS_PUYO PRESIDENCIA-OCTUBRE_DEL_2014.pdf	07/10/2014
5		INFORME_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DEL_2014.pdf	11/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6		INFORME_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DEL_2014.pdf	11/12/2014
7		REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
8		C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf	03/02/2015
9		ACTA_UNICA_DE_RECEPCION_DEL_ESTUDIO_PRE-PRELIMINAR_DE_LA_VIA_PELILEO-BAÑOS-PUYO.pdf	24/02/2015
10		C8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_DEL_2015.pdf	24/02/2015
11		ENTREGA_DEL_PRODUCTO_TERMINADO_AL_ADMINISTRADOR_DEL_CONTRATO_INCORPORACION_DEL	
12	A-Contrato de Estudios Prepreliminares	Estudios_Prepreliminares.pdf	28/05/2012
13	A1 INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	14/02/2013
14	A2 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	14/02/2013
15	A3 INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf	14/02/2013
16	A4 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf	14/02/2013
17	A5 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
18	A6 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	14/02/2013
19	A7 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
20	A8 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE DEL 2012	INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
21	B1 INFORME EJECUTIVO ENERO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	14/02/2013
22	B2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013	INFORMES_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	06/03/2013
23	B3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	10/05/2013
24	B4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	10/05/2013
25	B5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	06/06/2013
26	B6 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	10/07/2013
27	B7 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf	06/08/2013
28	B8 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	06/09/2013
29	B9 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	08/10/2013
30	B9.1 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	Informe_Ejecutivo_Diciembre_2013_CIEPER.htm	06/01/2014
31	C1 INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	GestionReporteFN-1.txt	06/02/2014
32	C2 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	Informe_Ejecutivo_Febrero_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
33	C3 INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	Informe_Ejecutivo_Marzo_2014_CIEPER.pdf	31/03/2014
34	C4 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	30/04/2014
35	C5 Informe Ejecutivo Octubre 2014	Informe_Ejecutivo_Octubre_2014.pdf	05/11/2014
36	C6 Informe ejecutivo Noviembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
37	C7 Informe ejecutivo Diciembre 2014	REPORTE_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_DE_2014.pdf	12/12/2014
38	C8 AYUDA MEMORIA ABRIL 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_ABRIL_2017.pdf	05/05/2017
39	C9 AYUDA MEMORIA MAYO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_MAYO_2017..pdf	05/06/2017
40	CONTRATO ESTUDIOS PELILEO BAÑOS	CONTRATO_RE-MTOP-SUBZ3-1-2017_Estudios_Ampliacion_4_carriles_Pelileo-Baños_P.L._Pelileo_34_km.pdf	21/04/2017
41	D1 AYUDA MEMORIA JUNIO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
42	D2 AYUDA MEMORIA JULIO 2017	AYUDA_MEMORIA_SITOP_JULIO_2017.pdf	04/08/2017
43	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_DIC-AMPLIACION_4_CARRILES_DE_LA_PELILEO_BAÑOS.pdf	05/01/2018
44	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017	Estudio_para_Ampliacion_4_carriles_Pelileo_Baños.pdf	05/12/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Valencia Vásconez, Jairo David	DIRECTOR PROVINCIAL	Director	jvalencia@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
GAMBOA LÓPEZ, ENMA KATHERINE	LIDER DEL PROYECTO	Coordinadora de Infraestructura Provincial (E)	egamboa@mtop.gob.ec	0992606859
Paula López, Ricardo Octavio	PATROCINADOR EJECUTIVO	Subsecretario de Infraestructura del Transporte	rpaula@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30403_1.jpg	06/02/2015
