

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K016 MTOP - Reconstrucción de la vía Arenillas - La Avanzada

Líder del Proyecto:	Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	Provincia - El Oro, RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLAS-LA AVANZADA, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.36
CUP:	175200000.0000.21.6406	TIR:	16.40 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	4,235,340.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,203,007.42
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	02/05/2019	Fecha de Fin Base:	15/05/2018
Modificado por:	Nieto Orellana, Galo Secundino	Fecha del siguiente Hito:	05/11/2019

DATOS GENERALES

Descripción

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 13'036.422,48
 CONTRATISTA: Carvallo A.Z. Cía. Ltda.
 PLAZO: 18 Meses.
 ANTICIPO (30%): \$ 3'910.926,74
 ORDEN DE CAMBIO No. 1: Por diferencia de cantidades de obra, sin aumento de monto contractual y sin incremento de plazo.
 ORDEN DE CAMBIO No. 2: Por incremento de monto 2'771.035,62 y plazo de 5 meses hasta 15 de Abril 2014.
 ORDEN DE CAMBIO No. 3: Sin aumento de monto contractual y sin incremento de plazo.
 ORDEN DE CAMBIO No. 4: Sin aumento de monto contractual y un aumento de plazo de 6 meses a partir del 16 de Abril del 2014 hasta el 15 de Octubre del 2014.
 ORDEN DE CAMBIO No. 5: Sin aumento de monto contractual ni plazo.

PLAZO VIGENTE: 29 Meses

PRODUCTO: Esta vía pertenece al eje vial E-25, en el tramo comprendido entre Yee de la Avanzada y Arenillas, requiere ser reconstruida y ampliada; y, su trazado corregido y tener una vía con los parámetros de una autopista; contempla la construcción de un puente.

LINEA BASE: Permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria. Además se logra la revalorización de los predios de las zonas aledañas permitiendo el ingreso a áreas productivas y sitios turísticos.

OBJETIVO GENERAL: El proyecto en ejecución es parte del Eje Vial 1 carretera Huaquillas-Santa Rosa, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria.

OBJETIVO ESPECIFICO: Al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con tipo de vía AUTOVIA, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios. La carretera se construye en asfalto considerando el confort y la seguridad en la conducción con una señalización de acuerdo a la norma e indicadores de niveles de servicio según las especificaciones del MTOP.

Beneficios Cualitativos

El proyecto en ejecución es parte del Eje Vial 1 carretera Huaquillas-Santa Rosa, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria. La carretera se construye en asfalto considerando el confort y la seguridad en la conducción con una señalización de acuerdo a la norma e indicadores de niveles de servicio según las especificaciones del MTOP. Además se logra la revalorización de los predios de las zonas aledañas permitiendo el ingreso a áreas productivas y sitios turísticos.

Tipo de Beneficiario

Agricultores, ganaderos, comercio, turismo internacional.

Tipo de Beneficiario

Area de influencia: El Oro, Loja, Zamora, Norte de Perú.

Restricciones


Abastecimiento de combustibles, ubicación de escombreras,

Fase Actual:

- Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.37 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	93 %	94 %										
Estado												
	●	●										

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica aprobada , Planilla por trabajos adicionales extra contractuales en tramite para pago, se ha solicitado criterio jurídico para la continuidad del pago.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/05/2019 - 07:40 PM
Marzo 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Acta de Entrega Recepción. Liquidación Económica aprobada , Planilla por trabajos adicionales extra contractuales en tramite para pago.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/04/2019 - 10:07 AM
Febrero 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite Acta de Entrega Recepción Liquidación Económica, Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/03/2019 - 04:28 PM
Enero 2019: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/02/2019 - 08:30 PM
dICIEMBRE 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Bazurto Orellana, Pedro	04/01/2019 - 02:05 PM
Noviembre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2018 - 09:13 AM
Octubre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/11/2018 - 06:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2018 - 04:01 PM
Agosto 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/09/2018 - 03:02 PM
Julio 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/08/2018 - 05:53 PM
Junio 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/07/2018 - 08:33 PM
Mayo 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/06/2018 - 10:47 PM
Abril 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica de Convenio de Pago de Obra y planillas de liquidación de fiscalización.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/05/2018 - 04:55 PM
Marzo 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/04/2018 - 05:25 PM
Febrero 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	05/03/2018 - 01:59 PM
ENERO 2018: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	05/02/2018 - 08:55 AM
DICIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	05/01/2018 - 02:30 PM
NOVIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	04/12/2017 - 04:27 PM
OCTUBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	01/11/2017 - 03:18 PM
SEPTIEMBRE 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	03/10/2017 - 10:45 AM
AGOSTO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	04/09/2017 - 10:42 AM
JULIO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	03/08/2017 - 10:51 AM
JUNIO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	03/07/2017 - 03:36 PM
MAYO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	Ube Borja, Julio César	29/05/2017 - 03:39 PM
ABRIL 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; en trámite liquidación económica	González Villavicencio, Volter Hernel	23/05/2017 - 09:41 AM
MARZO 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas; Tiene CANCELADO todos los Valores	Ube Borja, Julio César	04/04/2017 - 10:19 AM
Febrero 2017: Proyecto terminado por mutuo acuerdo el 08 de Agosto de 2016; es parte integrante vía concesionada Río Siete - Huaquillas	González Villavicencio, Volter Hernel	02/03/2017 - 10:06 AM
ENERO 2017: PROYECTO, SE TERMINO POR MUTUO ACUERDO EL 08 AGTO 2016; ES PARTE INTEGRANTE VIA CONCESIONADA VIA RIO SIETE - HUAQUILLAS.	Ube Borja, Julio César	03/02/2017 - 02:19 PM
DICIEMBRE 2016: TRAMO ES PARTE INTEGRANTE VIA CONCESIONADA VIA RIO SIETE - HUAQUILLAS, SE TERMINO POR MUTUO ACUERDO EL 08 AGTO 2016	Bazurto Orellana, Pedro	04/01/2017 - 10:02 AM
NOVIEMBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical, por firma de CONSESION del eje Vial 1; a la espera de la Firma del Acta de Terminacion Unilateral.	Ube Borja, Julio César	05/12/2016 - 03:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical, por firma de CONSECCION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento Juridico.	Ube Borja, Julio César	01/11/2016 - 01:59 PM
SEPTIEMBRE - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical, por firma de CONSECCION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento Juridico.	Ube Borja, Julio César	05/10/2016 - 04:50 PM
AGOSTO - 2016:- Se SUPENDIERON TEMPORALMENTE las actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical, por firma de CONSECCION del eje Vial 1; a la espera de Pronunciamiento Juridico.	Ube Borja, Julio César	05/09/2016 - 12:15 PM
JULIO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y Limpieza de señalizacion Vertical.	Ube Borja, Julio César	08/08/2016 - 10:50 AM
JUNIO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	04/07/2016 - 01:18 PM
MAYO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano.	Ube Borja, Julio César	03/06/2016 - 05:07 PM
ABRIL - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano.	Ube Borja, Julio César	05/05/2016 - 10:23 AM
MARZO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano se ha cumplido el 1er año de mantenimiento.	Ube Borja, Julio César	05/04/2016 - 12:41 PM
FEBRERO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	03/03/2016 - 12:21 PM
ENERO - 2016:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	04/02/2016 - 12:37 PM
DICIEMBRE - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	05/01/2016 - 03:09 PM
NOVIEMBRE - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Bazurto Orellana, Pedro	04/12/2015 - 04:09 PM
OCTUBRE - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	05/11/2015 - 04:56 PM
SEPTIEMBRE - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	07/10/2015 - 09:47 AM
AGOSTO - 2015:- Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	07/09/2015 - 10:44 AM
Julio 2015: Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	03/08/2015 - 09:53 AM
Junio 2015: Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Ube Borja, Julio César	02/07/2015 - 02:14 PM
Mayo 2015: Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento: Roza a mano, Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas y encauzamiento a mano	Bazurto Orellana, Pedro	05/06/2015 - 03:06 PM
Abril 2015: La obra se encuentra en mantenimiento, se realizaron trabajos de Roza a mano (19+600 - 20+490, 20+800 - 21-420, 21+500 - 21+750, 22+150 - 22+600, 23+300 - 23+600, 23+700 - 24+200, 25+820 - 266+220, 2+260 - 29+500, 29+600 - 30+000), Limpieza de cuneta y encauzamiento a mano (19+600 - 19+700, 20+500 - 20+650, 20+650 - 20+700, 21+000 - 21+050, etc.).	Bazurto Orellana, Pedro	05/05/2015 - 09:59 AM
Abril 2015: La obra se encuentra en mantenimiento.	Bazurto Orellana, Pedro	04/05/2015 - 04:40 PM
Marzo 2015: Se encuentra elaborada la Acta de Recepción Provisional; y en proceso el mantenimiento.	Bazurto Orellana, Pedro	06/04/2015 - 03:44 PM
Febrero 2015: La obra se encuentra culminada.	Bazurto Orellana, Pedro	06/03/2015 - 02:47 PM
Enero 2015: La obra se encuentra culminada.	Bazurto Orellana, Pedro	04/02/2015 - 12:00 PM
Diciembre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha.	Bazurto Orellana, Pedro	06/01/2015 - 12:13 PM
Noviembre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha.	Bazurto Orellana, Pedro	15/12/2014 - 08:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha.	Bazurto Orellana, Pedro	05/12/2014 - 02:11 PM
Octubre 2014: Se terminaron los trabajos a la fecha.	Bazurto Orellana, Pedro	06/11/2014 - 10:37 AM
Septiembre 2014: Se realizaron trabajos de: Drenaje: Colocación de hormigón estructural para cunetas, excavación para cunetas y encauzamientos. Obras de Calzada: Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, asfalto para riego de adherencia, Capara de rodadura asfalto mezclado en planta. Señalización y Seguridad Vial: Colocación de guardacaminos.	Bazurto Orellana, Pedro	07/10/2014 - 08:43 AM
Agosto 2014: Se realizaron trabajos de Movimientos de Tierra; Material de Préstamo Importado (Relleno con Material de Préstamo Local para construcción de Cunetas), Excavación sin Clasificar, Material de Préstamo Local. Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, Sub-base Clase II, Base Clase I, Asfalto para riego de adherencia, Capa de rodadura de hormigón asfáltico e = 12 cm. Drenaje; Acero de refuerzo para muros de ala, Hormigón Estructural para Alacantarillas de Cajón, Hormigón Estructural para Cunetas , Excavación para cunetas y encauzamientos. Señalización y Seguridad Vías; Marcas en Pavimento.	Bazurto Orellana, Pedro	04/09/2014 - 12:18 PM
Agosto 2014: Se realizaron trabajos de Movimientos de Tierra; Material de Préstamo Importado (Relleno con Material de Préstamo Local para construcción de Cunetas), Excavación sin Clasificar, Material de Préstamo Local. Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, Sub-base Clase II, Base Clase I, Asfalto para riego de adherencia, Capa de rodadura de hormigón asfáltico e = 12 cm. Drenaje; Acero de refuerzo para muros de ala, Hormigón Estructural para Alacantarillas de Cajón, Hormigón Estructural para Cunetas , Excavación para cunetas y encauzamientos. Señalización y Seguridad Vías; Marcas en Pavimento. Elaboración de Acta de Orden de Cambio No. 4.	Bazurto Orellana, Pedro	04/09/2014 - 11:57 AM
Trabajos Nocturnos: Fundición de cunetas, Colocación de Carpeta Asfáltica.		
jULIO 2014: Se realizaron trabajos de Colocación de Préstamo Importado, Sub-Base Clase II, Base Clase I, Obras de Drenaje (Excavación para cunetas y encauzamientos). Aún se encuentra en trámite la Orden de Cambio No. 4.	Bazurto Orellana, Pedro	05/08/2014 - 02:29 PM
Junio 2014: Se trabajó en excavación sin clasificar, mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado para el Acceso a San Agustín, la Acta de Comisión Especial N° 451 se legalizó por las partes administrativas para la Orden de Cambio N° 4 con una ampliación de seis meses de plazo sin modificación de monto a partir del 15 de Abril hasta el 30 de Octubre 2014.	Bazurto Orellana, Pedro	07/07/2014 - 11:53 AM
Mayo 2014: Se trabajó con normalidad y con fecha 10 de abril del 2014 la Comisión No. 451 suscribió el Acta para trámite de Orden de Cambio No. 4 con una ampliación de seis meses de plazo sin modificación de monto a partir del 15 de Abril hasta el 30 de Octubre 2014.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/07/2014 - 12:32 PM
Abril 2014: Se trabajó en los grupos de rubros Obras Preliminares, Obras de Calzada, Drenaje, Superestructura; y se encuentra en legalización de las partes administrativas del Decreto Ejecutivo No. 451 en la que se aprueba la Orden de Cambio No. 4 con Ampliación de Plazo contractual en 6 meses, a través del incremento y disminución de cantidades de obra en los rubros del contrato principal sin incremento de monto.	Bazurto Orellana, Pedro	13/05/2014 - 10:02 AM
Marzo 2014: Se continúan trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y se encuentra autorizado orden de cambio n° 3 mismo monto y mismo plazo, esta en trámite orden de cambio 4 sin incremento de monto pero con ampliación de plazo por 6 meses.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/04/2014 - 08:11 AM
Febrero 2014: Se continúan trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y se encuentra autorizado orden de cambio n° 3 mismo monto y mismo plazo.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/03/2014 - 09:21 AM
Enero 2014: Se continúan trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y se encuentra autorizado orden de cambio n° 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de plazo de 7 meses; se continúan lanzamiento de vigas para la construcción del puente sobre el río Arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	05/02/2014 - 02:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto, Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y se encuentra autorizado orden de cambio nº 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de plazo de 7 meses; se continua lanzamiento de vigas para la construcción del puente sobre el rio Arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	06/01/2014 - 02:07 PM
Noviembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto. Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado orden de cambio 01 y costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo se encuentra autorizado orden de cambio nº 2 por un monto de 2.771.035,62 y ampliación de plazo de 7 meses; se continua construcción de vigas para la construcción del puente sobre el rio Arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	06/12/2013 - 02:32 PM
Octubre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento, subbase, base y asfalto. Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales. Esta autorizado orden de cambio 01 y costo mas porcentaje por 8 ordenes de trabajo y continua en tramite orden de cambio nº 2; se continua construcción de vigas para la construcción del puente sobre el rio Arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	27/11/2013 - 03:50 PM
Septiembre 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento y subbase, Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta en tramite orden de cambio nº 2, se continua construcción de vigas para la construcción del puente sobre el rio arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/10/2013 - 10:10 AM
Agosto 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento y subbase, Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta en tramite orden de cambio nº 2, se cosntruyen vigas para la construcción del puente sobre el rio arenillas. (valido).	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	05/09/2013 - 03:05 PM
Julio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento y subbase, Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta en tramite orden de cambio nº 2, se cosntruyen vigas para la construcción del puente sobre el rio arenillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	05/09/2013 - 03:04 PM
Julio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento y subbase, Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta autorizado orden de cambio 01 y consto mas porcentaje y esta en tramite orden de cambio nº 2..	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/08/2013 - 08:44 AM
Junio 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento y subbase, Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales. Esta en trámite autorización costo mas porcentaje para los rubros nuevos.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	31/07/2013 - 02:14 PM
MAyo 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del 100% y rubros nuevos.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	02/07/2013 - 02:32 PM
Abril 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del 100% y rubros nuevos. Marzo 2013: Se continua trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo derecho), además se inicia trabajos de material de mejoramiento. Esta en trámite aumento de cantidades y costo mas porcentaje para los rubros exedentes del 100% y rubros nuevos.	Bazurto Orellana, Pedro	13/05/2013 - 12:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2013: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía, colocación de material de mejoramiento), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo derecho)		
Enero 2013: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo derecho)	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	26/02/2013 - 09:31 AM
Diciembre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Movimientos de Tierras (excavación y relleno ampliación vía), Obras de Drenaje (construcción de alcantarillas) , y Mitigaciones Ambientales, Puente sobre el Rio arenillas (Armado de pantalla estribo izquierdo, excavación estribo lado derecho)	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	09/01/2013 - 09:09 AM
<p>Noviembre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Trabajos: Movimientos de Tierras, Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales. ras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales, Construcción del Puente sobre el Rio arenillas</p> <p>- Octubre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Trabajos: Movimientos de Tierras, Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales. ras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales, Construcción del Puente sobre el Rio arenillas</p> <p>- Septiembre 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Trabajos: Movimientos de Tierras, Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales. ras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.</p> <p>- Agosto 2012: Se trabajo en los siguientes grupos de rubros: Trabajos: Movimientos de Tierras, Obras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales. ras de Drenaje, Obras preliminares y en Mitigaciones Ambientales.</p> <p>- Junio 2012: Trabajos en los siguientes grupos de rubros: Movilización, letreros de obra, comunicaciones radiales y de prensa</p> <p>- Mayo 2012: 11 de Mayo se firma contrato con la Constructora Carvallo A.Z. Cia Ltda; 15 de Mayo se entrega anticipo</p> <p>- Abril 2012: El 9 se procede a publicar la adjudicación del contrato</p> <p>- Febrero 2012: el 29 de febrero se publicaron los pliegos</p> <p>- Enero: En proceso de desconcentración para elevar al portal de compras públicas</p>	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	12/12/2012 - 03:11 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 8, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Definición del proyecto concluido	1-Solicitud de Información	01/04/2011		01/04/2011		Sí	2.0
2	PLANEACION: Justificativos técnicos y económicos elaborados	1-Solicitud de Información	01/11/2011		01/11/2011		Sí	3.0
3	PLANEACION: Revisión de pliegos terminados	1-Solicitud de Información	20/02/2012		20/02/2012		Sí	1.0
4	PLANEACION: Publicación de pliegos concluidos	2-Publicación de Pliegos	29/02/2012		29/02/2012		Sí	1.0
5	PLANEACION: Contrato firmado	3-Adjudicación	11/05/2012		11/05/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	15/05/2012		15/05/2012		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCION: Trabajos ejecutados al 25% ejecutados al termino del año 2012	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	20.0
8	EJECUCION. Operaciones preliminares terminadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
9	EJECUCION: Puente sobre Rio Arenillas terminado	1-Solicitud de Información	30/06/2013		10/09/2014		Sí	3.0
10	EJECUCION: Movimiento de tierras terminadas	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	5.0
11	EJECUCION: Mejoramiento de la Sub rasante concluído	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	3.49
12	EJECUCION:Colocación de Su base terminada	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2014		Sí	1.84
13	EJECUCION:Colocación de base terminada	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		31/08/2014		Sí	3.12
14	EJECUCION: Obras de drenaje ejecutadas	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		10/09/2014		Sí	6.0
15	EJECUCION: Obras de mitigación e impacto ambiental terminadas	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		14/10/2014		Sí	2.0
16	EJECUCION: Obras de señalizaciónrealizadas	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		14/10/2014		Sí	8.0
17	EJECUCION:Colocación de capa de rodadura ejecutada	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		10/09/2014		Sí	19.35
18	EJECUCION:Construcción de bordillos realizada	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		15/09/2014		Sí	3.0
19	CIERRE: Acta de recepcion provisional legalizada	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		02/03/2015		Sí	1.0
20	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Abril 2015	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.2
21	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Mayo 2015	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.2
22	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Junio 2015	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.2
23	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Julio 2015	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.2
24	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.2
25	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.2
26	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.2
27	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.2
28	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.2
29	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Enero 2016	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
30	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.2
31	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Primer Año - Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.2
32	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Segundo Año - Abril 2016	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.2
33	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Segundo Año - Mayo 2016	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.2
34	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Segundo Año - Junio 2016	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.2
35	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario 4 años; Segundo Año - Julio 2016	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.2
36	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	10/08/2016		10/08/2016		Sí	1.0
37	CIERRE: Acta de Terminacion por Mutuo Acuerdo.	9-Entregables Formales	15/08/2016		08/08/2016		Sí	1.0
38	CIERRE: Liquidación económica aprobada	5-Entregables Intermedios	30/10/2019		26/02/2019		Sí	1.0
39	CIERRE: Cierre de proyectos segun formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	05/11/2019	05/11/2019			No	2.0
40	CIERRE: Certificación de Coordinación Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno suscrita	9-Entregables Formales	10/11/2019	10/11/2019			No	1.0
41	CIERRE:Certificación de Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago suscrito	9-Entregables Formales	15/11/2019	15/11/2019			No	1.0
42	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios contables de tesorería pendientes por liquidar - suscrto MEF	9-Entregables Formales	25/11/2019	25/11/2019			No	1.5
43	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Reconstrucción de la vía Arenillas - La Avanzada, cumple con hito de mantenimiento establecido.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	22/01/2016
2	K016 Mtop cumple lo planificado	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/07/2015
3	CONSTATAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	28/08/2014
4	AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA INCREMENTO DE MONTO Y PLAZO	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	25/02/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	CONSTATAION DE AVANCES DE OBRA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	14/11/2013
6	CONSTATAION DE AVANCES EN PROYECTO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	18/07/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,910,926.74
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,203,007.42 **
Costo Total:	20,380,414.62
Total Devengado:	23,022,538.71
% Costo Total Devengado:	112.96 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 112.96 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	17,433,588.43	243,124.95	0.00	17,676,713.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,960,645.98	180,468.71	0.00	11,141,114.69
Ppto. Codificado	23,585,322.98	180,468.71	0.00	23,765,791.69
Ppto. Comprometido	11,379,740.11	0.00	0.00	11,379,740.11
Planeado - Codificado (2019)		62,656.24		
Programado a Devengar	22,514,438.14	180,468.71	0.00	22,694,906.85
Ppto. Devengado	23,022,538.71	0.00	0.00	23,022,538.71
Pagado Real	10,486,487.33	0.00	0.00	10,486,487.33
Estimado a fin de año	* 23,022,538.71	180,468.71	0.00	23,203,007.42
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-508,100.57	0.00	0.00	-508,100.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 102.26 %	0.00 %	0.00 %	101.44 %
Ppto. Codificado 998	2,160,276.02	0.00	0.00	2,160,276.02
Ppto. Devengado 998	2,156,976.34	0.00	0.00	2,156,976.34

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

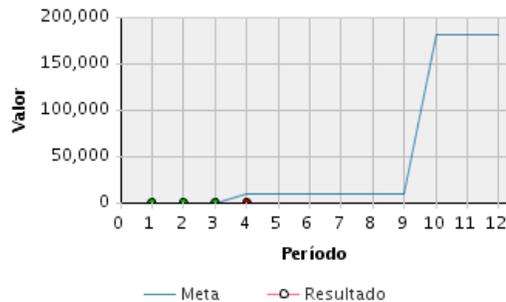

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00		10,000.00				
Jun	0.00		10,000.00				
Jul	0.00		10,000.00				
Ago	0.00		10,000.00				
Sep	0.00		10,000.00				
Oct	170,468.71		180,468.71				
Nov	0.00		180,468.71				
Dic	0.00		180,468.71				
Total	180,468.71	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Cronograma de Orden de Cambio No. 1, Orden de Cambio No. 2, Orden de Cambio No. 3.	C_9_CRONOGRAMA_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._1_-_No._2_-_No._3.xlsx	05/05/2014
2	ACTA DE COMISION ESPECIAL No. 451, HITOS AFECTADOS: 9,12,13,14,15,16,17 y 18	E_4_ACTA_DE_COMISION_ESPECIAL_DECRETO_EJECUTIVO_08/2014.pdf	08/01/2015
3	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	G_5_ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	06/04/2015
4	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	G_9_ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	13/05/2015
5	ACTA ORDEN DE CAMBIO No. 4	E_7_ACTA_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf	02/09/2014
6	BORRADOR ACTA 451 ORDEN DE CAMBIO No. 4. RETRASA ELO HITO 4	D_4_BORRADOR_ACTA_451_ORDEN_DE_CAMBIO_No._4.pdf	13/05/2014
7	BORRADOR DE PLANILLA SEPTIEMBRE 2014	F_3_BORRADOR_DE_PLANILLA_SEPTIEMBRE_2014.xlsx	07/10/2014
8	BORRADOR SABANA PLANILLA AGOSTO 2014	E_9_BORRADOR_DE_PLANILLA_AGOSTO_2014.xlsx	04/09/2014
9	BORRADOR SABANA PLANILLA JUNIO 2014	E_1_BORRADOR_SABANA_JUNIO_2014.pdf	03/07/2014
10	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012	J_8_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf	19/12/2016
11	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013	J_9_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf	19/12/2016
12	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014	K_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf	19/12/2016
13	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015	K_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf	19/12/2016
14	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016	K_3_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf	19/12/2016
15	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	K_4_CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.docx	19/12/2016
16	COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	B_1_COLOCACION_DE_MATERIAL_DE_MEJORAMIENTO	18/03/2014
17	COLOCACION Y COMPACTACION DE SUB BASE	B_3_COLOCACION_Y_COMPACTACION_MATERIAL_DE_SUBBASE	18/03/2014
18	CONTRATO	J_2_CONTRATO.pdf	16/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	CONVENIO DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO AGOSTO 2016	K_5_CONVENIO_DE_TERMINACION_POR_MUTUO_ACUERDO_2016.pdf	18/03/2016
20	CONVENIO TERMINACION POR MUTUO ACUERDO	J_7_CONVENIO_TERMINACION_POR_MUTUO_ACUERDO.pdf	01/12/2016
21	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION DE LA ORDEN DE CAMBIO No. 4 AL HITO 12	E_2_REPROGRAMACION_DE_TRABAJOs_No_4_(6_meses).pdf	07/03/2014
22	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	A_9_EXCAVACION_SIN_CLASIFICAR	18/03/2014
23	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	B_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	18/03/2014
24	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	D_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	08/05/2014
25	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	G_8_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf	04/05/2015
26	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	I_3_INFORME_EJECUTIVO_DE_ABRIL_2016_ARENILLAS_-_copia.pdf	05/05/2016
27	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	K_9_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
28	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019	M_3_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf	02/05/2019
29	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	A_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf	18/03/2014
30	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	C_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	18/03/2014
31	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	E_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	02/09/2014
32	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	H_4_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015_ARENILLAS_-_LA_AVANZADA.pdf	07/09/2015
33	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	I_7_INFORME_EJECUTIVO_DE_AGOSTO_2016-PROVISIONAL-ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	05/09/2016
34	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017	K_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	04/09/2017
35	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	L_4_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
36	INFORME EJECUTIVO ARENILLAS - LA AVANZADA ABRIL 2017	J_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	23/05/2017
37	INFORME EJECUTIVO ARENILLAS - LA AVANZADA FEBRERO 2017	J_4_INFORME_EJECUTIVO_ARENILLAS_-_LA_AVANZADA_FEBRERO_2017.pdf	02/03/2017
38	INFORME EJECUTIVO DE JULIO 2017- ARENILLAS LA AVANZADA.	J_9_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	03/08/2017
39	INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2017- ARENILLAS LA AVANZADA.	J_8_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	03/07/2017
40	INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2017- ARENILLAS LA AVANZADA	J_5_INFORME_EJECUTIVO_DE_MARZO_2017-_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..docx	04/04/2017
41	INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2017- ARENILLAS LA AVANZADA.	J_7_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	05/06/2017
42	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	K_5_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	05/01/2018
43	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012	B_2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	18/03/2014
44	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	C_4_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
45	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	F_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf	10/01/2015
46	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	H_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015_ARENILLAS_-_LA_AAVANZADA.pdf	05/01/2016
47	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	J_2_INFORME_EJECUTIVO_DE_DICIEMBRE_2016-_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	03/02/2017
48	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 ARENILLAS - LA AVANZADA	L_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018_ARENILLAS_-_LA_AVANZADA.pdf	04/01/2019
49	INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	B_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	18/03/2014
50	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	C_5_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf	18/03/2014
51	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	G_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	04/02/2015
52	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	H_9_INFORME_EJECUTIVO_DE_ENERO_2016_ARENILLAS_-_LA_AVANZADA.pdf	04/02/2016
53	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	J_3_INFORME_EJECUTIVO_DE_ENERO_2017-_ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	03/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	K_6_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	05/02/2018
55	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	L_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019
56	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	B_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	18/03/2014
57	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	C_6_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf	18/03/2014
58	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	G_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
59	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	I_1_INFORME_EJECUTIVO_DE_FEBRERO_2016_ARENILLAS_LA_AVANZADA.pdf	05/03/2016
60	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018 ARENILLAS - LA AVANZADA	K_7_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.docx	05/03/2018
61	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	M_1_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf	01/03/2019
62	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	A_4_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf	18/03/2014
63	INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	B_9_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf	18/03/2014
64	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	E_3_INFORME_EJECUTIVO.pdf	05/08/2014
65	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015.	H_3_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	06/08/2015
66	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA..pdf	10/08/2016
67	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA..pdf	10/08/2016
68	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	I_6_INFORME_EJECUTIVO_DE_JULIO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA..pdf	10/08/2016
69	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	L_3_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	02/08/2018
70	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	A_3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	18/03/2014
71	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	B_8_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	18/03/2014
72	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	D_8_INFORME_EJECUTIVO.pdf	02/07/2014
73	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	H_2_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	09/07/2015
74	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	I_5_INFORME_EJECUTIVO_DE_JUNIO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	04/07/2016
75	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	L2_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
76	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	C_8_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	07/04/2014
77	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	G_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf	07/04/2015
78	INFORME EJECUTIVO MARZO 2016	I_2_INFORME_EJECUTIVO_DE_MARZO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA..pdf	05/04/2016
79	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	K_8_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
80	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019 RECONSTRUCCION DE LA VIA RENILLAS - LA AVANZADA	M_2_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019_FISCA_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	01/03/2019
81	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	H_1_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	05/06/2015
82	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	A_2_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	18/03/2014
83	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	B_7_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	18/03/2014
84	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	D_6_INFORME_EJECUTIVO_2014.pdf	03/06/2014
85	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	I_4_INFORME_EJECUTIVO_DE_MAYO_2016_ARENILLAS_-LA_AVANZADA.pdf	03/06/2016
86	INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	L1_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	04/06/2018
87	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	K_4_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	04/12/2017
88	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	A_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	18/03/2014
89	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	F_6_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
90	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	H_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf	04/12/2015
91	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	J_1_INFORME_EJECUTIVO_DE_NOVIEMBRE_2016-ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	05/12/2016
92	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	L_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
93	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	K_3_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	01/11/2017
94	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	A_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	18/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
95	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	C_3_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE__2013.pdf	18/03/2014
96	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	F_5_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	06/11/2014
97	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	H_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015_ARENILLAS_LA_AVANZADA.pdf	05/11/2015
98	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	I_9_INFORME_EJECUTIVO_DE_OCTUBRE__2016-ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	01/11/2016
99	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	L_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
100	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	C_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
101	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	K_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017-ARENILLAS_LA_AVANZADA..pdf	03/10/2017
102	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	A_6_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2012.pdf	18/03/2014
103	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	E_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	01/10/2014
104	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	H_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015_ARENILLAS_LA_AVANZADA.pdf	05/11/2015
105	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	I_8_INFORME_EJECUTIVO_DE_SEPTIEMBRE_2016-PROVISIONAL-ARENILLAS_LA_AAVANZADA..pdf	05/10/2016
106	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	L_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	02/10/2018
107	INFORME SEMANAL 04 AL 10 DE AGOSTO 2014	E_6_INFORME_SEMANAL_04_AL_10_DE_AGOSTO_DEL_2014.pdf	02/09/2014
108	INFORME SEMANAL DE FISCALIZACION	D_9_INFORME_SEMANAL_DEL_23_AL_29_DE_JUNIO_2014.pdf	02/07/2014
109	INFORME SEMANAL NOCTURNO 04 AL 10 DE AGOSTO 2014	E_8_INFORME_SEMANAL_NOCTURNO_04_AL_10_DE_AGOSTO_DEL_2014.pdf	02/09/2014
110	INFORME SEMANAL SEPTIEMBRE 01 AL 07 FISCALIZACION	F_1_INFORME_SEMANAL_01_AL_07_DE_SEPTIEMBRE_DEL_2014.pdf	07/10/2014
111	ORDEN DE CAMBIO No 1	J_3_ORDEN_DE_CAMBIO_No_1.pdf	16/12/2016
112	ORDEN DE CAMBIO No 2	J_4_ORDEN_DE_CAMBIO_No_2.pdf	16/12/2016
113	ORDEN DE CAMBIO No 3	J_5_ORDEN_DE_CAMBIO_No_3.pdf	16/12/2016
114	ORDEN DE CAMBIO No 5	J_6_ORDEN_DE_CAMBIO_No_5.pdf	16/12/2016
115	REPORTE ESIGEF ABRIL 2014	D_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2014.pdf	08/05/2014
116	REPORTE ESIGEF ABRIL 2015	G_7_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2015.pdf	04/05/2015
117	REPORTE ESIGEF AGOSTO 2014	E_4_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2014.pdf	02/09/2014
118	REPORTE ESIGEF DICIEMBRE 2014	F_8_REPORTE_ESIGEF_DICIEMBRE_2014.pdf	06/01/2015
119	REPORTE ESIGEF ENERO 2015	G_1_REPORTE_ESIGEF_ENERO_2015.pdf	04/02/2015
120	REPORTE ESIGEF FEBRERO 2015	G_4_REPORTE_ESIGEF_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
121	REPORTE ESIGEF JULIO 2014	E_2_REPORTE_ESIGEF_JULIO_2014.pdf	05/08/2014
122	REPORTE ESIGEF JUNIO 2014	D_7_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2014.pdf	02/07/2014
123	REPORTE ESIGEF MAYO 2014	D_5_REPORTE_ESIGEF.pdf	03/06/2014
124	REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2014	F_7_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
125	REPORTE ESIGEF OCTUBRE 2014	F_4_REPORTE_ESIGEF_OCTUBRE_2014.pdf	04/11/2014
126	REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2014	F_2_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2014.pdf	07/10/2014
127	SABANA ABRIL 2014	D_3_SABANA_ABRIL_2014.pdf	12/05/2014
128	TRAMITE DE AMPLIACION DE PLAZO	C_7_TRAMITE_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No_.4.pdf	07/04/2014
129	VIABILIDAD TECNICA	A_1_VIABILIDAD_TECNICA.docm	18/03/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Bazurto Orellana, Pedro	Director Provincial	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Patrocinador Ejecutivo - Subsecretario Regional 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de Infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Nieto Orellana, Galo Secundino	Lider de Proyecto (obra)	Supervisor de Construcciones Dirección Provincial de El Oro	gsnieto@mtop.gob.ec	023974600
Orozco Batallas, Daniela Valeria	Administrador del Contrato	Experto en infraestructura	dvorozco@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
29924_1.jpg	07/01/2015
