

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Subsecretaría Zona 1

Dirección Provincial Sucumbíos

PROYECTO: K029 MTOP- Rectificación y mejoramiento de la carretera Yamanunca - Puerto Providencia

Líder del Proyecto:	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo (aarizaga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Programas Relacionados:	MTOP - MANTA MANAOS, Provincia - Sucumbíos, Proyectos Prioritarios PAI, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCA- PUERTO PROVIDENCIA, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.52
CUP:	175200000.21.6233	TIR:	18.70 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	11,026,810.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,899,170.19
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Obligaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	26/11/2019	Fecha de Fin Base:	01/10/2013
Modificado por:	Solano Blacio, Wimper Vicente	Fecha del siguiente Hito:	15/12/2017

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

El tramo Yamanunca - Puerto Providencia corresponde a un ramal de la carretera Manta - Manaos. Los trabajos se iniciaron con fecha 01 de Septiembre del 2011. El proyecto se inicia luego de un recorrido de 11Km desde la ciudad de Shushufindi, en el sector denominado Yamanunca que corresponde al 0+000 del proyecto y luego de un recorrido de 44.28 Km pasando por una serie de poblaciones, llega a Puerto Providencia, asentado a orillas del río Napo, el mismo que servirá para el embarque de bienes y servicios hacia el puerto de Manos en el hermano país Brasileiro. El Proyecto se encuentra a cargo del Consorcio Puerto Providencia, bajo la Fiscalización de la Compañía Irigoyen & Asociados.

Monto inicial del contrato :.....34'499.680,64

Monto de la Orden de Cambio :..... 1 1'545.392,39

Costo + Porcentaje..... 305.757,04

PRODUCTO / SERVICIO:

El producto esperado, es la terminación de un ramal de la carretera Manta Manaos.

LÍNEA BASE:

La línea base para la construcción de la carretera Manta - Manaos es cero y avanza hasta el 100 % que correspondería al cumplimiento del contrato y por consiguiente la construcción de los 44,28 Km. de longitud, hasta llegar a Puerto Providencia.

OBJETIVO GENERAL:

Construcción del tramo Yamanunca - Puerto Providencia, correspondiente a la carretera intermodal Manta - Manaos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Permitir el comercio de bienes y servicios desde Ecuador hacia Brasil y Europa

Beneficios Cualitativos

Facilitar la movilidad de la empresa petrolera, de la empresa palmicultora, abriendo nuevos centros de distribución. El principal beneficio cualitativo es la comunicación entre Puerto Providencia en Ecuador y el Puerto de Manaos en Brasil; facilitando el comercio entre estos dos países y con Europa.

Tipo de Beneficiario

Toda la provincia de Sucumbios, específicamente el sector Agrícola, el sector del transporte, el sector dedicado a las labores de cabotaje y transporte fluvial.


Restricciones

Tiempo : Plazo estipulado en el contrato
 Costo : Monto contractual más actos administrativos realizados para incrementos del monto
 Alcance : Construcción de 44,28 Kilómetros de carretera Yamanunca - Puerto Providencia

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.01 %

Fecha de Inicio: 01/09/2011

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	Orellana Sarmiento, Galo Oswaldo	05/11/2019 - 09:59 AM
Septiembre 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	Solano Blacio, Wimper Vicente	04/10/2019 - 03:00 PM
Agosto 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	Solano Blacio, Wimper Vicente	05/09/2019 - 03:26 PM
Julio 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	01/08/2019 - 02:56 PM
Junio 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/07/2019 - 08:44 AM
Mayo 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/06/2019 - 02:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	02/05/2019 - 09:05 AM
Marzo 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/04/2019 - 01:45 PM
Febrero 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, el monto se encuentra incluido en el PAI 2019, se esta tramitando el pago de la liquidación económica	López Mendoza, Cristhian Manuel	27/02/2019 - 07:56 AM
ENERO 2019: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, se solicito la inclusión al PAI 2019	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/02/2019 - 01:36 PM
DICIEMBRE 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, se solicito la inclusión al PAI 2019	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/01/2019 - 08:55 AM
NOVIEMBRE 2018 Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en proceso de conseguir recursos.	López Mendoza, Cristhian Manuel	06/12/2018 - 08:03 AM
Octubre 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en proceso de conseguir recursos se solicito inclusión en PAI 2019	López Mendoza, Cristhian Manuel	05/11/2018 - 09:23 AM
Septiembre 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en proceso de conseguir recursos.	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/10/2018 - 02:48 PM
Agosto: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en proceso de conseguir recursos.	López Mendoza, Cristhian Manuel	04/09/2018 - 02:26 PM
Julio 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en proceso de conseguir recursos.	López Mendoza, Cristhian Manuel	03/08/2018 - 01:48 PM
JUNIO 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago.	López Mendoza, Cristhian Manuel	09/07/2018 - 11:21 AM
MAYO 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	01/06/2018 - 03:22 PM
Abril 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	03/05/2018 - 11:12 AM
Marzo 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 09:12 AM
Febrero 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/04/2018 - 09:12 AM
Enero 2018: Se encuentra firmada la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación económica está en el departamento financiero para su pago	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	08/02/2018 - 10:38 AM
Diciembre 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en el departamento financiero para el pago correspondiente.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	05/01/2018 - 03:22 PM
Noviembre 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en el departamento Jurídico para protocolización del mismo.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	04/12/2017 - 04:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en el departamento Jurídico de la Dirección Distrital de Sucumbíos desde el mes de Octubre 2017.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/11/2017 - 04:14 PM
Septiembre 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Enríquez Ocampos, Robín Cristian	23/10/2017 - 06:34 PM
Agosto 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/09/2017 - 09:46 PM
Julio 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2017 - 02:39 PM
Junio 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	04/07/2017 - 10:42 AM
Mayo 2017: El trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/06/2017 - 11:22 AM
Abril 2017: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; el trámite para la terminación por mutuo acuerdo del contrato se encuentra en la Subsecretaría Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/05/2017 - 01:22 PM
Marzo 2017: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/03/2017 - 10:50 AM
Febrero 2017: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato. Enero 2017: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/03/2017 - 01:32 PM
Diciembre 2016: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Benavides Morillo, Omar Alexander	05/01/2017 - 02:52 PM
Noviembre 2016: El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Benavides Morillo, Omar Alexander	28/12/2016 - 03:39 PM
Octubre 2016 El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Las planillas se encuentran en trámite, para proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	31/10/2016 - 12:41 PM
Septiembre 2016 El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; Se nombró la Comisión para realizar la Liquidación y Terminación por mutuo acuerdo del contrato.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	28/09/2016 - 11:52 AM
Agosto 2016 El contratista presentó la liquidación de los trabajos con fecha 04 de Agosto de 2016, con las correcciones solicitadas por el Ing. Jorge Macías; la planilla se encuentra en manos del Director Distrital desde el 05 de Agosto de 2016. Julio 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, la misma que ha sido presentada con fecha 15 de Marzo de 2016 y se encuentra en manos del Sr. Director Distrital de Sucumbíos desde el 23 de Marzo de 2016.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/08/2016 - 11:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, la misma que ha sido presentada con fecha 15 de Marzo de 2016 y se encuentra en manos del Sr. Diretor Distrital de Sucumbíos desde el 23 de Marzo de 2016.		
Mayo 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, la misma que ha sido presentada con fecha 15 de Marzo de 2016 y se encuentra en manos del Sr. Diretor Distrital de Sucumbíos desde el 23 de Marzo de 2016.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	26/05/2016 - 09:12 AM
Abril 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical . El Contratista ha presentado la liquidación de las planillas, conforme a lo establecido por el Ingeniero Subsecretario Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/04/2016 - 04:56 PM
Marzo 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical . El Contratista ha presentado la liquidación de las planillas, conforme a lo establecido por el Ingeniero Subsecretario Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/03/2016 - 04:20 PM
Febrero 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical . Se está realizando la liquidación de las planillas, conforme a lo establecido por el Ingeniero Subsecretario Regional 1.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/03/2016 - 08:12 AM
Enero 2016 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical. Se ha solicitado al Señor Director, promueva la reunión según el Decreto 451, con la finalidad de incrementar cantidades de obra ejecutadas, incrementar rubros de mantenimiento y dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de mantenimiento; o realizar un contrato modificador para cambiar las unidades del rubro Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	13/02/2016 - 01:17 PM
Diciembre 2015 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical. Se ha solicitado al Señor Director, promueva la reunión según el Decreto 451, con la finalidad de incrementar cantidades de obra ejecutadas, incrementar rubros de mantenimiento y dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de mantenimiento; o realizar un contrato modificador para cambiar las unidades del rubro Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano	Benavides Paladines, Ángel Bolívar	10/02/2016 - 11:27 AM
Noviembre 2015 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical. Se ha solicitado al Señor Director, promueva la reunión según el Decreto 451, con la finalidad de incrementar cantidades de obra ejecutadas, incrementar rubros de mantenimiento y dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de mantenimiento; o realizar un contrato modificador para cambiar las unidades del rubro Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano	Camacho Sánchez, Rodrigo Iván	10/12/2015 - 10:41 AM
Octubre 2015 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical. Se ha solicitado al Señor Director, promueva la reunión según el Decreto 451, con la finalidad de incrementar cantidades de obra ejecutadas, incrementar rubros de mantenimiento y dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de mantenimiento.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	30/10/2015 - 10:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2015 Por disposición del Señor Director Provincial de Sucumbíos, se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical. Se ha solicitado al Señor Director, promueva la reunión según el Decreto 451, con la finalidad de incrementar cantidades de obra ejecutadas, incrementar rubros de mantenimiento y dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de mantenimiento.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	29/09/2015 - 09:31 AM
Agosto 2015 Ruego disculpar la falta garrafal de ortografía cometida en la palabra disposiciones, en los resúmenes ejecutivos.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 09:22 AM
Agosto 2015 Se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	01/09/2015 - 09:11 AM
JULIO 2015: Se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/08/2015 - 12:18 PM
JUNIO 2015: Se ha solicitado al contratista la liquidación de las planillas de mantenimiento vial, pues se esta pagando un monto fijo mensual, cuando el contrato tiene rubros de mantenimiento; El contratista aún no acata las disposiciones sobre el arreglo de la señalización vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/07/2015 - 08:27 AM
MAYO 2015: La fiscalización ha solicitado se realice el mantenimiento de la señalización vertical de la carretera sin tener respuesta del contratista.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/06/2015 - 11:34 AM
Abril 2015 : Se realiza el mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/05/2015 - 09:51 PM
Marzo 2015 : Se realiza el mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, limpieza de cauces en los ríos El Triunfo y Pañayuca	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/04/2015 - 10:07 AM
Febrero 2015 : Se realiza el mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, limpieza de cauces en los ríos El Triunfo y Pañayuca	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/03/2015 - 11:12 AM
Enero 2015 : Se realiza el mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, limpieza de cauces en los ríos El Triunfo y Pañayuca	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/03/2015 - 11:11 AM
Enero 2014 : Se realiza el mantenimiento rutinario, roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de puentes, limpieza de cauces en los ríos El Triunfo y Pañayuca	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	11/03/2015 - 11:11 AM
DICIEMBRE del 2014 La obra se encuentra concluida , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el Mantenimiento Preventivo y rutinario por parte del Consorcio Puerto Providencia.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	23/01/2015 - 11:11 AM
NOVIEMBRE del 2014 La obra se encuentra concluida , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el Mantenimiento Preventivo y rutinario por parte del Consorcio Puerto Providencia.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/11/2014 - 12:16 PM
OCTUBRE del 2014 La obra se encuentra concluida , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el Mantenimiento Preventivo y rutinario por parte del Consorcio Puerto Providencia.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	16/10/2014 - 10:04 AM
AGOSTO del 2014 La obra se encuentra concluida , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el Mantenimiento Preventivo y rutinario por parte del Consorcio Puerto Providencia.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	10/09/2014 - 08:57 AM
JULIO del 2014 La obra se encuentra concluida , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	21/08/2014 - 04:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se está realizando el mantenimiento preventivo, rutinario y emergente por parte del Consorcio Puerto Providencia, ya que según contrato deberán realizar el mantenimiento hasta el 03 de Febrero del 2018.		
JUNIO del 2014 La obra se encuentra concluída , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el mantenimiento preventivo, rutinario y emergente por parte del Consorcio Puerto Providencia, ya que según contrato deberán realizar el mantenimiento hasta el 03 de Febrero del 2018. Arizaga Davila ,	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 10:49 AM
MAYO del 2014 La obra se encuentra concluída , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el mantenimiento preventivo, rutinario y emergente por parte del Consorcio Puerto Providencia, ya que según contrato deberán realizar el mantenimiento hasta el 03 de Febrero del 2018. Arizaga Davila , Abelardo 03/07/2014 - 10:48 AM	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 10:49 AM
ABRIL del 2014 La obra se encuentra concluída , con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero. Se está realizando el mantenimiento preventivo, rutinario y emergente por parte del Consorcio Puerto Providencia, ya que según contrato deberán realizar el mantenimiento hasta el 03 de Febrero del 2018.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	03/07/2014 - 10:48 AM
MARZO del 2014 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/04/2014 - 11:53 AM
FEBRERO del 2013 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional. La obra fue inaugurada por el Sr. Presidente de la Republica el 04 de Febrero.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/03/2014 - 09:43 AM
ENERO del 2014 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/03/2014 - 09:41 AM
DICIEMBRE del 2013 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/03/2014 - 09:41 AM
NOVIEMBRE del 2013 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	08/01/2014 - 12:33 PM
OCTUBRE del 2013 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical, y con acta de recepción provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/12/2013 - 01:33 AM
SEPTIEMBRE del 2013 La obra se encuentra concluída y con señalización horizontal y vertical. Se está realizando los trámites para el Acta Entrega Recepción provisional.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	12/11/2013 - 11:50 AM
AGOSTO del 2013 La obra se encuentra concluída, faltado unicamente un 15% de la señalización horizontal y vertical.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/10/2013 - 02:02 PM
JULIO del 2013 En el sector de Nueva Vida, se está trabajando en la señalización Horizontal y Vertical, se espera que la obra esté concluída dentro del plazo.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/09/2013 - 03:23 PM
Junio del 2013 Únicamente falta por asfaltar desde el Km 26 hasta el 26+900, en el sector de Nueva Vida, se ha iniciado la señalización Horizontal y Vertical, se espera que la obra esté concluída el 31 de Julio del presente año.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	02/08/2013 - 03:38 PM
Mayo del 2013 La compañía constructora se encuentra tabajando en la colocación de la segunda capa de asfalto desde el Km 23+000 hasta el Km 30+000 También se está realizando la colocación de la primera capa de asfalto desde el Km 40+000 hasta el Km 44+000.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	05/07/2013 - 02:49 PM
Abril del 2013 La compañía constructora se encuentra tabajando en la colocación de la segunda capa de asfalto desde el Km 30+000 hacia el final del proyecto Actualmente ya se encuentra firmado el Contrato Complementario.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/06/2013 - 08:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2013 La compañía constructora se encuentra tabajando en la colocación de la segunda capa de asfalto desde el Km 30+000 hacia el final del proyecto En los meses de Enero y Febrero del 2013 no existe presupuesto devengado, debido a que se espera la firma del contrato complementario. La Fiscalización se encuentra a cargo de la empresa IRIGOYEN ASOCIADOS.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	25/04/2013 - 09:13 AM
Febrero 2013 El consorcio constructor continúa trabajando en el asfaltado, colocación de subbase, hormigones en cunetas y la construcción del puente sobre el río El Triunfo y Pañayuca. El monto contractual ha sido consumido hasta el mes de Octubre y se está tramitando el Contrato Complementario correspondiente. Porcentaje de avance fisico 80%	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	15/03/2013 - 11:33 AM
Enero 2013 El consorcio constructor continúa trabajando en el asfaltado, colocación de subbase, hormigones en cunetas y la construcción del puente sobre el río El Triunfo y Pañayuca. El monto contractual ha sido consumido hasta el mes de Octubre y se está tramitando el Contrato Complementario correspondiente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	06/03/2013 - 04:45 PM
Diciembre 2012 El consorcio constructor continúa trabajando en el asfaltado, colocación de subbase, hormigones en cunetas y la construcción del puente sobre el río El Triunfo. El monto contractual ha sido consumido hasta el mes de Octubre y se está tramitando el Contrato Complementario correspondiente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	20/02/2013 - 03:15 PM
Noviembre 2012 El consorcio constructor continúa trabajando en el asfaltado, colocación de subbase y hormigones en cunetas. El monto contractual ha sido consumido hasta el mes de Octubre y se está tramitando el Contrato Complementario correspondiente.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	09/01/2013 - 02:29 PM
Octubre 2012 El monto inicial del contrato ha sido consumido en su totalidad hasta la planilla N°13 correspondiente al mes de Septiembre del 2012. Se ha solicitado la realización de un contrato complementario por el monto de 12' 000 000 de dólares debido a incremento en cantidades de obras, con lo cual se prevee termina el contrato. El trámite para el contrato complementario se encuentra para la firma del Sr. Viceministro de Infraestructura del Transporte, en cumplimiento del decreto 451. El Consorcio Providencia, constructor de la obra ha bajado ostensiblemente el ritmo de trabajo debido a la falta de recursos economicos.	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/11/2012 - 10:22 AM
SEPTIEMBRE 2012.- Contratista: Consorcio Puerto Providencia Carpeta asfáltica desde el Kilometro 0 AL Kilometro 2+500, base asfaltica mejoramiento del Kilometro 34 alKilometro 39, hormigón para cunetas en diferentes tramos. AGOSTO2012.- Contratista: Consorcio Puerto Providencia (No se anexa ningún documento que respalde los avances de trabajo debido a que la Cia Contratista no presenta la planilla correspondiente al mes de Agosto. JULIO 2012.- Contratista: Consorcio Puerto Providencia Se continúan con los trabajos el 72% de avance fisico y 77% de avance económico JUNIO 2012 Se continúan con los trabajos el 68% de avance fisico y 70,76% de avance económico MAYO 2012 Se continúan con los trabajos el 64% de avance fisico y 65% de avance económico ABRIL 2012 La fiscalización ha remitido al contratista la planilla correspondiente al mes de Abril para que realice determinadas correcciones, por lo que aún no presentan la planilla con los valores reales para el ingreso del Informe ejecutivo al sistema SITOP, (mismo que debio ser ingresado por fiscalización contratada) MARZO 2012 : Movimiento de tierras y relleno con material de prestamo importado, sub base clase 3, colocación de alcantarillas de hormigon, rubros amambientales y miscelaneos y capa de rodaduga de hormihón asfaltico mezclado en planta e=7.5 cm Hasta Km. 9+700. No se pagó el valor previsto para el mes de Marzo porque solamente ingresaron cinco planillas, quedandose pendiente la sexta para ser pagada en el mes de Abril Hasta la presente fecha (31 de Marzo 2012, se encuentra asfaltado hasta el Km. 9+700 con una capa de Carpeta Asfáltica de 3" FEBRERO 2012:	Arizaga Davila, Leoncio Abelardo	07/11/2012 - 10:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Movimiento de tierras y relleno con material de préstamo importado, sub base clase 3, colocación de alcantarillas de hormigon, rubros ambientales y miscelaneos y capa de rodadura de hormihón asfaltico mezclado en planta e=7.5 cm ENERO 2012 : Movimiento de tierras y relleno con material de préstamo importado, sub base clase 3, colocación de alcantarillas de hormigon, rubros ambientales y miscelaneos y capa de rodadura de hormihón asfaltico mezclado en planta e=7.5 cm DICIEMBRE 2011: Movimiento de tierras y relleno con material de préstamo importado, sub base clase 3, colocación de alcantarillas de hormigon, rubros ambientales y miscelaneos NOVIEMBRE 2011: Movimiento de tierras y rellenos con material de préstamo importado desde el km 3+50 hasta el km 4+500 y desde el km 17+00 hasta el km 17+500 OCTUBRE 2011: Movimeinto de tierras y rellenos con material de préstamo importado desde el km 0+00 hasta el km 3+500 y desde el km 15+00 hasta el km 17+00 y desde el Km 44+200 hacia el 42+00 SEPTIEMBRE 2011: Se inician los trabajos de movilización e instalación tanto de campamentos como del area industrial. Ademas se trabaja en movimiento de tierras y relleno con material de préstamo importado con un avance general del proyecto de un 2% respecto al avance fisico general (100%) La carretera Yamanunca - Puerto Providencia, constituye un ramal de la carretera Manta - Manaos, la misma que servirá para interconectar el Puerto de Manta ubicado en el oceano Pacifico y el Puerto de Belem ubicado en Manaos - Brasil, el cual se conecta con el oceano Atlantico, permitiendo la fluidez del comercio en menor tiempo.		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de Recursos económicos.	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	30	30	9	0/1

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Suspensión del mantenimiento CAUSARÍA afectación en la inversión realizada por el Gobierno Nacional.	25/11/2019	Leoncio Abelardo Arizaga Davila	20 %	20	4	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION: Movilización e instalación.- Cumplido	4-Inicio de Trabajo	30/09/2011		30/09/2011		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	EJECUCION: Movimiento de tierras y relleno con prestamo importado.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/10/2011		30/10/2011		Sí	4.0
3	EJECUCION: Movimiento de tierras y relleno con prestamo importado.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/11/2011		30/11/2011		Sí	4.0
4	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 0+00 hasta el km 5+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/12/2011		30/12/2011		Sí	6.0
5	EJECUCION: Movimiento de tierras y relleno con prestamo importado.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	3.0
6	EJECUCION: Movimiento de tierras y relleno con prestamo importado.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	6.0
7	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 5+00 hasta el km 10+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/01/2012		30/01/2012		Sí	6.0
8	EJECUCION: Movimiento de tierras y relleno con prestamo importado.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	28/02/2012		28/02/2012		Sí	6.0
9	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 10+00 hasta el km 15+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	28/02/2012		28/02/2012		Sí	5.0
10	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 15+00 hasta el km 20+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/03/2012		30/03/2012		Sí	6.0
11	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 2+00 hasta el km 25+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/03/2012		Sí	5.5
12	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 25+00 hasta el km 30+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/05/2012		30/05/2012		Sí	5.0
13	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 30+00 hasta el km 35+00.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	5.0
14	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 35+00 hasta el km 40+00 y asfalto (primera capa) desde el Km 0+000 hasta el Km 20+000.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		30/07/2012		Sí	5.0
15	EJECUCION: Sub Base - Base desde el Km 40+00 hasta el km 44+00 y asfalto (primera capa) desde el Km 20+000 hasta el Km 30+000.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	5.0
16	EJECUCION: Asfalto (segunda capa) desde el Km 20+000 hasta el Km 30+000 y construcción de cunetas.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	01/11/2012		01/11/2012		Sí	5.0
17	EJECUCION: Asfalto (segunda capa) Km 0+000 al Km20+000 y construcción de cunetas.- Cumplido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	5.0
18	EJECUCION: Colocación de la primera capa de asfalto desde el Km 40+000 hasta el 44+000.- Cumplido	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	1.0
19	EJECUCION: Colocación de la segunda capa de asfalto	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	desde el Km 23+000 hasta el Km 30+000.- Cumplido							
20	EJECUCION: Señalización horizontal y señalización vertical.- Cumplido:	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.5
21	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales.	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		28/08/2015		Sí	0.5
22	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales.	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.5
23	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales.	5-Entregables Intermedios	15/06/2016		31/08/2016		Sí	0.5
24	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales. bacheo asfáltico menor; señalización.	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.5
25	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales; bacheo asfáltico menor; señalización.	5-Entregables Intermedios	15/06/2017		15/06/2017		Sí	0.5
26	EJECUCION : Mantenimiento rutinario y preventivo : Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales. bacheo asfáltico menor; señalización.	5-Entregables Intermedios	15/12/2017	15/12/2017			No	0.5
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento preventivo rutinario: Limpieza de cuneta, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de señales verticales.	5-Entregables Intermedios	01/01/2018	01/01/2018			No	1.0
28	CIERRE: Liquidación económica del contrato.- Cumplido	9-Entregables Formales	03/02/2018	03/02/2018			No	1.0
29	CIERRE: Acta entrega recepción definitiva.- Cumplido	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/02/2018	31/12/2019			No	1.0
30	CIERRE: Acta entrega recepción provisional.- Cumplido	9-Entregables Formales	04/02/2018	03/02/2018			No	1.0
31	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	01/12/2019	01/12/2019			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	01/12/2019	01/12/2019			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	13/12/2019	13/12/2019			No	1.0
34	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	13/12/2019	13/12/2019			No	1.0
35	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	20/12/2019	20/12/2019			No	1.5
36	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	PARALIZADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	11/05/2016
2	PARALIZADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	13/04/2016
3	PARALIZADA	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	17/11/2015
4	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/05/2015
5	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	30/01/2015
6	OBRA TERMINADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	22/11/2013
7	OBRA TERMINADA	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	26/09/2013
8	TRABAJOS FINALES	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	29/07/2013
9	CONSTRUCCION VIAL EN SU TRAMO FINAL	Proaño Soliz, Edison Eduardo	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	14/05/2013
10	SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION FISICA	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	06/02/2013
11	Historico - JULIO-2012 Se encuentra Colocada la primera capa de asfalto hasta el Km 23 , construccion de bordillos hasta el Km 21, la construccion avanza a buen ritmo PROBLEMAS: - Moradores de la	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	20/07/2012
12	Historico - JUNIO-2012 En visita realizada el 22-06-2012 se puede visualizar que esta obra avanza sin ningún contratiempo actualmente el asfaltado con su primera capa esta a la altura del Km 20 y	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/06/2012
13	Historico - MAYO-2012 El asfaltado de la via se encuentra hasta el Km. 10+400 con la primera capa de asfalto, hay presencia de personal y maquinaria trabajando constantemente; se encuentra constru	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	13/05/2012
14	Historico - ABRIL 2012 En la visita realizada con la Señora Gobernadora y el Supervisor de la SNAP se pudo evidenciar que la construcción de la vía avanza con el asfalto hasta el km 9+ 200. En vi	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	24/04/2012

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
15	Historico - MARZO-2012 Los trabajos en la construcción de la vía se desarrollan en condiciones normales, se encuentra colocada la primera capa de asfalto hasta el Km 2+700, luego de lo cual hasta	Morocho Velaña, Nancy Beatriz	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	05/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de obra de la construcción y mantenimiento de la carretera Yamanunca - Puerto Providencia		100.00 %	0.03	0.03	01/01/2017	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	13,799,872.26
Estimado Al Fin Del Proyecto:	44,899,170.19 **
Costo Total:	52,841,929.54
Total Devengado:	44,705,333.01
% Costo Total Devengado:	84.60 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 84.60 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	52,504,540.13	260,949.57	0.00	52,765,489.70
Ppto. Externo Planeado	14,110,830.81	0.00	0.00	14,110,830.81
Ppto. Aprobado Inicial	43,117,209.48	193,837.18	0.00	43,311,046.66
Ppto. Codificado	45,561,305.27	193,837.18	0.00	45,755,142.45
Ppto. Comprometido	2,574,997.78	0.00	0.00	2,574,997.78
Planeado - Codificado (2019)		67,112.39		
Programado a Devengar	44,240,830.81	193,837.18	0.00	44,434,667.99
Ppto. Devengado	44,705,333.01	0.00	0.00	44,705,333.01
Pagado Real	2,574,997.78	0.00	0.00	2,574,997.78
Estimado a fin de año	* 44,705,333.01	0.00	0.00	44,705,333.01
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-464,502.20	193,837.18	0.00	-270,665.02
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.05 %	0.00 %	0.00 %	100.61 %
Ppto. Codificado 998	851,663.49	0.00	0.00	851,663.49
Ppto. Devengado 998	851,663.49	0.00	0.00	851,663.49

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

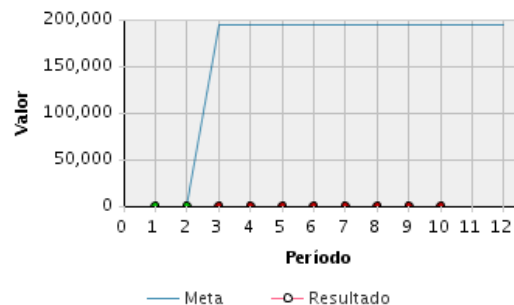

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	193,837.18	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	193,837.18	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00		193,837.18				
Dic	0.00		193,837.18				
Total	193,837.18	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0025 COSTO TOTAL DE PROYECTO	K029.docx	26/11/2019
2	A.0026 DEVENGADO MES DE OCTUBRE	DEVENGADO_2019-10.PDF	18/11/2019
3	A.0027 DEVENGADO MES DE SEPTIEMBRE	DEVENGADO_2019-09.PDF	04/10/2019
4	A.0028 DEVENGADO MES DE AGOSTO	DEVENGADO_2019-08.PDF	05/09/2019
5	A.0029 DEVENGADO MES DE JULIO	DEVENGADO_2019-07.pdf	01/08/2019
6	A.0030 DEVENGADO MES DE JUNIO	DEVENGADO_2019-06.pdf	26/07/2019
7	A.0031 DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADO_2019-05.pdf	26/07/2019
8	A.0032 DEVENGADO MES DE ABRIL	DEVENGADO_2019-04.pdf	26/07/2019
9	A.0033 DEVENGADO MES DE MARZO	DEVENGADO_2019-03.pdf	26/07/2019
10	A.0034 DEVENGADO MES DE FEBRERO	DEVENGADO_2019-02.pdf	26/07/2019
11	A.0035 INFORME EJECUTIVO Mayo 2018	Informe_Ejecutivo_ID3644_5_2018.pdf	06/07/2018
12	A.0036 INFORME EJECUTIVO Abril 2018	Informe_Ejecutivo_ID3644_4_2018.pdf	06/07/2018
13	A.0037 INFORME EJECUTIVO Marzo 2018	Informe_Ejecutivo_ID3644_3_2018.pdf	06/07/2018
14	A.0038 INFORME EJECUTIVO Febrero 2018	Informe_Ejecutivo_ID3644_2_2018.pdf	06/07/2018
15	A.0039 INFORME EJECUTIVO Enero 2018	Informe_Ejecutivo_ID3644_1_2018.pdf	06/07/2018
16	A.0040 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	Informe_ejecutivo_id_3644.pdf	05/01/2018
17	A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_nov-2017-id-3644.pdf	04/12/2017
18	A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K029.pdf	02/11/2017
19	A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_3644.pdf	02/10/2017
20	A.0045 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017	ID_CONTRATO_3644.pdf	05/09/2017
21	A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017	INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_3644.pdf	02/08/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
22	A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017	INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_3644.pdf	04/07/2017
23	A.048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017	INFORME_EJECUTIVO__MAYO_2017_ID_3644.pdf	01/06/2017
24	A.049 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2017	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017_PROYECTO_3644.pdf	06/05/2017
25	A.050 LIQUIDACION SEGUN RUBROS CONTRACTUALES	LIQUIDACION_YAMANUNCA_-_PUERTO_PROVIDENCIA.pdf	30/03/2017
26	A.1 Falta mantenimiento carretera Yamanunca - Puerto Providencia	FALTA_MANTENIMIENTO_CARRETERA_YAMANUNCA-PUERTO_PROVIDENCIA.doc	30/10/2015
27	A.1 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2016	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016-YAMANUNCA.pdf	01/03/2016
28	A.1 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2016	INFORME_YAMANUNCA_MARZO_2016.pdf	15/03/2016
29	A.1.1 INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016_YPP.pdf	26/05/2016
30	A.A.7 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016 - YAMANUNCA	A.A.7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016_-_YAMANUNCA.pdf	01/11/2016
31	A.A.8 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016 - YAMANUNCA	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	29/09/2016
32	A.A.9 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016 YAMANUNCA	INFORME_SITOP_AGOSTO_2016.pdf	11/08/2016
33	A.A.9 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016 - YAMANUNCA	Informe_SITOP_Dic2016_Carretera_Yamanunca_-_Pto.Providencia.pdf	05/01/2017
34	A1 INFORME EJECUTIVO SITOP (FEBRERO 2014)	A1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_(FEBRERO_2014).pdf	14/03/2014
35	A2 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL (FEBRERO 2014)	A2_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL.pdf	14/03/2014
36	A3 INFORME EJECUTIVO SITO MARZO 2014	A3_INFORME_EJECUTIVO_SITO_MARZO_2014.pdf	15/04/2014
37	A4 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2014	A4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2014.pdf	03/07/2014
38	A5 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2014	A5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2014.pdf	21/08/2014
39	A6 EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2014	A6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_JULIO_2014.pdf	21/08/2014
40	A7 EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2014	A7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_AGOSTO_2014.pdf	10/09/2014
41	A8 FOTOGRAFÍAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2014	A8_FOTOGRAFIA_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_AGOSTO_2014.pdf	12/09/2014
42	A9 FOTOGRAFIA AGOSTO 2014	A9_FOTOGRAFIA_AGOSTO_2014.JPG	12/09/2014
43	ACTA DE APROBACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO	ACTA_DE_APROBACION_DE_CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf	15/03/2013
44	B1 EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2014	B1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_OCTUBRE_2014.pdf	10/11/2014
45	B2 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 MANT YAMANUNCA	B2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014_MANT_YAMANUNCA.pdf	23/01/2015
46	B3 INFORME EJECUTIVO YAMANUNCA ENERO2015	B3_INFORME_EJECUTIVO_YAMANUNCA_ENERO2015.pdf	10/02/2015
47	B4 INFORME EJECUTIVO SITOP FEB 2015 YAMANUNCA	B4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_FEB_2015_YAMANUNCA.pdf	12/03/2015
48	B5 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015 YAMANUNCA	B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015_YAMANUNCA.pdf	10/05/2015
49	B6 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015	B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
50	B7 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	B7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf	28/08/2015
51	B8 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	B8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2015.pdf	28/08/2015
52	B9 Informe Ejecutivo Agosto 2015	INFORME_SITOP_AGOSTO_2015.pdf	01/09/2015
53	C1 Informe Ejecutivo Septiembre 2015	C1_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2015.pdf	11/11/2015
54	C2 Informe Ejecutivo Octubre 2015	C2_Informe_Ejecutivo_Octubre_2015.pdf	11/11/2015
55	C3 INFORME EJECUTIVO SITOP NOV 2015	C3_Informe_ejecutivo_Noviembre_2015.pdf	08/12/2015
56	C4 INFORME EJECUTIVO SITOP DIC 2015	carretera_yamanunca_puertoprovidencia_diciembre_2015.pdf	04/01/2016
57	C5 INFORME EJECUTIVO SITOP ENE 2016	CARRETERA_SHUSHUFINDI_-_PUERTO_PROVIDENCIA_ENERO_2016.pdf	10/02/2016
58	C6 INFORME EJECUTIVO SITOP FEB 2016	INFORME_SITOP_FEBRERO_2016.pdf	08/03/2016
59	C7 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2016	MARZO_2016-_YAMANUNCA_-_PTO._PROVIDENCIA.pdf	07/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
60	C8 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016	Abril_2016_-_Carretera_Yamunca-Pto_Providencia.pdf	05/05/2016
61	C9 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016	INFORME_SITOP_MAYO_2016.pdf	06/06/2016
62	CONTRATO COMPLEMENTARIO	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_CONSTRUCCION_DE_LA_CARRERA_SHUSHUFINDI_-_PUERTO_PROVIDENCIA.pdf	20/09/2015
63	CONTRATO ORIGINAL	CONTRATO_ORIGINAL_CONSTRUCCION_DE_LA_CARRERA_SHUSHUFINDI_-_PUERTO_PROVIDENCIA.pdf	30/09/2015
64	Croquis de Ubicación carretera Yamanunca - Puerto Providencia	YAMANUNCA_-_PUERTO_PROVIDENCIA.jpg	09/07/2012
65	DEVENGADIO MES DE ABRIL 2013	REPORTE__ABRIL.pdf	06/05/2013
66	DEVENGADO A AGOSTO 2012	Ejecucion_Agosto_2012.pdf	06/09/2012
67	DEVENGADO AL MES DE JUNIO	Ejecucion_Junio_2012.pdf	09/07/2012
68	DEVENGADO MES DE JULIO	Julio_-_2012_DEVENGADO.xls	13/08/2012
69	DEVENGADO MES DE MAYO	DEVENGADOS_MES_DE_MAYO.pdf	08/06/2012
70	DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE 2013	REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf	10/12/2013
71	DEVENGADO MES DE OCUBRE	EJECUCIÓN_PROYECTOS_OCTUBRE(1).pdf	07/11/2012
72	DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	SENPLADES_MODIFICACION_PRESUPUESTARIA_RECTIFICACION_Y_MEJORAMIENTO_-_PUERTO_PROVIDENCIA.pdf	30/09/2015
73	EJECUCION PRESUOUESTARIA OCT 2013	Reporte_de_Octubre_del_2013.pdf	14/11/2013
74	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE	Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf	05/10/2012
75	EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2013	devengado_septiembre.pdf	07/10/2013
76	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013	Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf	05/07/2013
77	FOTOGRAFIA ABRIL 2013	FOTOGRAFIAS_YAMANUNCA_MAR_2013.pdf	06/05/2013
78	FOTOGRAFIA DE PROYECTO AL 23 DE AGOSTO 2013	DSC00026.JPG	28/08/2013
79	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO	FOTOGRAFI_APROYECTO_YAMANUNCA.JPG	04/04/2012
80	INFORME EJECUTIVO AGOSTO	informe_eecutivo_agosto_yamanunca.pdf	09/10/2012
81	INFORME EJECUTIVO MAYO	YAMANUNCA_INFORME_EJECUTIVO.pdf	08/06/2012
82	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_OCT_2013_YAMANUNCA.pdf	14/11/2013
83	INFORME EJECUTIVO SITOP	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015.pdf	08/04/2015
84	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2013	yamanunca_inf_ejec_sitop_agosto_2013.pdf	09/09/2013
85	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2013	INFORME_EJECUTIVO_YAMANUNCA_MARZO_2013.pdf	06/05/2013
86	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE AGOSTO 2013	Reporte_Ejecucion_Agosto_2013[1].pdf	09/09/2013
87	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE JUNIO 2013 YAMANUNCA PUERTO PROVIDENCIA	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_JUNIO_2013_YAMANUNCA_PUERTO_PROVIDENCIA.pdf	05/07/2013
88	INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE SEPT 2013	informe_ejecutivo_yamanunca.pdf	07/10/2013
89	INFORME EJECUTIVO SITOP, MES DE FEBRERO	INFORME_EJECUTIVO_YAMANUNCA_MES_DE_FEB.pdf	04/04/2012
90	INFORME EJEUTIVO SITOP NOV 2013	INFORME_EJECUTIVO_SITOP_NOV_2013_YAMANUNCA.pdf	09/12/2013
91	PLANILLA MES DE JUNIO	PLANILLA_YAMANUNCA_MES_DE_JUNIO.pdf	09/07/2012
92	Proyecto Priorizado SENPLADES	INFORME.doc	03/05/2012
93	REPORTE DEVENGADO MES DE MAYO	REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf	07/06/2013
94	RESUMEN DE PLANILLAS A FEBRERO DEL 2013	resumen_de_planillas_yamanunca_a_marzo_del_2013.pdf	15/03/2013
95	RESUMEN DE PLANILLAS A FEBRERO DEL 2013	resumen_de_planillas_yamanunca_a_marzo_del_2013.pdf	15/03/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Administrador			
	Contratista			
	Lider del Proyecto / Fiscalizador / Supervisor			

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 1	ccruz@mtop.gob.ec	023974600
Noroña, Víctor	Supervisor Financiero	Analista	vnorona@mtop.gob.ec	Ext. 13706
Solano Blacio, Wimper Vicente	Director Distrital Sucumbíos	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Sucumbios	wvsolano@mtop.gob.ec	062991930 Ext 13701

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
24794_1.jpg	01/09/2015
