

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Imbabura

PROYECTO: K010 MTOP - Rectificación y Apertura de la vía E29 tramo Las Golondrinas-Saguangal de 62 Km. de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 puentes

Líder del Proyecto:	Vásquez Rivera, José Elías (jvasquez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chicango Burbano, Mauro Milton	Programas Relacionados:	
Titular:	Rea Hinojosa, Luis Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.383591	TIR:	12.80 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	84,298,649.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,533,339.22
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 28/02/2022
Fecha de última actualización:	04/11/2021	Fecha de Fin Base:	28/02/2022
Modificado por:	Rea Hinojosa, Luis Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2020

DATOS GENERALES
Descripción

Rectificación y Apertura de la vía E29 tramo Las Golondrinas-Saguangal de 62 Km. de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 puentes con el fin de interconectar las Provincias de Pichincha -Imbabura y Esmeraldas.

* Línea Base del Proyecto .- La carretera Las Golondrinas - Saguangal, se desarrolla en sentido Oeste - Este, teniendo su inicio en la comunidad de Las Golondrinas perteneciente a la parroquia García Moreno y concluye en la comunidad de Saguangal, atraviesa la parte oeste del cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura.

* Objetivo General.- Aperturar, Rehabilitar, Rectificar y Mejorar la vía E29 tramo: Las Golondrinas - Saguangal de 64,2 Km de longitud, ubicada en la provincia de Imbabura, incluye la construcción de 10 puentes vehiculares.

*

Beneficios Cualitativos

Con una inversión de 59.061.587,07 (incluye IVA) se realizará la construcción del tramo vial Saguangal - Las Golondrinas los mismo que beneficiaran al sector productivo y turístico de este sector.

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS E INDIRECTOS POBLACIÓN DE COTACACHI Y SUR DE ESMERALDAS

Restricciones

En la ejecución del Proyecto existen varios factores que limitan la ejecución de la obra, por tanto se establecen prioridades para la normal ejecución de las actividades, el factor económicoes determinante así como la asignación en los tiempos indicados, el retraso en dicho trámite restringe el funcionamiento y ejecución del mantenimiento vial..

Además la obra esta sujeta a efectos ambientales que limita en el avance de la ejecución de la obra.

La demora en la obtención de avales nos limitaria a tener una buena ejecución de acuerdo al cronograma de trabajo.

TIEMPO: ESTE PROYECTO SE EJECUTA HASTA el año 2023 CON CADA UNO DE sus rubros.

COSTO: USD 7174651.63


RECURSOS: SE EJECUTARÁN CON CARGO A RECURSOS EXTERNOS

ALCANCE: ESTE PROYECTO ABARCA TODOS LO QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, SEÑALIZACIÓN YEXPROIACIONES QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO SAGUANGAL- LAS GOLONDRINAS .

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.29 %

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Fin: 28/02/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

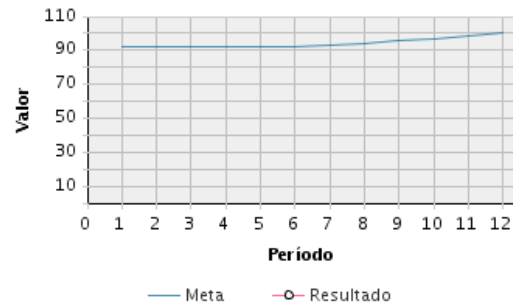

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	93 %	94 %	96 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE -2021 - El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables. - Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido: - Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM. - Se avanza 7.00 kilómetros. - En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo. ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros. A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.	Rea Hinojosa, Luis Fernando	04/11/2021 - 12:01 PM
SEPTIEMBRE -2021 - El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, considerando los problemas consabidos que trae el invierno en esta zona, en general la vía se encuentra en condiciones de circulación aceptables. - Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo han sido: - Desalojo de derrumbes, arreglo de cunetas, minado y acarreo de material a la vía, rasanteo y compactación desde el km. 34+000 al 27+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM. - Se avanza 7.00 kilómetros. - En este año, a partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo. ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros. A partir de este mes de octubre, se ha contrato por tres meses más a la Microempresa de Mantenimiento Vial para esta vía, lo que cubrirá hasta el mes de diciembre de 2021.	Rea Hinojosa, Luis Fernando	04/11/2021 - 11:48 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE -2021 1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables. A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo. ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros. Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000	Rea Hinojosa, Luis Fernando	05/10/2021 - 08:23 AM
AGOSTO -2021 1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables. A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo. ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros. Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	03/09/2021 - 05:13 PM
JULIO -2021 1.- El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 2.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables. A partir del 05 de julio de 2021, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial brindado por las Microempresas de conservación vial, para este tramo en este año se ha contratado una: "Intag Vial", la misma que interviene en su respectivo tramo. ."Intag Vial", tramo Selva Alegre - Saguangal: 37.000 kilómetros. Avance mensual de 18 kilómetros, actividad, desbroce desde la abscisa: 0+000 a la 18+000	Vásquez Rivera, José Elías	03/08/2021 - 01:01 PM
JUNIO - 2021 El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal, los daños a la vía son considerables. 1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial.. Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas, arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	02/07/2021 - 10:47 AM
MAYO - 2021 El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial.. Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas,	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	08/06/2021 - 02:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.		
ABRIL - 2021 El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial.. Las actividades de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre de 73+000 km. durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes, limpieza de alcantarillas, arreglo de cunetas, rasanteo y compactación de la mesa desde el km. 41+800 al 28+000, estos trabajos se logran mediante un convenio existente entre el MTOP y UNACEM.	Vásquez Rivera, José Elías	03/06/2021 - 04:21 PM
ABRIL - 2021 El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 1.- Se señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial..	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	05/05/2021 - 03:27 PM
MARZO - 2021 El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 1.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal y a los daños considerables causados a la vía se ha concentrado los trabajos en esta carretera y al no disponer de maquinaria o equipo suficiente en esta Dirección, la Junta Parroquial de García Moreno colabora con un tractor para el tramo Aguagrum - La Magdalena 37.00, los trabajos de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes y limpieza de alcantarillas.	Vásquez Rivera, José Elías	05/04/2021 - 02:52 PM
FEBRERO - 2021 El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. 1.- El mantenimiento vial de la carretera Otavalo selva alegre - Saguangal - las Golondrinas - Quinindé, eje vial (E-29), de 172.38 km. se lo realiza con la maquinaria de la Dirección Distrital de Imbabura, debido a la época invernal y a los daños considerables causados a la vía se ha concentrado los trabajos en esta carretera y al no disponer de maquinaria o equipo suficiente en esta Dirección, la Junta Parroquial de García Moreno colabora con un tractor para el tramo Aguagrum - La Magdalena 37.00, los trabajos de mantenimiento rutinario en el Tramo Otavalo - Selva Alegre durante este periodo se lo realiza en lo que es desalojo de derrumbes y limpieza de alcantarillas.	Vásquez Rivera, José Elías	05/04/2021 - 02:43 PM
FEBRERO - 2021 RECTIFICACION Y APERTURA DE LA VIA E-29 TRAMO LAS GOLONDRINAS - SAGUANGAL DE 64.2 KM. DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 10 PUENTES Y UN PASO PEATONAL EN CIELO VERDE. El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. Cabe señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	05/03/2021 - 12:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO - 2021 Fecha de firma de contrato: 25/06/2019 Fecha de inicio de obras: 28/12/2019 Fecha de término 25/08/2022 Plazo en días: 990 Constructora: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION Monto: 48.894.544 monto original sin IVA. El proyecto de apertura de este tramo de vía luego de estar paralizado desde el 15 de enero de 2020 por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, con fecha 14 de agosto de 2020 se logra la firma el contrato Complementario Nro. 2 y con fecha 17 de agosto del mismo año se da la orden de reinicio de trabajos. Cabe señalar que el tramo que conecta la Magdalena con Las Golondrinas con una longitud de 64,2 Km. se encuentra en construcción, estos kilómetros están ya incluidos en el total de 331.97 km. de la Red Vial Estatal provincial	Cruz Chicaiza, Rene Alejandro	10/02/2021 - 08:33 AM
NOVIEMBRE: 2020 Con la suscripción del contrato complementario No. 2, el 15 de agosto del 2020 se continuaron con los trabajos planificados. .Se continúa con armado de acero en cuerpo y pantallas Pte. Manadariyacu Chico y el respectivo encofrado estribo izquierdo Abs: 4+820 .Se trabaja en la colocación de mejoramiento en el tramo Abs: 5+950 a 6+100 .Se continúa con trabajos de cortes de laterales tramo Abs: 6+300 al 7+000 .Se realiza el encofrado del 3er nivel de cuerpo y pantallas del estribo derecho del Pte. Río Verde Abs: 8+145 .Se realiza figurado y armado de acero de refuerzo, encofrado y fundición de solera de ducto cajón Abs: 11+007 .Encofrado, armado de acero y fundición de losa del ducto cajón Abs: 14+681 .Se realiza excavación, armado de hierro, encofrado y fundición de cabezal de salida de la alcantarilla Abs: 15+415 .Se realizan trabajos de perforación para excavación en roca entre las abscisas 16+130 a 16+290 y su respectiva voladura. .Se realiza excavaciones para rectificación de vía en el tramo Abs:15+600 a 16+000. .Excavación y desalojo en el acceso derecho al puente Mandariyacu Grande entre las abscisas 16+190 a 16+540 y entre las Abs: 17+600 a 17+700 .Excavación y mejoramiento subrazante de ducto cajón Abs: 37+500 .Se realiza movimiento de tierras entre las Abs: 38+340 - 38+460 A la espera de la documentación para la suscripción del contrato complementario No. 3 que permitirá regularizar los rubros Actualmente se han tramitado las planillas por parte de la Dirección Distrital de Imbabura a la espera del pago por Administración Central.	Vásquez Rivera, José Elías	03/12/2020 - 04:25 PM
OCTUBRE: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se en ejecución el plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 8.13%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos. Con fecha 15 de agosto del 2020 se firmó el contrato complementario y con fecha 17 de agosto se reiniciaron los trabajos.	Obregón Guadalupe, Ángel Edison	05/11/2020 - 08:48 AM
SEPTIEMBRE: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se en ejecución el plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los	Vásquez Rivera, José Elías	05/10/2020 - 11:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos. Con fecha 15 de agosto del 2020 se firmó el contrato complementario y con fecha 17 de agosto se reiniciaron los trabajos.		
AGOSTO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, con fecha 15 de agosto del 2020 se suscribe el contrato complementario y el 17 de agosto se dispone el reinicio de trabajos.	Obregón Guadalupe, Ángel Edison	04/09/2020 - 11:35 AM
JULIO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 16.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,50%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017	Obregón Guadalupe, Ángel Edison	05/08/2020 - 02:28 PM
MAYO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,12%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017	Vásquez Rivera, José Elías	24/06/2020 - 03:14 PM
.	Yépez Rivera, Milton Annelio	05/05/2020 - 05:20 PM
ENERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía. FEBRERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y adminisitrador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1. MARZO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del	Vásquez Rivera, José Elías	04/05/2020 - 07:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y administador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1, con la declaración de Emergencia Sanitaria Decreto 1017, se suspendieron los trabajos a espera del levantamiento del mencionado decreto. ABRIL: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, con fecha 25 de Diciembre del 2019, se entrega el anticipo a la contratista, actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y el administrador del contrato se encuentran constatando los trabajos ejecutados en el mes de Febrero en el cual se cuenta con un avance del 0,12%, en base a declaratoria de Emergencia Sanitaria los trabajos se encuentran suspendidos a la espera del levantamiento del decreto 1017		
ENERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía. FEBRERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y administador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1. MARZO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y administador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1, con la declaración de Emergencia Sanitaria Decreto 1017, se suspendieron los trabajos a espera del levantamiento del mencionado decreto.	Vásquez Rivera, José Elías	05/04/2020 - 03:21 PM
ENERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70 actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía. FEBRERO: 2020 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2020 por un monto de USD. 31.436.311,70, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto, actualmente se realizan trabajos de movimiento de tierras y apertura de vía, el fiscalizador y administador de contrato se encuentran en revisión de los avances de obra previo a la presentación de la planilla 1.	Vásquez Rivera, José Elías	05/03/2020 - 06:08 PM
DICIEMBRE: 2019	Vásquez Rivera, José Elías	04/01/2020 - 10:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, mediante Memorando No. MTOP-CGAD-2019-1015-ME del 27-12-2019 comunican al Director Distrital que el 25/12/2019 se realizó el desembolso del Anticipo del Proyecto.		
NOVIEMBRE: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, considerando que hasta la fecha no se cancela el anticipo, por lo tanto se encuentran suspendido el inicio de trabajos..	Vásquez Rivera, José Elías	04/12/2019 - 02:42 PM
OCTUBRE: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de Octubre se encuentra autorizada la suspensión del plazo del Contrato, mediante Oficio No. MTOP-DDI-19-195-OF del 26-07-2019, considerando que hasta la fecha no se cancela el anticipo, por lo tanto se encuentran suspendido el inicio de trabajos..	Vásquez Rivera, José Elías	05/11/2019 - 03:17 PM
SEPTIEMBRE: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de SEPTIEMBRE se encuentra en definiciones para el inicio de la obra y en trámites para el pago del anticipo.	Vásquez Rivera, José Elías	07/10/2019 - 03:00 PM
JULIO: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra suscrito el contrato de construcción de obras de vía con fecha 25-06-2019, al mes de julio se encuentra en definiciones para el inicio de la obra y en trámites para el pago del anticipo	Yépez Rivera, Milton Annelio	05/08/2019 - 02:44 PM
JUNIO: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra en la etapa de contratación.	Vásquez Rivera, José Elías	03/07/2019 - 03:43 PM
MAYO: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Actualmente se encuentra en la etapa de contratación.	Vásquez Rivera, José Elías	04/06/2019 - 03:12 PM
ABRIL: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Se encuentra en la fase de pre selección de las Cías Chinas	Vásquez Rivera, José Elías	02/05/2019 - 08:18 AM
MARZO: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53, Se encuentra en la fase de pre selección de las Cías Chinas	Andrade Godoy, Luis Marcelo	03/04/2019 - 11:51 AM
FEBRERO: 2019 El proyecto se encuentra con asignación presupuestaria para el ejercicio 2019 por un monto de USD. 23.253.718.53	Leyton Ruano, Napoleon Dilon	01/03/2019 - 11:57 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. El factor clima es una causante para el retraso del avance del proyecto	26/03/2021	José Elías Vázquez Rivera	30 %	50	15	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	15/07/2019		01/01/2019		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPEIP postulado	1-Solicitud de Información	20/07/2019		01/01/2019		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	31/07/2019		14/02/2019		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	31/07/2019		01/01/2019		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	31/07/2019		31/07/2019		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Aval aprobado	1-Solicitud de Información	02/08/2019		09/05/2019		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	1-Solicitud de Información	02/08/2019		02/08/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	04/08/2019		04/08/2019		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito	3-Adjudicación	04/08/2019		04/08/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito	5-Entregables Intermedios	01/11/2019		31/12/2019		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN :- FISCALIZACIÓN	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	5.0
14	EJECUCIÓN.- AMBIENTAL	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
15	EJECUCIÓN.- EXPROPIACIONES	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	2.0
16	EJECUCIÓN.- OBRA	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	34.0
17	EJECUCIÓN.- PUENTES	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	18.0
18	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	01/01/2021	01/01/2021			No	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	30/01/2021	30/01/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/07/2021	30/07/2021		▼	No	1.0
21	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	27/08/2021	27/08/2021		▼	No	1.0
22	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/09/2021	30/09/2021		▼	No	1.5
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	29/10/2021	29/10/2021		▼	No	1.0
24	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2021	30/11/2021		▼	No	2.0
25	CIERRE: Liquidación Económica	V - Verificación ejecutiva	15/12/2021	15/12/2021		●	No	1.0
26	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021		●	No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	INDICADOR DEL PORCENTAJE DEL AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO GOLONDRINAS SAGUANGAL	🔴	67.35 %	2.45	1.65	01/08/2021	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	19,557,016.85
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,533,339.22 **
Costo Total:	59,061,587.07
Total Devengado:	4,358,687.49
% Costo Total Devengado:	7.38 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 7.38 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	47,156,699.91	7,174,651.73	0.00	54,331,351.64
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	46,234,610.01	7,174,651.73	0.00	53,409,261.74
Ppto. Codificado	33,147,754.59	7,174,651.73	0.00	40,322,406.32
Ppto. Comprometido	25,212,543.67	7,174,651.73	0.00	32,387,195.40
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	33,147,754.59	7,174,651.73	0.00	40,322,406.32
Ppto. Devengado	4,358,687.49	0.00	0.00	4,358,687.49
Pagado Real	4,358,687.49	0.00	0.00	4,358,687.49
Estimado a fin de año	* 4,358,687.49	0.00	0.00	4,358,687.49
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	28,789,067.10	7,174,651.73	0.00	35,963,718.83
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 13.15 %	0.00 %	0.00 %	10.81 %
Ppto. Codificado 998	2,719,384.33	0.00	0.00	2,719,384.33
Ppto. Devengado 998	1,555,803.39	0.00	0.00	1,555,803.39

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

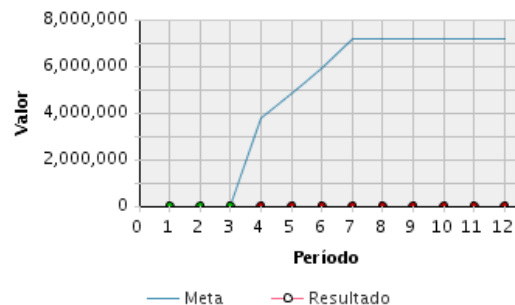

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	3,782,792.05	0.00	3,782,792.05	0.00	0.00 %		0.00 %
May	1,055,541.41	0.00	4,838,333.46	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	1,075,333.80	0.00	5,913,667.26	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	1,260,984.47	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	0.00	0.00	7,174,651.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	7,174,651.73	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	2019-02-08_03-40-08_ACUERDOMINISTERIAL 010 Las golondrinas-Saguangal	2019-02-08_03-40-08_ACUERDOMINISTERIAL_010_Las_golondrinas-Saguangal.pdf	05/07/2019
2	2019-02-08_04-14-17_CERT._FINANCIAMIENTO - las Golondrinas Saguangal	2019-02-08_04-14-17_CERT._FINANCIAMIENTO_-_las_Golondrinas_Saguangal.pdf	05/07/2019
3	A12. INFORME DE TRABAJO MES DE ABRIL 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Abril_-_2021_(1).docx	05/07/2021
4	A14. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA MARZO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Marzo_-_2021-1.docx	05/07/2021
5	A16. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - MAYO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Mayo_-_2021_-_copia.docx	05/07/2021
6	A17. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL MAYO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_Mayo_-_2021_-_copia.docx	05/07/2021
7	A21. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL IMBABURA - JUNIO -2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_junio_-_2021.docx	05/07/2021
8	A7. INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - enero - 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_enero_-_2021.docx	05/07/2021
9	A9. INFORME DE TRABAJO MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA FEBRERO 2021	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_febrero_-_2021-1.docx	05/07/2021
10	AGOSTO INFORME DE TRABAJOS SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_AGOSTO-2020.docx	04/09/2020
11	Aval Presupuestario Saguangal-Las Golondrinas	Aval_Presupuestario_Saguangal-Las_Golondrinas.pdf	05/07/2019
12	C-PRESUPUESTARIA OCTUBRE-SELVA ALEGRE-SAGUANGAL-2019	C-PRESUPUESTARIA_OCTUBRE-SELVA_ALEGRE-SAGUANGAL-2019.pdf	28/11/2019
13	C-PRESUPUESTARIA SELVA ALEGRE-GOLONDRINAS SEPTIEMBRE-2019	C-PRESUPUESTARIA_SELVA_ALEGRE-GOLONDRINAS_SEPTIEMBRE-2019.pdf	28/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	CEDULA PRESUPUESTARIA JULIO 2020	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS_JULIO.pdf	05/08/2020
15	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS NOVIEMBRE	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	03/12/2020
16	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS OCTUBRE	CÉDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	05/11/2020
17	CEDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS SEPTIEMBRE	CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS_SEPTIEMBRE.pdf	05/10/2020
18	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-ENERO-FEBRERO-2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS-ENERO-FEBRERO.pdf	03/08/2020
19	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-JUNIO-2020	Cedula_Presupuestaria_Selva_Alegre-Saguangal-Las_Golondrinhas_Junio_2020pdf.pdf	03/07/2020
20	CEDULA-PRESUPUESTARIA-SAGUANGAL-LAS-GOLONDRINAS-MAYO-2020	cedula_presupuestaria_Mayo.PDF	24/06/2020
21	CERTIFICACION PLURIANUAL GOLONDRINAS	CERTIFICACION_PLURIANUAL_GOLONDRINAS.pdf	05/07/2019
22	CONTRATO FIRMADO GOLONDRINAS SAGUANGAL	CONTRATO_FIRMADO_GOLONDRINAS_SAGUANGAL.pdf	05/08/2019
23	cédula noviembre-2019 PROYECTOS	cédula_noviembre-2019_PROYECTOS.PDF	04/12/2019
24	CÉDULA SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS AGOSTO	AGOSTO_CEDULA_SAGUANGAL_LAS_GOLONDRINAS.pdf	04/09/2020
25	Dictamen de Prioridad SENPLADES Las Golondrinhas - Saguangal	Dictamen_de_Prioridad_SENPLADES_Las_Golondrinhas_-_Saguangal.pdf	05/07/2019
26	ejecucion presupuestaria la 31-12-2019	ejecucion_presupuestaria_la_31-12-2019.pdf	09/01/2020
27	INFORME AGOSTO-2019 LAS GOLONDRINAS	INFORME_AGOSTO-2019_LAS_GOLONDRINAS.pdf	04/09/2019
28	INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE IMBABURA - NOVIEMBRE - 2020-11	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-_NOVIEMBRE_-_2020-11.docx	05/11/2020
29	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL ABRIL 2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ABRIL_2019.docx	02/05/2019
30	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL JULIO-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2019.docx	05/08/2019
31	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL JUNIO-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JUNIO-2019.docx	05/07/2019
32	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL NOVIEMBRE-2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_NOVIEMBRE-2019.docx	05/12/2019
33	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL RESUMEN_ENERO 2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_RESUMEN_ENERO_2019.docx	05/02/2019
34	INFORME SAGUANGAL LAS GOLONDRINAS	INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-_OCTUBRE_-_2020-10.docx	05/11/2020
35	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ENERO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_ENERO-2020.docx	05/03/2020
36	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO-2020.docx	05/03/2020
37	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_FEBRERO_2019.docx	01/03/2019
38	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2020	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_JULIO-2020.docx	05/08/2020
39	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MARZO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MARZO_2019.docx	03/04/2019
40	INFORME PROYECTO LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MAYO_2019	INFORME_PROYECTO_LAS_GOLONDRINAS-SAGUANGAL_MAYO_2019.docx	04/06/2019
41	marco lógico- Carretera Las Golondrinhas-Saguangal	MARCO_LOGICO_REVISAR.xls	26/03/2019
42	OFICIO MTOP-DDI-19-195-OF, SUSPENSION PLAZO DEL PROYECTO	OFICIO_MTOP-DDI-19-195-OF.pdf	05/11/2019
43	SEPTIEMBRE INFORME DE TRABAJOS	INFORME_DE_TRABAJOS_SAGUANGAL_-_SEPTIEMBRE_-_2020-9.pdf	05/10/2020
44	SIPEIP 175200000.0000.383591 RECTIFICACION Y APERTURA DE LA VIA E29 TRAMO LAS GOLONDRINAS - SAGUANGAL DE 62 KM (1)	SIPEIP_175200000.0000.383591_RECTIFICACION_Y_APERTURA_DE_LA_VIA_E29_TRAMO_LAS_GOLONDRINAS_DE_62_KM_(1).pdf	27/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	solicitud de Suspensión de vigencia del indicador "Porcentaje de cumplimiento de cronograma en GPR"	Memorando_Nro._MTOp-DDI-2021-1433-ME.pdf	04/08/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rea Hinojosa, Luis Fernando	DIRECTOR	Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Imbabura	lrea@mtop.gob.ec	
Velasco Portilla, Miguel Angel	Supervisor Financiero	Supervisor Financiero	mavelasco@mtop.gob.ec	13405
Vásquez Rivera, José Elías	Lider Proyecto	Supervisor de Construcciones	jvasquez@mtop.gob.ec	023974600
