

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K115 MTOP - Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto

Líder del Proyecto:	Castillo Elizalde, Eddy Patricio (ecastillo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Prado Leverone, Juan Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.0000.381243	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,775,297.78
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/08/2012 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	28/09/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2025
Modificado por:	Castillo Elizalde, Eddy Patricio	Fecha del siguiente Hito:	28/10/2022

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconstrucción, rehabilitación y construcción de obras de infraestructura de salud pública en las zonas afectadas por el terremoto.

PRODUCTO: Infraestructura hospitalaria para las zonas afectadas por el terremoto

LINEA BASE: Reconstrucción, rehabilitación y construcción de hospitales en las zonas afectadas por el terremoto.

OBJETIVO GENERAL: Ejecución de estudios, obras y fiscalización de los hospitales en las zonas afectadas por el terremoto.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Financiar la contratación de obras, estudios y fiscalización para infraestructura hospitalaria para las zonas afectadas por el terremoto.

Beneficios Cualitativos

Contribuir en la reconstrucción, rehabilitación y construcción de obras de infraestructura de salud pública

Modernización, eficiencia y calidad del servicio hospitalario en las instituciones públicas, adecuada funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento, mobiliario y equipos que dignifiquen las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios públicos como de los pacientes.

Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes.

Aumentar la cobertura en los territorios que cuentan con déficit de atención en el ámbito de la salud y alcanzar a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS: 2.229.026 habitantes de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas

INDIRECTOS: habitantes de las zonas cercanas a las provincias de Manabí y Esmeraldas, turistas, comerciantes.

Restricciones

TIEMPO: El plazo de ejecución del proyecto será aproximadamente de 13 años

COSTO: Presupuesto asignado por la Entidad Requirente hasta la finalización de las obras


RECURSOS: Humanos (técnicos, obreros), materiales (materia prima, material constructivo, mobiliario hospitalario), equipos (equipo constructivo, equipamiento médico)

ALCANCE: Los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 75.79 %
 Fecha de Inicio: 03/08/2012 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

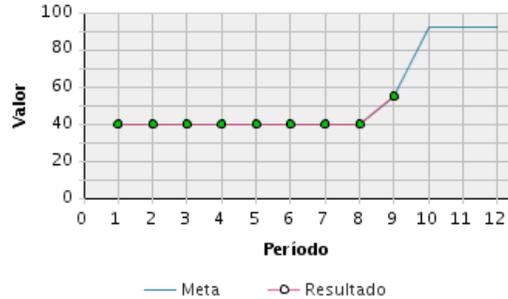

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	55 %	92 %	92 %	92 %
	Avance real acumulado											
	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	55 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, se realizó la designación como Líder de Proyecto, para actualización y registro de información en la ficha de Proyecto de Inversión K115 en la herramienta Gobierno por Resultados - GPR, relacionada al "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto". (Anexo 1).</p> <p>En consideración a la designación como Líder de Proyecto, se realizaron las siguientes actividades para cumplimiento del Hito 4 - "Solicitud de información generada", para el Proyecto de Inversión, de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0580-ME de 20 de septiembre de 2022, se solicitó a la Dirección de Seguimiento de Planes Programas y Proyectos, capacitación en la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR y remisión de insumos básicos necesaria para la actualización y registro de información en la Ficha de Proyecto de Inversión (Anexo 2), requerimiento que fue atendido por dicha dirección mediante Memorando Nro. MTOP-DSPPP-22-0216-ME de 21 de septiembre de 2022, indicando que la delegada para la capacitación es la Ing. Azucena del Rocío Suarez Procel, la cual fue efectuada el 22 de septiembre de 2022; así mismo, se manifestó que la información debe ser solicitada a las unidades administrativas correspondientes. (Anexo 3) . Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0582-ME de 21 de septiembre de 2022, sobre la base de lo manifestado por la Dirección de Seguimiento de Planes Programas y Proyectos, se solicitó a la Dirección de Planificación e Inversión y a la Dirección Financiera, los insumos básicos y cédulas presupuestarias, para registro y actualización de la ficha de Proyecto de Inversión (Anexo 4), requerimiento que fue atendido solamente por la Dirección Financiera, mediante Memorando Nro. MTOP-DF-2022-1698-ME de 23 de septiembre de 2022, entregando las cédulas presupuestarias por Subactividad e ITEM, documentación que sirvió de base para Editar Presupuesto y Perfil Económico (Anexo 5), con respecto a la entrega de insumos básicos: Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del 	Castillo Elizalde, Eddy Patricio	28/09/2022 - 01:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>proyecto por dicha secretaría y la Guía de Marco Lógico, estos no han sido atendidos por la Dirección de Planificación e Inversión, hasta la presente fecha.</p> <p>. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0588-ME de 26 de septiembre de 2022, se solicito al Director Nacional de Producción de Obras Públicas, para que, por su intermedio se solicite a las Direcciones Nacionales de Estudios, Control y Fiscalización de Obras Públicas, conforme a sus competencia, se registre los contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al "Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Física en las Zonas Afectadas por el Terremoto" con CUP: 123200000.0000.381243; así como, se remita la documentación digital de respaldo como son contratos de estudios, consultoría y fiscalización, actas de entrega recepción, provisional, definitiva, presunta, terminaciones por mutuo acuerdo y anticipada y unilateral de contrato. (Anexo 6)</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Liquidación económica de los contratos correspondiente a los proyectos de inversión	28/09/2022	Eddy Patricio Castillo Elizalde	40	50	20	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirentes CAUSARÍA el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública.	28/09/2022	Eddy Patricio Castillo Elizalde	10 %	10	1	0/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional suscrito	1-Solicitud de Información	03/08/2012		03/08/2012		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	03/08/2012		03/08/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Contrato LICO-SECOB-002-2019 suscrito	4-Inicio de Trabajo	14/06/2019		14/06/2019		Sí	20.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información generada	5-Entregables Intermedios	26/09/2022		26/09/2022		Sí	15.0
5	EJECUCIÓN: Recopilación de información generada	5-Entregables Intermedios	28/10/2022	28/10/2022			No	15.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	CIERRE: Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral de Contrato	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	2.0
7	EJECUCIÓN: Contratos de estudio firmado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	4.0
8	EJECUCIÓN: Contratos de fiscalización firmado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	8.0
9	EJECUCIÓN: Contratos de obra firmado	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	8.0
10	CIERRE: Actas Entrega Recepción Provisional firmada	9-Entregables Formales	30/04/2023	30/04/2023			No	2.0
11	CIERRE: Actas Entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2023	31/10/2023			No	4.0
12	CIERRE: Informe final de proyecto de inversión ejecutado	9-Entregables Formales	30/06/2024	30/06/2024			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos de ejecución de contratos de obras públicas conforme las cláusulas contractuales.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,775,297.78 **
Costo Total:	50,775,297.78
Total Devengado:	14,403,007.27
% Costo Total Devengado:	28.37 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 28.37 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	50,775,297.78	0.00	50,775,297.78
Ppto. Externo Planeado	0.00	50,775,297.78	0.00	50,775,297.78
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	50,775,297.78	0.00	50,775,297.78
Ppto. Codificado	0.00	50,775,297.78	0.00	50,775,297.78
Ppto. Comprometido	0.00	4,731,580.35	0.00	4,731,580.35
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	50,775,297.78	0.00	50,775,297.78
Ppto. Devengado	0.00	14,403,007.27	0.00	14,403,007.27
Pagado Real	0.00	6,391,785.46	0.00	6,391,785.46
Estimado a fin de año	* 0.00	40,563,134.90	0.00	40,563,134.90
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	10,212,162.88	0.00	10,212,162.88
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	28.37 %	0.00 %	28.37 %
Ppto. Codificado 998	0.00	11,719,789.94	0.00	11,719,789.94
Ppto. Devengado 998	0.00	4,004,988.96	0.00	4,004,988.96

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

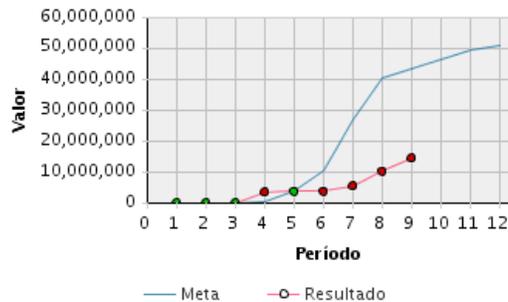

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	324,406.14	3,442,921.31	324,406.14	3,442,921.31	1,061.30 %		6.78 %
May	3,476,107.09	112,232.29	3,800,513.23	3,555,153.60	93.54 %		7.00 %
Jun	6,503,869.91	106,011.87	10,304,383.14	3,661,165.47	35.53 %		7.21 %
Jul	16,492,020.18	1,819,417.06	26,796,403.32	5,480,582.53	20.45 %		10.79 %
Ago	13,391,362.82	4,731,580.35	40,187,766.14	10,212,162.88	25.41 %		20.11 %
Sep	2,887,134.90	4,190,844.39	43,074,901.04	14,403,007.27	33.44 %		28.37 %
Oct	3,263,823.84		46,338,724.88				
Nov	2,985,710.04		49,324,434.92				
Dic	1,450,862.86		50,775,297.78				
Total	50,775,297.78	14,403,007.27					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Convenio Interinstitucional suscrito	convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf	08/09/2022
2	A.2 - Hito 2 - Recursos económicos asignados	2_dict._arrastre_-_oficio_nro._snp-spn-2021-0987-of.pdf	08/09/2022
3	A.3 - Hito 3 - Contrato LICO-SECOB-002-2019 suscrito	CONTRATO_No._LICO-SECOB-002-2019_(3).pdf	08/09/2022
4	A.4 - Anexo 1 - Designación líder de proyecto	MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf	08/09/2022
5	A.5 - Hito 4 - Solicitud de información generada	Hito_4_Solicitud_información_generada.pdf	28/09/2022
6	A.6 - Anexo 2 - Solicitud de capacitación en GPR, insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DNPOP-2022-0580-ME_20092022.pdf	28/09/2022
7	A.7 - Anexo 3 - Respuesta a solicitud de capacitación en GPR, insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DSPPP-22-0216-ME_21092022.pdf	28/09/2022
8	A.8 - Anexo 4 - Solicitud de insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DNPOP-2022-0582-ME_21092022.pdf	28/09/2022
9	A.9 - Anexo 5 - Respuesta a solicitud de insumos básicos y cédulas presupuestarias para actualización y registro de Ficha de Proyecto de Inversión	MTOP-DF-2022-1698-ME_23092022.pdf	28/09/2022
10	B.1 - Anexo 6 - Solicitud de contratos de estudios, consultoría y fiscalización atados al Proyecto de Inversión e información documental digital de respaldo	MTOP-DNPOP-2022-0588-ME_26092022.pdf	28/09/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castillo Elizalde, Eddy Patricio	Líder del Proyecto	Analista de Seguridad Vial 2	ecastillo@mtop.gob.ec	
Prado Leverone, Juan Carlos	Titular	Director Nacional de Producción de Obras Públicas	jprado@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150611_1.jpg	08/09/2022
