

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas

PROYECTO: K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Vaca Aguirre, Hugo Xavier (hvaca@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Santamaría Loor, Kiura Ninoska | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Prado Leverone, Juan Carlos | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 123200000.632.2477 | TIR: | 36.96 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 287,231,173.10 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,198,568.31 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2025 |
| Fecha de última actualización: | 01/11/2022 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2024 |
| Modificado por: | Vaca Aguirre, Hugo Xavier | Fecha del siguiente Hito: | 30/11/2022 |

DATOS GENERALES

Descripción

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El PIFEMEFS fue creado con objetivo de responder a las necesidades priorizadas por el Ministerio de Salud Pública, resultantes del diagnóstico situacional realizado en las unidades de salud de segundo y tercer nivel, las mismas que han experimentado desde el año 2.008 un incremento en la demanda de atención de los usuarios por la gratuidad progresiva de los servicios de salud, que a su vez determina que su infraestructura física, deba ser ampliada o remodelada, rediseñada y construida de acuerdo a las actuales necesidades de la población.

*PRODUCTO / SERVICIO: Incrementar la cobertura nacional de infraestructura de salud.

Contratar las obras de infraestructura de la Entidad Requirente, así como todas las acciones que sean de competencia para contratar las obras de infraestructura del MSP.

1. Contratar/ Realizar estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
2. Contratar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
3. Contratar la Fiscalización para la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

* LÍNEA BASE: Construcción de Infraestructura de Salud Pública (Hospitales y Centros de Salud), para aumentar la cobertura de salud a nivel nacional.

* OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Finalizar la contratación/diseño de estudios referente Infraestructura de Salud Pública, sean estos Hospitales o Centros de Salud.
2. Finalizar la Construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)
3. Fiscalizar la construcción referente a Infraestructura de Salud Pública (Hospitales, Centros de Salud)

Beneficios Cualitativos

Contribuir a incrementar la esperanza y calidad de vida de la población, mediante el mejoramiento de la infraestructura, construcción de unidades nuevas a las unidades de salud a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

*DIRECTOS: Se beneficiara 14'048.900 habitantes dentro de las provincias de CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GALAPAGOS, GUAYAS, LOJA, MANABI, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PICHINCHA, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SUCUMBIOS, TUNGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE, en donde se construirán las diferentes Infraestructuras de Salud Pública.

* INDIRECTOS: Aumentar la cobertura en los territorios que cuentan con déficit atención en el ámbito de la salud, y alcanzar a nivel nacional (17.888.474 Habitantes aproximadamente por cumplimiento de instructivo)

Restricciones

TIEMPO: El proyecto estará una duración de 13 años aproximadamente
 COSTO: \$ 18.891.149,66 monto de inversión del proyecto. 2022


Restricciones

ALCANCE: Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura de salud.
 RECURSOS:
 - Humanos: Profesionales en la rama de la Construcción para la ejecución de las obras.
 - Materiales: Es la materia Prima para la construcción como pétreos, cementos, hierro, etc.,
 - Equipos: La maquinaria que este presente en la construcción de cada una de la Infraestructura Pública de Salud.
 - Otros: Disponibilidad de terrenos para construcción de la nueva infraestructura de salud pública
 - El crecimiento poblacional se mantengan de acuerdo a los indicadores.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 77.38 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

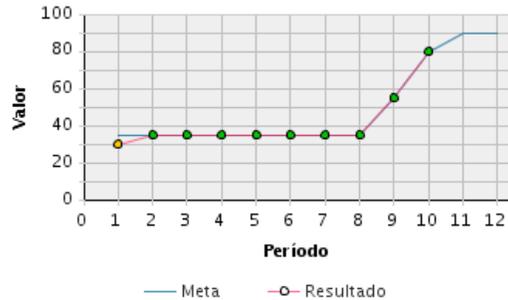

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2022 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 55 % | 80 % | 90 % | 90 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 30 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 55 % | 80 % | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ▼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <p>OCTUBRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recopilación de información de los contratos de OBRA que forman parte del PROYECTO "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD" (cumplimiento Hito 6) 2. Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1361-ME de 06 de octubre de 2022, la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas solicitó al Subsecretario Zonal 3 y al Director de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua y Cotopaxi, que se realicen las acciones dentro de su competencia para cumplir con la ejecución presupuestaria de los recursos asignados. Anexo 7 3. Se gestionó para obtener la ficha del proyecto "INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", que esta siendo usada por el Ministerio de Salud Pública el año 2022. Anexo 8 4. Se realizó el informe de los Contratos de Obra del Proyecto INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD", del estado en que se encuentra cada obra que pertenece a este proyecto (cumplimiento Hito 7). 5. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1965-ME DE 17 DE octubre de 2022 AUTORIZACION DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RE-ICO-007-2013 "CONSTRUCCIÓN Y RE POTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO", por parte de la Directora Distrital de Tungurahua y Administradora de Contrato. Anexo 9 6. Mediante Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1993-ME de 21 de octubre de 2022, se solicitó la AUTORIZACION DE PAGO DE LA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RE-ICO-007-2013 "CONSTRUCCIÓN Y | Vaca Aguirre, Hugo Xavier | 01/11/2022 - 09:15 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>RE POTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO", por parte de la Directora Distrital de Tungurahua y Administradora de Contrato. Anexo 10</p> <p>7. Mediante Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-261-OF de 26 de octubre de 2022, el Coordinador General De Planificación Y Gestión Estratégica, solcito a la Gerente del Proyecto de Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario Para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud, autorizar el uso recursos en necesidades emergentes. Anexo 11</p> <p>8. Mediante Memorando Nro. Oficio Nro. MSP-SGOLS-2022-0211-O de 21 de octubre de 2022, la Mgs. Verónica Elizabeth Rosero Pazmiño. Subsecretaria de Gestión De Operaciones Y Logística En Salud, señaló que el monto de 15.103.758,97, para financiar las obligaciones pendientes del Hospital General de 400 Camas de Monte Sinaí, solicitado por el MTOP, y que se encuentra dentro del proyecto PIFEMEFS, ya no cuenta con el presupuesto solicitado para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, se gestionará ante la Secretaria Nacional de Planificación la asignación e inclusión en la ejecución del ejercicio fiscal 2023. Anexo 12</p> <p>9. Mediante Oficio Nro. MSP-PRIEHSSTNAS-2022-0087-O de 31 de octubre de 2022 la Arq. Vanessa Mishel Mosquera Sevilla en calidad de Gerente del Proyecto de Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario Para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención en Salud, recomendó al Coordinador General De Planificación Y Gestión Estratégica del MTOP: "considerar y dar prioridad al requerimiento del MTOP, en el cual se solicitó el valor de USD 15.103.758,97. Por lo expuesto; y dejando constancia de la obligación legal y cierre de los contratos de ejecución de obra, me permito autorizar el uso del recurso solicitado, sin perjuicio de las acciones de control que por las acciones u omisiones que se deriven, a consecuencia de las gestiones que se desarrollen para el cierre de los procesos con obligaciones pendientes de pago hasta la fecha." Anexo 13</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2022:</p> <p>1. Este proyecto de inversión tiene como ejecutor y entidad requirente al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) actúa exclusivamente como co-ejecutor, una vez que se realiza la transferencia de recursos por parte del MSP (conforme convenio interinstitucional). Además, el MTOP actúa como co-ejecutor a partir de la supresión del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) a través del D.E. 1063 de 19 de mayo de 2020.</p> <p>2. La presente ficha denominada "K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud" fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica conforme con lo señalado en el memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME de 02 de septiembre de 2022; en virtud de lo cual, no hay registros de valores devengados de años previos. (Anexo 1)</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. Kiura Ninoska Santamaría Loor., Subsecretaria de Obras Públicas, designó al Arq. Hugo Xavier Vaca Aguirre, Analista de Transporte Terrestre 2, como Líder del proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud. (Anexo 2)</p> <p>4. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF de 09 de septiembre de 2022, el SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos a favor del favor del proyecto: "INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD " con CUP 123200000.632.2477, por un monto de 11.642.607,81 USD (HITO 4)</p> <p>5. El contrato Nro. SECOB-036-2017,, que pertenece al proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud que corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE DURAN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, suscribió el Acta de Recepción Provisional el 09 de septiembre de 2022. (Anexo 3)</p> <p>6. A través del memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1286-ME de 21 de septiembre de 2022, Ing. Kiura Ninoska Santamaría Loor, Subsecretaria de Obras Públicas, solicitó al Sr. Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja en calidad de Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, se realice la capacitación en el uso del sistema GPR a los nuevos líderes de proyecto, señalando lo siguiente: "se realiza una insistencia para que se realice la capacitación pertinente y oportuna, así como, el acompañamiento en el manejo de la herramienta de Gobierno por Resultados - GPR para el correcto registro de información"; así mismo, se solicitó que se entregue el Dictamen de Prioridad emitido por la Secretaría Nacional de Planificación, el documento del Proyecto, la Cédula Presupuestaria y la Matriz de Marco Lógico por cada proyecto de inversión asignado; sin embargo, en el presente periodo sólo se proporcionó las cédulas presupuestarias. (Anexo 4)</p> <p>7. La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica realizó la capacitación a los líderes de proyecto el 22 de septiembre de 2022 , en la cual se emitieron algunos lineamientos bajo los cuales se procedió a completar la información en la presente ficha denominada "K113 MTOP - Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud". (Anexo 5)</p> | <p>Vaca Aguirre, Hugo Xavier</p> | <p>04/10/2022 - 09:09 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| 8. Mediante Memorando Nro. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME de 26 de septiembre de 2022, el Arq. Juan Carlos Prado Leverone como DIRECTOR NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS solicitó la información técnica, correspondiente al proyecto de inversión Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información que permita registrar el avance real del proyecto de inversión y registrarlo mediante los hitos, los mismos que podrían variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas. HITO 5. | | |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Recursos económicos insuficientes asignados al MTOP para el proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud. | 28/09/2022 | Hugo Xavier Vaca Aguirre | 10 | 30 | 3 | 0/1 |
| No se cuenta con Actas de Recepción Definitiva suscritas. | 24/10/2022 | Hugo Xavier Vaca Aguirre | 10 | 10 | 1 | 0/1 |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2- NACIONAL. Económico. Limitada asignación de recursos por parte de las Entidades Requirientes CAUSARÍA el retraso en los procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública. | 24/10/2022 | Juan Carlos Prado Leverone | 10 % | 10 | 1 | 1/3 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|----|--|
| 1 | Zona 1 - Norte > Carchi > Montufar |
| 2 | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas |
| 3 | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio |
| 4 | Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi |
| 5 | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana |
| 6 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito |
| 7 | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha |
| 8 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta |
| 9 | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi |
| 10 | Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua |
| 11 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone |
| 12 | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha |
| 13 | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > La Concordia |
| 14 | Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal |
| 15 | Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago |
| 16 | Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Convenio Interinstitucional suscrito | 1-Solicitud de Información | 01/01/2012 | | 01/01/2012 | | Sí | 10.0 |
| 2 | PLANEACIÓN: Recursos Presupuestarios asignados | 1-Solicitud de Información | 01/01/2012 | | 28/02/2022 | | Sí | 5.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito. | 4-Inicio de Trabajo | 24/05/2017 | | 24/05/2017 | | Sí | 20.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Modificación presupuestaria de transferencia de recursos solicitado 2022 (Dictamen Favorable) | 1-Solicitud de Información | 09/09/2022 | | 09/09/2022 | | Sí | 5.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada. | 5-Entregables Intermedios | 26/09/2022 | | 26/09/2022 | | Sí | 15.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Contratos de Obra Suscritos. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022 | | 31/10/2022 | | Sí | 10.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Recopilación de información realizada. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022 | | 31/10/2022 | | Sí | 15.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Contratos de Estudios Suscritos | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022 | 30/11/2022 | | | No | 5.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Contratos de Fiscalización Suscritos | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022 | 30/11/2022 | | | No | 5.0 |
| 10 | CIERRE: Actas de entrega recepción provisional de los contratos de obra suscritas. | 5-Entregables Intermedios | 02/01/2023 | 02/01/2023 | | | No | 2.0 |
| 11 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva de los contratos de obra, fiscalización y estudios suscritas. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | No | 4.0 |
| 12 | CIERRE: Terminaciones anticipadas unilaterales y de mutuo acuerdo suscritas | 5-Entregables Intermedios | 01/01/2024 | 01/01/2024 | | | No | 2.0 |
| 13 | CIERRE: Informe de Cierre del Proyecto de inversión suscrito. | Z - Compromiso Ministerial | 31/08/2025 | 31/08/2025 | | | No | 2.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de actas de entrega - recepción de obras públicas co-ejecutadas a nivel nacional conforme la normativa legal vigente. | | - | - | - | 01/10/2022 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 20,198,568.31 ** |
| Costo Total: | 20,198,568.31 |
| Total Devengado: | 3,834,305.44 |
| % Costo Total Devengado: | 18.98 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 18.98 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 20,198,568.31 | 0.00 | 20,198,568.31 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 20,198,568.31 | 0.00 | 20,198,568.31 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 20,198,568.31 | 0.00 | 20,198,568.31 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 1,313,975.75 | 0.00 | 1,313,975.75 |
| Planeado - Codificado (2022) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 0.00 | 20,198,568.31 | 0.00 | 20,198,568.31 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 3,834,305.44 | 0.00 | 3,834,305.44 |
| Pagado Real | 0.00 | 1,537,955.58 | 0.00 | 1,537,955.58 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 4,355,826.03 | 0.00 | 4,355,826.03 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00 | 15,842,742.28 | 0.00 | 15,842,742.28 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 18.98 % | 0.00 % | 18.98 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 1,368,106.29 | 0.00 | 1,368,106.29 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 1,368,106.29 | 0.00 | 1,368,106.29 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jul | 853,950.02 | 1,558,918.19 | 853,950.02 | 1,558,918.19 | 182.55 % | | 7.72 % |
| Ago | 2,359,655.16 | 1,333,797.63 | 3,213,605.18 | 2,892,715.82 | 90.01 % | | 14.32 % |
| Sep | 1,429,875.92 | 941,589.62 | 4,643,481.10 | 3,834,305.44 | 82.57 % | | 18.98 % |
| Oct | 4,431,920.38 | | 9,075,401.48 | | | | |
| Nov | 9,973,644.44 | | 19,049,045.92 | | | | |
| Dic | 1,149,522.39 | | 20,198,568.31 | | | | |
| Total | 20,198,568.31 | 3,834,305.44 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|--|
| 1 | Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | A.1 HITO 1. Convenio Interinstitucional entre ICO - MSP. Suscrito. | convenio_interinstitucional_ico_ministerio_de_salud.pdf | 08/09/2022 |
| 2 | A.2 HITO 2. Recursos Presupuestarios asignados | MTOP-SOP-2022-0176-EXT_asignación_de_recursos_del_msp.pdf | 08/09/2022 |
| 3 | A.3 HITO 3. Contrato No. RE-SECOB-036-2017, suscrito. | CONTRATO_N_RE-SECOB-036-2017-1.pdf | 08/09/2022 |
| 4 | A.4 Anexo 1. CREACIÓN DE FICHA GPR. Memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1040-ME | mtop-cgpge-2022-1040-me.pdf | 28/09/2022 |
| 5 | A.5 Anexo 2. Designación de Líder del Proyecto. Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME | MTOP-SOP-2022-1211-ME.pdf | 08/09/2022 |
| 6 | A.6 HITO 4. Dictamen favorable a la modificación presupuestaria de transferencia de recursos | 4_SNP-SGP-SPN-2022-1215-OF.pdf | 28/09/2022 |
| 7 | A.7 Anexo 3. Acta de Recepción Provisional CONTRATO N. RE-SECOB-036-2017 | 2_Anexo_3.-_ACTA_PROVISIONAL_DURAN-_ULTIMA-signed-signed-signed.pdf | 28/09/2022 |
| 8 | A.8 Anexo 4. Capacitación GPR | MTOP-SOP-2022-1286-ME.pdf | 28/09/2022 |
| 9 | A.9 Anexo 5. Capacitación | Acta_de_asistencia_a_la_capacitación.pdf | 28/09/2022 |
| 10 | B.1 HITO 5. Solicitud de Información. MTOP-DNPOP-2022-0592-ME | 3_MTOP-DNPOP-2022-0592-ME.pdf | 28/09/2022 |
| 11 | B.2 Anexo 6. Ficha del Proyecto SENPLADES | Ficha_Proyecto-123200000.632.2477_(1).pdf | 28/09/2022 |
| 12 | B.3 HITO 6. Contratos De Obra Firmado | CONTRATOS_DE_OBRA-signed-signed.pdf | 01/11/2022 |
| 13 | B.4 Anexo 7. Memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1361-ME | 7_MTOP-SOP-2022-1361-ME.pdf | 01/11/2022 |
| 14 | B.5 Anexo 8. Ficha del PROYECTO MSP - PIFMEFS 2022 | 8_Ficha_Proyecto_actual_2022.pdf | 01/11/2022 |
| 15 | B.6 HITO 7. Recopilación de información realizado | INFORME_Infraestructura_Fisica_Equipamiento_Mantenimiento signed.pdf | 01/11/2022 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 16 | B.7 Anexo 9. Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1965-ME | MTOP-DDT-2022-1965-ME.pdf | 01/11/2022 |
| 17 | B.8 Anexo 10. Memorando Nro. MTOP-DDT-2022-1993-ME | MTOP-DDT-2022-1993-ME.pdf | 01/11/2022 |
| 18 | B.9 Anexo 11. Oficio Nro. MTOP-CGPGE-22-261-OF | 11._MTOP-CGPGE-22-261-OF.pdf | 01/11/2022 |
| 19 | C.1 Anexo 12. Oficio Nro. MSP-SGOLS-2022-0211-O | Oficio_Nro._MSP-SGOLS-2022-0211-O.pdf | 01/11/2022 |
| 20 | C.2 Anexo 13. Oficio Nro. MSP-PRIEHSSSTNAS-2022-0087-O | 12._Oficio_Nro._MSP-PRIEHSSSTNAS-2022-0087-O.pdf | 01/11/2022 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------|
| Prado Leverone, Juan Carlos | Titular | Director Nacional de Producción de Obras Públicas | jprado@mtop.gob.ec | |
| Santamaría Loor, Kiura Ninoska | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretaria de Obras Públicas | ksantamaria@mtop.gob.ec | |
| Vaca Aguirre, Hugo Xavier | Lider de Proyecto | Analista de Transporte Terrestre 2 | hvaca@mtop.gob.ec | |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 150609_1.jpg | 08/09/2022 |
