

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas
Dirección Nacional de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad de Delegaciones
PROYECTO: K003 MTOP - Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación

Líder del Proyecto:	Garzón Guamán, Ana Lourdes (agarzon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cañizares Jaramillo, Ana Katherin	Programas Relacionados:	
Titular:	Marin Bravo, Maria Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.382584	TIR:	12.49 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	60,659,421.38
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	167,096,950.74
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	01/12/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Garzón Guamán, Ana Lourdes	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2022

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto Gestión y Operación de corredores de la red vial estatal está formado por el componente: CONTRATOS DE CONCESIÓN Y CONVENIOS DE DELEGACIÓN VIGENTES; constituido por las siguientes actividades:

Componente 1:

1. Ambato- Riobamba (Concesión)
2. Paso Lateral de Ibarra
3. Supervisión Rumichaca - Riobamba
4. Supervisión Panavial Estudios y Diseño de Proyectos
5. Río Siete - Huaquillas (Concesión)
6. Aforo de tráfico
7. Convenio Pichincha (Alóag- Santo Domingo) (Delegación)
8. Convenio Guayas (Naranjal - Km 26)
9. Valor Pagado sin IVA Río Siete - Huaquillas
10. IVA Pendiente

Componente 2

1. Naranjal- Tenguel

PRODUCTO / SERVICIO: El TPDA que circula por los corredores delegados y concesionados constituye la población objetivo del proyecto, el detalle se presenta en la siguiente tabla en la que se ha aplicado una tasa de crecimiento del 3% anual, para los años 2020 y 2021.

LÍNEA BASE: La infraestructura vial de transporte, la constituye la Red Vial Estatal (RVE) que tiene una longitud de 10.132,74 km, divididos en 5.773,74 km de vías arteriales; y, 4.359 km de vías colectoras, de éstos 730,35 km se encuentran administrados bajo la modalidad de delegación con participación de la empresa privada; y, 913,50 km a través de los gobiernos seccionales; total 1.643,85 km de vía administrados bajo régimen de delegación. 8488,89 se encuentran bajo administración directa del MTOP.

OBJETIVO GENERAL:

Impulsar el desarrollo de los corredores concesionados y delegados a través de la ejecución de obras nuevas de infraestructura como soluciones viales y ampliaciones para mejorar la capacidad vial y atender la demanda de tráfico existente y proyectado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Mejorar los niveles de servicio de la Red Vial Estatal a través de los Contratos de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes que permitan trasladar en menores tiempos y en mejores condiciones la producción de Costa y Sierra, incorporar cadenas productivas para lograr el cambio de la matriz productiva.

Mejorar los niveles de servicio a través de ampliación vial a 4 carriles del tramo Naranjal - Tenguel.

Beneficios Cualitativos

Aportar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, por intermedio de las asociaciones público- privadas.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos: (2019) 242.804; (2020) 250.088; (2021) 257.580.
Corresponde a los vehículos que circulan en las vías componentes de este proyecto.

Beneficiarios indirectos: (2019) 1.459.325,24; (2020) 1.503.105,00; (2021) 1.548.198,15
Corresponde a los vehículos que circulan por las vías componentes de este proyecto.

Restricciones

TIEMPO: 4 años

COSTO: \$ 132.878.762,83 (Dictamen de prioridad) 2019 - 2021). Sin embargo el proyecto contó con asignación presupuestaria a partir del año 2018, en ese sentido el monto es \$229.110.007,00, tanto este monto, como el periodo 2018 - 2021, constan en la documentación ingresada en el sistema SIPeIP, para obtener el dictamen de prioridad.

CALIDAD: El incumplimiento a cabalidad de los compromisos por parte de las empresas concesionarias limitarían el contar con vías en óptimas condiciones así como con niveles adecuados de servicios.

RECURSOS: fiscales: asignaciones presupuestarias oportunas por parte del MEF; humanos: personal de la Subsecretaría de Delegaciones de planta y personal de supervisión; tecnológico (modelos económicos para determinar el equilibrio económico y financiero que garanticen la sostenibilidad de los tramos concesionados y que orientan la toma de decisiones para la concesión de los tramos de la RVE.


RIESGOS: Limitaciones presupuestarias o las demoras en pagos para los contratos de concesiones por parte del MEF ponen en riesgo la operación de los tramos delegados o concesionados.

ALCANCE: Contempla la delegación y concesión de tramos de la RVE que cuentan con contratos suscritos y con procesos ya avanzados de licitaciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.30 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

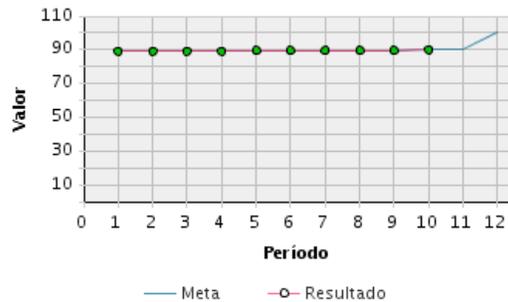

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %		
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2022	Garzón Guamán, Ana Lourdes	01/11/2022 - 03:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ASOCIACIÓN HITO 67. Se presenta informe sobre propuesta de modificaciones presupuestarias del proyecto, orientadas a cumplir con parte de los pagos pendientes.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 68. Se presenta informe de supervisión, relacionado con temas de índole financiero.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 65. Se presenta informe de supervisores donde se consta informe sobre deudas del IVA con la empresa concesionaria Panavial, en donde consta información sobre el Contrato adicional al de la concesión para la ejecución de la ampliación de varios sectores del tramo Ambato - Riobamba.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 66. Se presenta informe sobre el contrato adicional para la ampliación de la carretera Ambato - Riobamba, en el tramo Tuntacto - Urbina, informe relacionado con la planilla Nro. 12 (final).</p>	Garzón Guamán, Ana Lourdes	05/10/2022 - 08:12 PM
<p>AGOSTO 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 63. Se presenta documento mediante el cual se comunica al Municipio de Guano, sobre la conclusión del Tramo Tuntantacto - Urbina, solicitando se tome medidas para cuidar el derecho de vía.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 64. Se presenta informe de fiscalización del tramo Naranjal - Tenguel, que da cuenta de los avances de las obras.</p>	Garzón Guamán, Ana Lourdes	05/09/2022 - 11:01 AM
<p>JULIO 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 61. Se presenta informe sobre las obligaciones pendientes a la empresa Concesionaria CONSUR. Correspondiente al Corredor Vial Río 7 - Huaquillas.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 62. Debido a que el equipo de supervisión fue contratado desde mayo de 2022, y en el mes de junio se produjo el paro nacional, por lo que no fue posible realizar la supervisión, se presenta cronograma de visitas.</p>	Garzón Guamán, Ana Lourdes	05/08/2022 - 05:06 PM
<p>JUNIO 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 60 Se presenta documento para realizar gestiones para incremento presupuestario para el proyecto</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 59 Se presenta documento de análisis de deudas pendientes.</p> <p>MAYO 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 58. Se presenta informe sobre la revisión deudas pendientes de IVA en relación contratos con PANAVIAL</p> <p>ABRIL 2022 En la documentación de respaldo en este mes se añade la cédula presupuestaria, no se incluyó en los meses anteriores debido a que no estaba operativo, en razón que el organismo y correlativo constaban como "No identificado".</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 57. Se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera la contratación de personal para la conformación del equipo de supervisión del tramo delegado Rumichaca - Riobamba</p> <p>MARZO 2022</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 56. Se presenta requerimiento al señor Viceministro para que autorice a la Coordinación General de Planificación, para efectuar modificaciones presupuestarias, que tiene por objeto orientar los recursos del proyecto para cancelar compromisos pendientes.</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 55. Se cuenta con la autorización por parte de la SNP, para gastos excepcionados.</p> <p>FEBRERO 2022</p>	Garzón Guamán, Ana Lourdes	05/07/2022 - 02:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ASOCIACIÓN HITO 54. Por parte del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, se remite documento a la Secretaría Nacional de Planificación, solicitando autorización para gastos excepcionados, con el objeto de contratar al equipo de supervisión del tramo concesionado Rumichaca - Riobamba.</p> <p>ENERO 2022 ASOCIACIÓN HITO 53. Se presenta a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica el POA del proeycto del año 2022.</p>		
<p>DICIEMBRE 2021</p> <p>Por parte de la SDSTOP estaba previsto solicitar la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, orientado a completar las obras previstas y cumplir con los pagos por disponibilidad : corredor Ambato - Riobamba, Paso Lateral de Ibarra, Corredor Rio Siete - Huaquillas, Corredor Naranjal - Tenguel. Sin embargo, la Secretaría Nacional de Planificación, mediante el Oficio SNP - SPN - 2021 - 1198 - OF de 22 de diciembre de 2021, emite dictamen de arrastre para el proyecto "GESTIÓN Y OPERACIÓN DE CORREDORES DE LA RED VIAL ESTATAL A TRAVÉS DE DELEGACIÓN" con CUP 175200000.0000.382584, el cual está considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022 por un monto de USD 1.188.030,52.</p> <p>En ese contexto, mediante Memorando Nro. MTOP - SDSTOP - 2023 - 18 - ME de 10 de enero de 2021, la Subsecretaría de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas, solicitó la congelación del proyecto de inversión.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	11/01/2022 - 02:21 PM
<p>ASOCIADO "HITO 50" ASOCIACIÓN "HITO 51" NOVIEMBRE 2021</p> <p>1. Ejecución Documento y anexos para la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación, elaborados.</p> <p>2. Ejecución Informe de supervisión aprobado.</p> <p>RESUMEN</p> <p>Se preparó y presentó a la Coordinación General de Planificación, informe justificativo para la actualización del dictamen de prioridad, a fin realice gestiones ante las entidades correspondientes para que autoricen dicha actualización del dictamen de prioridad.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	04/12/2021 - 08:22 PM
<p>ASOCIADO "HITO 48" ASOCIACIÓN "HITO 49" OCTUBRE 2021</p> <p>1. Ejecución Documentos para la postulación del PAI 2022 del Proyecto Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación, elaborados.</p> <p>2. Ejecución Informe de supervisión aprobado.</p> <p>RESUMEN</p> <p>Considerando la necesidad de que el proyecto debe continuar en el año 2022, se trata de asegurar los recursos y se presentó la documentación para postular para el PAI 2022.</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/11/2021 - 10:58 AM
<p>ASOCIADO "HITO 45"</p> <p>SEPTIEMBRE 2021 (Rectificación del mes)</p> <p>1. Ejecución Informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad elaborado.</p> <p>ASOCIACIÓN "HITO 47" Reajuste del Plan Operativo Anual 2021 proyecto 382584.</p> <p>RESUMEN</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	07/10/2021 - 08:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Debido a estar próxima a concluir la fecha del dictamen de prioridad del proyecto, se preparó la documentación para contar con el dictamen de prioridad., y se ha elaborado el informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad del proyecto. Además, se elaboró el formulario para el reajuste del Plan Operativo 2021.</p> <p>AJUSTES, para dar cumplimiento a la normativa GPR, relacionada con contar con dos hitos por mes, en ese sentido se ingresaron los respaldos de los hitos:</p> <p>ASOCIACIÓN "HITO 39" Plan Operativo Anual del Proyecto, elaborado (Inclusión Hito 1 diciembre 2020) ASOCIACIÓN "HITO 40" Informe de supervisión aprobado (inclusión hito 2 diciembre 2020) ASOCIACIÓN "HITO 41" Informe de supervisión aprobado (Inclusión Hito 2 julio 2021) ASOCIACIÓN "HITO 42" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 junio 2021) ASOCIACIÓN "HITO 43" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 mayo 2021) ASOCIACIÓN "HITO 44" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 agosto 2021) ASOCIACIÓN "HITO 46" Informe evaluación POA, PAI, I Semestre 2021 . (Inclusión Hito 1 agosto 2021)</p>		
<p>ASOCIADO "HITO 45"</p> <p>AGOSTO 2021 1. Ejecución Informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad elaborado.</p> <p>ASOCIACIÓN "HITO 47" Reajuste del Plan Operativo Anual 2021 proyecto 382584.</p> <p>RESUMEN Debido a estar próxima a concluir la fecha del dictamen de prioridad del proyecto, se preparó la documentación para contar con el dictamen de prioridad., y se ha elaborado el informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad del proyecto. Además, se elaboró el formulario para el reajuste del Plan Operativo 2021.</p> <p>AJUSTES, para dar cumplimiento a la normativa GPR, relacionada con contar con dos hitos por mes, en ese sentido se ingresaron los respaldos de los hitos:</p> <p>ASOCIACIÓN "HITO 39" Plan Operativo Anual del Proyecto, elaborado (Inclusión Hito 1 diciembre 2020) ASOCIACIÓN "HITO 40" Informe de supervisión aprobado (inclusión hito 2 diciembre 2020) ASOCIACIÓN "HITO 41" Informe de supervisión aprobado (Inclusión Hito 2 julio 2021) ASOCIACIÓN "HITO 42" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 junio 2021) ASOCIACIÓN "HITO 43" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 mayo 2021) ASOCIACIÓN "HITO 44" Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 agosto 2021) ASOCIACIÓN "HITO 46" Informe evaluación POA, PAI, I Semestre 2021 . (Inclusión Hito 1 agosto 2021)</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>05/10/2021 - 04:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ASOCIADO "HITO 38"</p> <p>AGOSTO 2021</p> <p>1. Ejecución</p> <p>1.1 Se cuenta como insumo para el proceso del Concurso Público, el Acta de la Subcomisión de profesionales, encargado del análisis del proceso Concurso Público Internacional No. 002-BFBJ-MTOP: "Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, ampliación a 4 carriles, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial Buena Fe - Babahoyo - Juján", suscrita el 30 de julio de 2021, en la consta como conclusión:</p> <p>"Una vez evaluada la propuesta técnica y económica financiera presentada por el oferente SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., esta Subcomisión de apoyo encargada de revisar y evaluar la oferta presentada, recomienda a la Comisión Técnica que, en virtud de que el oferente habilitado para esta evaluación alcanzó un puntaje de 100 (cien); sea considerado para la siguiente fase del procedimiento de concurso público, es decir para la negociación".</p>	Freire Alban, Esteban Andres	03/09/2021 - 11:02 AM
<p>ASOCIADO "HITO 37"</p> <p>JULIO 2021</p> <p>1. Ejecución</p> <p>1.1 El 1 de julio de 2021, se suscribe el Acta Nro. 16 de la Comisión Técnica del Proceso: Concurso Público Internacional Nro. 002-2020-BFBJ-MTOP. "Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial Buena Fe - Babahoyo - Jujan.</p> <p>1.2 Se hace revisión integral del proceso ejecutado dentro del Concurso arriba citado.</p> <p>1.3 En el acta se dice: "El cronograma del proceso tiene un desfase en las fechas para el proceso de negociación con la empresa SUDINCO que ha sido calificada para continuar con la siguiente etapa.</p> <p>JUNIO 2021</p> <p>Se lleva adelante el proceso para el Concurso Público Internacional Nro. 002-2020-BFBJ-MTOP. "Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial Buena Fe - Babahoyo - Jujan.</p>	Freire Alban, Esteban Andres	04/08/2021 - 10:38 AM
<p>MAYO 2021:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 36"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Acta de Negociación del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito.</p> <p>1.1. En lo que respecta a la Fase de Negociación, resuelve por unanimidad recomendar al Ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado la adjudicación del Concurso Público Internacional Nro. 0001-2020-CAB-MTOP que tiene por objeto delegar al sector privado el "DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CORREDOR CUMBE -- CUENCA (ACCESO SUR A CUENCA) - AZOGUES - BIBLIAN", al Oferente Hidalgo e Hidalgo S.A.,</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	03/06/2021 - 02:42 PM
<p>ABRIL 2021:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 34"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) suscrito</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre de Presentación de Ofertas 2. Apertura de Ofertas 3. Cambio de Integrante Subcomisión 4. Solicitud Convalidación 5. Apertura Convalidación 6. Habilitación de Ofertas 7. Evaluación y calificación de Oferta habilitada <p>ASOCIADO: "HITO 35"</p> <p>2. EJECUCIÓN: Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre de presentación de oferta 2. Audiencia de Apertura de Oferta 3. Acta Nro. 009 Calificación de Oferta 	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	03/05/2021 - 10:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 32"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado</p> <p>1. En virtud de las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, y los informes de viabilidad técnica y económica; en donde se evaluaron las perspectivas económicas, sociales, operativas, financieras y técnicas, determinado la viabilidad del proyecto de iniciativa pública para el " DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL E-25 QUEVEDO BABAHOYO -JUJAN DE 143,98 KM DE LONGITUD</p> <p>2. Plantea ejecutar las competencias relacionadas con la inversión y mantenimiento de la red vial estatal, se inserta en la estrategia del Gobierno detener un sector público eficiente que cumpla las actividades que son inherentes y naturales a sus responsabilidades, así como impulsar y consolidar el desarrollo económico con la participación y compromiso del sector privado en la construcción de la infraestructura y prestación de servicios públicos.</p> <p>ASOCIADO: "HITO 33"</p> <p>2. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado</p> <p>1. El objetivo de este informe es analizar la viabilidad legal del proyecto "DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CORREDOR CUMBE - CUENCA (ACCESO SUR A CUENCA) - AZOGUES - BIBLIÁN", para delegar al sector privado, bajo la modalidad de concesión, durante el plazo de 30 años (4 años etapa constructiva y 26 años etapa de explotación).</p> <p>2. Mejorar el nivel de servicio de la red vial nacional y la conectividad entre las ciudades de Cuenca, Azogues y Biblián, incluyendo el nuevo acceso sur desde Cumbe, así como la implementación de distribuidores de tráfico, mantenimiento vial y operación de la carretera con la prestación de servicios complementarios</p> <p>3. Como resultado del análisis legal realizado al proyecto de iniciativa pública "Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento Vial del Corredor Cumbe - Cuenca (Acceso Sur a Cuenca) - Azogues - Biblián". Se puede establecer que el proyecto se enmarca en lo determinado en la normativa legal vigente; así como también cumple con los principios y lineamientos de los proyectos públicos bajo la modalidad de concesión, por lo tanto, esta Coordinación General de Asesoría Jurídica emite la correspondiente viabilidad legal.</p> <p>ASOCIADO: INFORME 1er. TRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO DE METAS periodo Enero - Marzo 2021</p> <p>INDICADOR: PND-5.07-Porcentaje de kilómetros de la RVE delegados con modelos de gestión sostenibles</p> <p>1. kilómetros de la red vial estatal: 10.258.79 km. 2. kilómetros de la red vial estatal delegados al sector privado: 1.759.22 km. 3. Porcentaje alcanzado: 17,15%</p> <p>ASOCIADO: INFORME 1er. TRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO DE METAS periodo Enero - Marzo 2021</p> <p>INDICADOR: Porcentaje de iniciativas de interés público y privado para proyectos APP analizados</p> <p>1. Iniciativas de proyectos realizado y proyectos propuestos</p>	<p>Ayala Rodriguez, Alvaro Luis</p>	<p>22/04/2021 - 09:55 AM</p>
<p>FEBRERO 2021:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 30"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/Financiera del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado</p> <p>1. La Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones de Transporte, procesó, analizó y evaluó la información contenida en el Informe de Evaluación Técnica.</p> <p>2. Inversión: El proyecto identifica un gasto de capital (CAPEX) de USD. 262,23 MM y OPEX USD. 420,61 MM en valores constantes.</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>26/03/2021 - 09:04 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. El proyecto no contempla ningún tipo de compromiso del Estado bajo la figura de PPD (Pago por Disponibilidad en la etapa de explotación),</p> <p>ASOCIADO: "HITO 31"</p> <p>2. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/Financiera del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado.</p> <p>1. La Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones de Transporte, procesó, analizó y evaluó la información contenida en el Informe de Evaluación Técnica, que fue realizado sobre la base de los insumos provistos por la Subsecretaría zonal 6 (Estudio U Cuenca EP) y Dirección de Estudios del Transporte del MTOP.</p> <p>2. Inversión: El proyecto identifica un gasto de capital (CAPEX) de USD. 241,92 MM y OPEX USD. 265,73 MM</p> <p>3. El MTOP, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la inversión pública que se ejecutaría con la construcción de los 4 intercambiadores en el corredor vial, ha incorporado en el presupuesto de mantenimiento periódico y rutinario del presente proyecto</p>		
<p>FEBRERO 2021:</p> <p>ASOCIADO: "Cédula presupuestaria"</p> <p>1. Cédula presupuestaria mes de febrero 2021, registrada</p> <p>ASOCIADO: "HITO 30"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/Financiera del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado</p> <p>ASOCIADO: "HITO 31"</p> <p>2. EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/Financiera del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado.</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/03/2021 - 09:27 AM
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>ASOCIADO: "Indicador: (10.6 Porcentaje de iniciativas de origen público y privado para proyectos de delegación al sector privado (Infraestructura y gestión del transporte)."</p> <p>1. Periodo INFORME IV TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</p> <p>ASOCIADO: "Indicador: (10.7 PND-5.07- Porcentaje de kilómetros de la RVE delegados con modelos de gestión sostenibles)"</p> <p>1. Periodo INFORME IV TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2020</p> <p>ASOCIADO: "Dictamen de prioridad"</p> <p>1. Dictamen de prioridad proyectos Concesiones 2020</p> <p>ASOCIADO: "HITO 11" Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag Santo Domingo) suscrito,</p> <p>1. MTOP-SDCT-2019-365-ME-LIQUIDACION_CERTIFICACIÓN_PRESUPUEST__TUNEL_BOMBOLÍ.pdf</p>	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	06/01/2021 - 08:32 AM
<p>NOMVIEMBRE 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 27"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Concurso público del proyecto (Naranjal-Tenguel)</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1. Cédula presupuestaria mes de noviembre 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 36,052.95</p> <p>ASOCIADO: "DOCUMENTOS DE SOPORTE" PLAN DE ACCIONES 2020 PND-5.07- Porcentaje de kilómetros de la RVE delegados con modelos de gestión sostenibles</p> <p>1. Reestructurar Proyectos viales declarados desiertos: Buena Fe- Babahoyo - Jujan Y Loja - Catamayo</p> <p>2. Con crédito CAF se prevé la contratación de estudios de ingeniería básica para obtener información y poder estructurar la viabilidad de delegación al sector privado (proceso a cargo de la Dirección de Estudios SIT)</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	02/12/2020 - 09:36 AM
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 26"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Resolución de inicio del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrita</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	04/11/2020 - 12:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de octubre 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 27,083.09</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 25"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Modelo de contrato y anexos del proyecto (Naranjal-Tenguel), emisión de pliegos elaborado</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de septiembre 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 57,071.02</p> <p>ASOCIADO: "MAPA DE RIESGOS"</p> <p>1. Riesgo 3: Realizar el seguimiento a la estructuración de los proyectos de iniciativa pública y privada (informe evaluación técnico, económico y jurídico)</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/10/2020 - 10:13 AM
<p>AGOSTO 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 24"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de agosto 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 8,988,523.86</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/09/2020 - 11:01 AM
<p>JULIO 2020:</p> <p>ASOCIADO: "HITO 23"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de julio 2020</p> <p>2. Monto devengado \$ 85,546.43</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/08/2020 - 02:55 PM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>ASOCIADO: "A LA ACCIÓN 3 Y 4 DEL PLAN DE ACCIÓN DE ABRIL A JUNIO 2020 DEL INDICADOR 14.1 PND-5.07-% DE KM DE LA RVE DELEGADOS CON MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE"</p> <p>1. Acción 3: Contratar con financiamiento CAF los estudios de ingeniería básica para obtener información y poder estructurar la viabilidad de delegación al sector privado (sujeto a disponibilidad de recursos CAF)</p> <p>2. Acción 2: Reestructurar Proyectos viales declarados desiertos</p> <p>ASOCIADO: "HITO 22"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado</p> <p>ASOCIADO: "PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de junio 2020</p> <p>ASOCIADO: "OBJETIVOS OPERATIVOS"</p> <p>1. 14.3 Porcentaje de iniciativas de origen público y privado para proyectos de delegación al sector privado (Infraestructura y gestión del transporte). "INFORME II TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020"</p> <p>2. 14.4PND-5.07-Porcentaje de kilómetros de la RVE delegados con modelos de gestión sostenibles "INFORME II TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020"</p> <p>3. Resolución Nro. 057-2020 Buena Fe - Babahoyo Jujan</p> <p>ASOCIADO: "INDICADOR"</p> <p>1. Porcentaje de componentes ejecutados: INFORME I SEMESTRE PERIODO ENERO-JUNIO 2020</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	07/07/2020 - 10:14 AM
<p>MAYO 2020:</p> <p>"ASOCIADO A LA ACCIÓN 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCIÓN DE ENERO A MARZO 2020 DEL INDICADOR 14.1 PND-5.07-% DE KM DE LA RVE DELEGADOS CON MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE"</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	10/06/2020 - 08:11 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Acción 1: Proponer reformas al marco jurídico de delegaciones a fin de obtener procesos abreviados.</p> <p>2. Acción 2: Ejecutar por administración directa los estudios de aforos en las vías para tener un TPDA actualizado de los principales corredores a ser delegados al sector privado.</p> <p>"ASOCIADO AL HITO 21"</p> <p>1. EJECUCIÓN: Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado</p> <p>"ASOCIADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN"</p> <p>1.Cédula presupuestaria mes de mayo 2020</p>		
<p>ABRIL 2020: "ASOCIADO AL HITO 20"</p> <p>1. Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva del Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado</p> <p>2. Control y reporte de la cédula presupuestaria correspondiente al mes de abril 2020 CUP: 382584</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/05/2020 - 09:23 AM
<p>MARZO 2020:</p> <p>1. Se realizo el seguimiento conforme consta en la cédula presupuestaria del mes de marzo del 2020 registrado en el Proyecto de Inversión</p> <p>2. Con Memorando Nro. MTOP-DF-2020-302-ME 27 de marzo de 2020 el director financiero informo a los Viceministros del MTOP la disminución de asignaciones presupuestarias para proyectos de inversión (AJUSTE AL PAI 2020 DE CONFORMIDAD AL ART. 74 DEL COPLAFIP) mediante el cual a este proyecto se le disminuyen 9,994,979.31 millones</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/04/2020 - 11:44 AM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>Reprogramación del POA 2020, en el proyecto: gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación - contrato de concesión rehabilitación, ampliación explotación y administración de carreteras-dentro del corredor Rumichaca - Riobamba</p> <p>ENERO 2020:</p> <p>Matriz de programación del POA 2020 se la ejecuta en base a una proporcionare entre items del proyecto. La programación del POA 2020 de acuerdo al dictamen de prioridad del proyecto gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de delegación</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	06/03/2020 - 07:49 AM
<p>DICIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 13 Y 14"</p> <p>-Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito</p> <p>-Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	07/01/2020 - 08:19 AM
<p>NOVIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 12"</p> <p>Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	10/12/2019 - 09:31 AM
<p>OCTUBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 11"</p> <p>Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Río Siete - Huaquillas, Aporte Pago por Disponibilidad) legalizado y se ha adjuntado la documentación de la cédula presupuestaria del mes de octubre 2019</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/11/2019 - 04:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019: "ASOCIADO AL HITO 11"</p> <p>Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva al Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo), suscrito</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/10/2019 - 12:00 PM
<p>AGOSTO 2019: "ASOCIADO AL HITO 10"</p> <p>Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva para la transferencia de recursos al GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo conforme se respalda en los archivos adjuntos</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	02/09/2019 - 09:50 AM
<p>JULIO 2019: "ASOCIADO AL HITO 10"</p> <p>Se ha procedido a ejecutar con la documentación respectiva para la transferencia de recursos al GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo conforme se respalda en los archivos adjuntos</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	01/08/2019 - 09:26 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>A la fecha, este proyecto no cuenta con el dictamen de prioridad emitido por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (ex SENPLADES). Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-405-OF, el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, de conformidad a las directrices</p>	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/07/2019 - 12:19 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>emitidas por la SENPLADES, envió las fichas técnicas de evaluación y el sustento legal, técnico y financiero previo a la obtención del dictamen de prioridad. Así mismo, con Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-191-ME , el titular de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte gestionó ante el señor Ministro del MTOP el incremento al techo presupuestario del proyecto para ser reprogramado a la actividad "Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del corredor vial Naranjal Tenguel".</p>		
<p>JUNIO 2019 "HITO ASOCIADO 9" Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito, Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, representado por el Ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro, quien comparece a través de su delegado el Doctor Ángel Laja Llanos, Viceministro de Gestión de Transporte, Encargado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por otra, la compañía PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL, legalmente representada por su Gerente General, el ingeniero Gonzalo Martínez Herdoíza, a quien en adelante y para efectos de este Contrato, se denominará, "LA CONCESIONARIA" o "EL CONCESIONARIO". Los nombramientos que acreditan la condición en la que comparecen.</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>02/07/2019 - 08:52 AM</p>
<p>MAYO 2019: Este proyecto se encuentra en proceso de obtener el Dictamen de Prioridad que lo emite "Planifica Ecuador", (ex SENPLADES), como parte fundamental de la documentación que evalúa la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, a fin de emitir el aval respectivo</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>05/06/2019 - 10:00 AM</p>
<p>ABRIL 2019: Conforme corresponde al mes de abril se adjunta cédulas presupuestarias del mes de marzo y abril refiriéndose a los montos devengados en el presente año</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>02/05/2019 - 03:24 PM</p>
<p>MARZO 2019: Conforme a lo señalado en los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>		
<p>FEBRERO 2019: Conforme a lo señalado en los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>		
<p>ENERO 2019: Conforme a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>		
<p>DICIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 13" Conforme a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", se tiene establecido una programación para el 2019, en la cual se establecerá los productos entregables del Estudio de aforos, insumos importantes que deberán determinarse para la evaluación de los distintos proyectos que el MTOP esta ejecutando bajo la modalidad de Delegación</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>28/03/2019 - 10:28 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 12" De acuerdo a lo señalado e los hitos anteriores de este proyecto de "Realización de Estudios para Tráfico, Adjudicado", y en base a los tiempos establecidos en el SERCOP para este tipo de procesos, se reprogramará este proyecyo para el siguiente año fiscal.</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>05/12/2018 - 05:10 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018 "HITO ASOCIADO 11" Como parte del inicio de los estudios de aforo de tráfico, la Subsecretaría de Delegaciones y Conexiones del Transporte cuenta con el Informe de Idoneidad, Informe Técnico y Terminos de Referencia, actualmente el proceso se encuentra en la fase Precontractual, siguiendo lo establecido en el Reglamento Interno de Delegaciones de COmpetencia para la Ejecución de Procesos Administrativos en Materia de Contratación Pública.</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>05/12/2018 - 05:05 PM</p>
<p>"OCTUBRE 2018 HITO 10" EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR EL ESTUDIO PARA AFOROS DE TRÁFICO EN VARIOS CORREDORES DE LA RED VIAL ESTATAL, EL MISMO QUE PERMITIRÁ DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y</p>	<p>Aguilar Ortiz, César Oswaldo</p>	<p>05/11/2018 - 04:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ECONÓMICA DE CADA CORREDOR VIAL, ADICIONALMENTE SE PODRÁ DELEGAR AL SECTOR PRIVADO LA GESTIÓN Y EXPROPIACIÓN. HASTA EL MOMENTO SE CUENTA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EL INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD, EL MISMO QUE SUTENTA LA INFORMACIÓN.		
SEPTIEMBRE 2018 "HITO 9" En vista de las necesidades institucionales y en conformidad con el Modelo de Gestión, la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte, desde el septiembre del presente año, se encuentra tramitando el dictamen de prioridad de conformidad con los lineamientos emitidos por SENPLADES, y ante lo cual se ha planteado un proyecto formado por 3 componentes: 1) Contratos de Concesiones y Convenios de Delegaciones Vigentes, 2) Infraestructura Vial a Administrar bajo el Régimen de Delegaciones y 3) Obras Nuevas a construir y administrar bajo Régimen de Delegación.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/10/2018 - 10:55 AM
AGOSTO 2018 "HITO ASOCIADO 7" El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del Transporte avanza con la reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca - Azogues - Biblian, para lo que cuenta con 12 frentes de trabajo a lo largo de los 43 km, los mismos que están divididos en tres tramos: Salado - Guangarcucho, Guangarcucho - Azogues y Azogues - Biblian. Se prevee la construcción de veredas, cajoneras, áreas verdes, estructura vial, letreros de señalización entre otros aspectos correspondientes a la carretera.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/09/2018 - 05:43 PM
JULIO 2018 (HITO ASOCIADO 7) El proyecto se llama ahora Cumbe - El Salado - Biblian; El Descanso - Gualaceo; Bulcay - Paute. Se ha recibido una iniciativa privada por parte de la empresa Hidalgo e Hidalgo. El proyecto se encuentra en fase de preestructuración.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	03/08/2018 - 04:33 PM
JUNIO 2018 (HITO ASOCIADO 6) El MTOP en base al modelo de Gestión Sostenible ha decidido reestructurar el proyecto Naranjal - Río Siete; modificando el punto final del proyecto, siendo éste ahora Ponce Enríquez y no Río Siete, contando con una longitud de 49,37 km. Al momento, no es factible determinar los PPD que requerirá el Proyecto, sin contar con el alcance técnico y análisis económico financiero definitivos.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/07/2018 - 04:54 PM
MAYO 2018 (HITO ASOCIADO 5) El nombre del corredor cambió de "Naranjal - Río Siete" a "Naranjal - Ponce Enríquez". Se ha planteado un cronograma tentativo, el cual inicia en la cuarta semana de mayo del 2018 con la presentación del proyecto y finaliza en la primera semana de agosto con el lanzamiento a concurso público. Actualmente el proyecto se encuentra en la primera fase del cronograma planificado.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	05/06/2018 - 04:53 PM
ABRIL 2018 (HITO ASOCIADO 4) El proyecto Naranjal - Río Siete se ha conceptualizado como una delegación al privado bajo modalidad de Asociación Público Privada para mejoramiento, ampliación de carriles, operación y mantenimiento periódico y rutinario. Como principal beneficio se tendrá una reducción de 30 minutos en el tiempo de viaje.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	04/05/2018 - 04:31 PM
MARZO 2018 (HITO ASOCIADO 3) Se ha procedido con la transferencia de fondos para la ejecución de obras no previstas en el contrato principal, en base a las Ordenes de Variación 2 y 3; estas obras incluyen la terminación del tramo "Y" de Tillalles - "Y" de Corralitos (Intercambiador de Bella India), y la ampliación a 4 carriles del tramo el Guabo - "Y" de Tillalles.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	04/04/2018 - 03:06 PM
FEBRERO 2018 (HITO ASOCIADO 2) El proyecto Diseño Financiamiento, Construcción, Ampliación y Explotación del Corredor Río Siete - Huaquillas, tiene un plazo total de 30 años, distribuidos de la siguiente manera: un periodo de organización de 34 meses, un periodo de construcción de 36 meses para la etapa 1 y 48 meses para la etapa 2 y el periodo de operación y mantenimiento de 360 meses.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	23/03/2018 - 12:52 PM
ENERO 2018 (HITO ASOCIADO 1) El proyecto Diseño Financiamiento, Construcción, Ampliación y Explotación del Corredor Río Siete - Huaquillas, pretende ampliar y modernizar la infraestructura vial y el servicio que presta para mejorar la conectividad entre las principales ciudades del país.	Aguilar Ortiz, César Oswaldo	23/03/2018 - 12:50 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
2	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
5	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
6	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
7	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
8	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
9	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado (preliminar)	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	4.5
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Infraestructura vial a administrar bajo Régimen de Delegación (Estudio de Aforos de Trafico, adjudicado), en trámite obtener DICTAMEN DE PRIORIDAD	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Convenio de Delegación con GAD de Guayas suscrito	5-Entregables Intermedios	28/06/2019		29/11/2018		Sí	1.5
9	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	9-Entregables Formales	31/07/2019		28/06/2019		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo), suscrito	9-Entregables Formales	30/08/2019		31/07/2019		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Río Siete - Huaquillas, Aporte Pago por Disponibilidad) legalizado	9-Entregables Formales	31/10/2019		30/09/2019		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito	5-Entregables Intermedios	27/12/2019		29/11/2019		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Matriz programación del POA (Plan operativo anual) 2020 - aprobada	1-Solicitud de Información	01/01/2020		01/01/2020		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Reprogramación del POA (Plan operativo anual) 2020, aprobada	1-Solicitud de Información	01/02/2020		01/02/2020		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	9-Entregables Formales	01/03/2020		01/03/2020		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Informe de Corrida Financiera (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2020		01/04/2020		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Informe de Evaluación Técnico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2020		01/04/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/05/2020		01/05/2020		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/06/2020		01/06/2020		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado	9-Entregables Formales	01/07/2020		01/07/2020		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel), suscrito	9-Entregables Formales	01/08/2020		01/08/2020		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN: Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito	9-Entregables Formales	01/09/2020		01/09/2020		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Modelo de contrato y anexos del proyecto (Naranjal-Tenguel), emisión de pliegos elaborado	9-Entregables Formales	01/10/2020		01/10/2020		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	EJECUCIÓN: Resolución de inicio del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrita	9-Entregables Formales	01/11/2020		01/11/2020		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN: Concurso público del proyecto (Naranjal-Tenguel)	9-Entregables Formales	01/12/2020		01/12/2020		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Técnica del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado.	9-Entregables Formales	01/02/2021		01/02/2021		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Técnica del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	9-Entregables Formales	01/02/2021		01/02/2021		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/ Financiera del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado	9-Entregables Formales	01/03/2021		01/03/2021		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Económica/ Financiera del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	9-Entregables Formales	01/03/2021		01/03/2021		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2021		01/04/2021		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN: Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	9-Entregables Formales	01/04/2021		01/04/2021		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN: Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) suscrito	9-Entregables Formales	01/05/2021		01/05/2021		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito	9-Entregables Formales	01/05/2021		01/05/2021		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: Acta de Negociación del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito	9-Entregables Formales	01/06/2021		01/06/2021		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: Acta de Negociación del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) suscrito	9-Entregables Formales	01/07/2021		01/07/2021		Sí	2.5
38	EJECUCIÓN: Acta de Adjudicación del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) suscrito	9-Entregables Formales	01/09/2021		01/09/2021		Sí	2.5
39	EJECUCIÓN: Plan Operativo Anual del Proyecto, elaborado (Inclusión Hito 1 diciembre 2020)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado (inclusión hito 2 diciembre 2020)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado (Inclusión Hito 2 julio 2021)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
42	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 junio 2021)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 mayo 2021)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
44	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado. (Inclusión Hito 2 agosto 2021)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad elaborado	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
46	EJECUCIÓN: Informe evaluación POA, PAI, I Semestre 2021 . (Inclusión Hito 1 agosto 2021)	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
47	EJECUCIÓN: Reajuste del Plan Operativo Anual proyecto 2021.	9-Entregables Formales	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
48	EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Documentos para la postulación al PAI 2022 elaborados	9-Entregables Formales	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.5
49	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.5
50	EJECUCIÓN: Anexos para la actualización de dictamen elaborados	9-Entregables Formales	30/11/2021		30/11/2021		Sí	0.5
51	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	30/11/2021		30/11/2021		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Solicitud de apoyo a la CGP para actualización del dictamen de prioridad	9-Entregables Formales	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.1
53	EJECUCIÓN: POA del proyecto elaborado	9-Entregables Formales	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.05
54	EJECUCIÓN: Documento remitido a la SNP, solicitando autorización para gastos excepcionados	9-Entregables Formales	28/02/2022		28/02/2022		Sí	0.05
55	EJECUCIÓN: Autorización de la SNP, para gastos excepcionados	V - Verificación ejecutiva	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.05
56	EJECUCIÓN: Documento solicitando autorización para efectuar modificaciones presupuestarias	V - Verificación ejecutiva	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.05
57	EJECUCIÓN: Documento solicitando la contratación de personal para la conformación del equipo de supervisión	V - Verificación ejecutiva	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.05
58	EJECUCIÓN: Documento revisión deudas pendientes de IVA en relación contratos con PANAVIAL	V - Verificación ejecutiva	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.05
59	EJECUCIÓN: Documento de análisis de deudas pendientes	V - Verificación ejecutiva	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.05
60	EJECUCIÓN: Gestiones para ajustes presupuestarios	V - Verificación ejecutiva	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	para cancelar obligaciones pendientes							
61	EJECUCIÓN: Informe de avance para cierre del proyecto, temas financieros	9-Entregables Formales	31/07/2022		31/07/2022		Sí	0.05
62	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	31/07/2022		31/07/2022		Sí	0.05
63	EJECUCIÓN: Informe de avance para cierre del proyecto, temas legales	9-Entregables Formales	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
64	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.05
65	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.05
66	Informe de avance para cierre del proyecto, temas técnicos	9-Entregables Formales	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.05
67	EJECUCIÓN: Informe de avance para cierre del proyecto, temas financieros	9-Entregables Formales	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.05
68	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.05
69	EJECUCIÓN: Informe de supervisión aprobado	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/09/2022			No	0.05
70	EJECUCIÓN: Informe de avance para cierre del proyecto, consolidado	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	0.05
71	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	9-Entregables Formales	01/12/2022	01/12/2022			No	1.0
72	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	01/12/2022	01/12/2022			No	1.0
73	CIERRE: Informes de fiscalización/supervisión aprobados	9-Entregables Formales	01/12/2022	01/12/2022			No	2.0
74	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0
75	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	9-Entregables Formales	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0
76	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SNP aprobado	9-Entregables Formales	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0
77	CIERRE: Liquidación Económica	9-Entregables Formales	15/12/2022	15/12/2022			No	1.0
78	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	20/12/2022	20/12/2022			No	1.5
79	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2022	30/12/2022			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de componentes ejecutados	—	-	-	-	01/01/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	167,096,950.74 **
Costo Total:	229,110,007.00
Total Devengado:	166,037,576.49
% Costo Total Devengado:	72.47 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 72.47 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	385,173,904.41	1,188,030.52	0.00	386,361,934.93
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,188,030.52	0.00	1,188,030.52
Ppto. Aprobado Inicial	85,331,090.13	1,188,030.52	0.00	86,519,120.65
Ppto. Codificado	171,736,716.91	1,188,030.52	0.00	172,924,747.43
Ppto. Comprometido	167,937,917.06	0.00	0.00	167,937,917.06
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	171,736,716.91	1,188,030.52	0.00	172,924,747.43
Ppto. Devengado	165,908,920.22	128,656.27	0.00	166,037,576.49
Pagado Real	95,874,708.43	0.00	0.00	95,874,708.43
Estimado a fin de año	* 165,908,920.22	0.00	0.00	165,908,920.22
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,827,796.69	1,188,030.52	0.00	7,015,827.21
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.61 %	10.83 %	0.00 %	96.02 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022

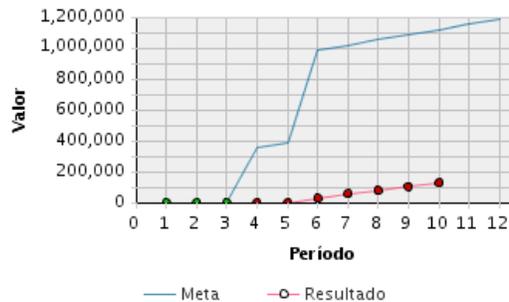

Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	352,506.88	0.00	352,506.88	0.00	0.00 %		0.00 %
May	34,478.08	0.00	386,984.96	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	594,177.08	26,577.60	981,162.04	26,577.60	2.71 %		2.24 %
Jul	34,478.08	28,476.00	1,015,640.12	55,053.60	5.42 %		4.63 %
Ago	34,478.08	24,408.00	1,050,118.20	79,461.60	7.57 %		6.69 %
Sep	34,478.08	24,238.67	1,084,596.28	103,700.27	9.56 %		8.73 %
Oct	34,478.08	24,956.00	1,119,074.36	128,656.27	11.50 %		10.83 %
Nov	34,478.08		1,153,552.44				
Dic	34,478.08		1,188,030.52				
Total	1,188,030.52	128,656.27					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar la estructuración de la participación del sector privado en infraestructura (operación y mantenimiento en la Red Vial Estatal) y de gestión del transporte MEDIANTE modelos de gestión sostenibles.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		ACTA_DE_LA_SUBCOMISIÓN_DE_PROFESIONALES._TRONCOPUNTO_BABAHOYO-BUENA_FE.pdf	03/09/2021
2		DOCUMENTOS_POSTULACIÓN_PAI_2022_ELABORADOS.pdf	05/11/2021
3	A1. HITO 2, Cronograma Río Siete - Huaquillas	HITO_2_Cronograma_de_proyecto_Río_Siete_-_Huaquillas.pdf	23/03/2018
4	A3.Hito 1_Perfil del proyecto Río Siete Huaquillas	HITO_1_Perfil_del_proyecto_Río_Siete_-_Huaquillas.pdf	23/03/2018
5	A3.Hito_3_Información de compensación al concesionario por ejecución de obras no previstas Río Siete-Huaquillas	Hito_3_Inf_de_compensación_al_concesionario.pdf	04/04/2018
6	A4.Hito 4_Perfil de Naranjal - Río Siete	Hito_4_Perfil_de_Naranjal_-_Río_Siete.pdf	04/05/2018
7	A5.Hito 5 Cronograma Naranjal - Ponce Enríquez	Hito_5_proyecto_inversión.pdf	06/06/2018
8	A6.HITO6Gestión_y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal	Gestión_y_Operación_de_Corredores_de_la_Red_Vial_Estatal.pdf	05/07/2018
9	A7.Hito 7_Perfil del proyecto Cumbe - El saludo - Biblian	Hito_7_Perfil_Cumbe_-_El_Salado_-_Biblian.pdf	06/08/2018
10	A7.HITO7. Ficha técnica del proyecto para aprobación de la autoridad designada para articular el Consejo Sectorial	2FICHA_TECNICA.pdf	22/03/2018
11	A7.HITO7. Informe de observaciones	anexo_3_informe_de_observaciones04334630015144082842910	23/03/2018
12	A7.HITO7. Informe legal	anexo_4_informe_legal0457351001514408303.pdf	23/03/2018
13	A7.HITO7. Memorando observaciones Senplades	senplades-sip-2017-0840-of.pdf	23/03/2018
14	A7.HITO7. Solicitud de dictamen	anexo_2_solicitud_de_dictamen0251423001508876433.pdf	23/03/2018
15	A8.HITO 8 CRONOGRAMA DE PROYECTO CUENCA AZOGUES BIBLIAN	PROYECTO_GASTO_DE_INVERSIÓN_AGOSTO_2018_HITO_8_CRONOGRAMA_DE_PROYECTO_CUENCA_AZOGUES_BIBLIAN.pdf	05/09/2018
16	A9.PROYECTO GASTO INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2018 HITO 9 INFORMACION PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD)	PROYECTO_GASTO_DE_INVERSIÓN_HITO_9_INFORMACION_PAGO_POR_DISPONIBILIDAD(PPD).pdf	06/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	B1.OCTUBRE 2018 PROYECTO DE INVERSIÓN HITO 10 INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRÁFICO	PROYECTO_DE_INVERSIÓN_HITO_10_INFORMCIÓN_PARA...	05/11/2018
18	B2.PROYECTO_DE_INERSIÓN_INICIO_DE_ESTUDIOS PARA AFOROS DE TRÁFICO	PROYECTO_DE_INERSIÓN_INICIO_DE_ESTUDIOS PARA...	05/12/2018
19	B3.PROYECTO_DE_INVERSIÓN PROYECTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRÁFICO	PROYECTO_DE_INVERSIÓN PROYECTO DE REALIZACIÓN...	05/12/2018
20	B4.HITO : Informe proyecto, realizado	HITO13_Informe_proyecto__realizado.pdf	04/01/2019
21	B5: Cédulas presupuestarias mes a mes Ene-Jun 2019	Cedulas_presupuestarias_mes_a_mes_Ene-Jun_2019.pdf	05/07/2019
22	B6.HITO7:Infraestructura vial a administrar bajo Régimen de Delegación (Estudio de Aforos de Trafico, adjudicado)	HITO_7_(Estudio_de_Aforos_de_Trafico__adjudicado).pdf	05/06/2019
23	B7.HITO9. EJECUCIÓN: Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	HITO9._EJECUCIÓN_Contrato_de_Concesión_y_Convenios... Riobamba_Aporte_para_ampliación_tramo_Riobamba_- _Ambato)_suscritoContrato_Adi_Ampliación_Ambato_Riobamba_compressed.pdf	24/06/2019
24	B8. HITO 10 Transferencia para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo, Se ha procedido a ejecutar conforme se respalda en los archivos adjuntos	Contrato_de_Concesión_y_Convenios_de_Delegación_Vigentes... _Santo_Domingo)__suscrito.PDF	05/07/2019
25	B9. Cedula Presupuestaria mes de Julio 2019	A7.JULIO_2019.pdf	07/08/2019
26	C1.Cédula Presupuestaria mes de Agosto 2019	A8.AGOSTO_2019.pdf	02/09/2019
27	C2.HITO11. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Alóag - Santo Domingo) suscrito	Contrato_de_Concesión_y_Convenios_de_Delegación_Vigentes... _Santo_Domingo)__suscrito	05/10/2019
28	C3. Cedula Presupuestaria mes de Septiembre 2019	A9.SEPTIEMBRE_2019.pdf	01/10/2019
29	C4. Cédula Presupuestaria mes de Octubre 2019	B1.OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
30	C5. Cédula Presupuestaria mes de Noviembre 2019	B2.NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
31	C6. Hlto 12. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba, Aporte para construcción Paso Lateral de Ibarra) suscrito	Paso_Lateral_Ibarra_.pdf	10/12/2019
32	C7.Pagos por Disponibilidad (PPD) así como también el contrato de consultoría para llevar a cabo los estudios de aforos de tráfico, fondos para la contratación de la consultoría	Pagos_por_Disponibilidad_(PPD).pdf	17/12/2019
33	C8.HITO13.(Rumichaca-Riobamba/ Río Siete - Huaquillas, pagos por supervisión) suscrito.	HITO13_PAGO_DE_CONTRATOS_SERVICIOS_PROFESIONALES.pdf	01/12/2019
34	C9.HITO14.Documento de obras nuevas a construir bajo Régimen de Delegación (Difusión e Información de los proyectos) aprobado	HITO_14__Proyectos_de_difusión_e_informacion.pdf	04/01/2020
35	D1.Cédula Presupuestaria mes de Diciembre 2019	B3.DICIEMBRE_2019.pdf	07/01/2020
36	D2.Cédula Presupuestaria mes de Enero 2020	Enero_2020.pdf	03/02/2020
37	D3.Cédula Presupuestaria mes de Febrero 2020	Febrero_2020.pdf	05/03/2020
38	D4. HITO 15. Matriz programación del POA (Plan operativo anual) 2020 - aprobada	POA_2020_REQUERIMIENTO.xlsx	05/03/2020
39	D5. HITO 16. Reprogramación del POA (Plan operativo anual) 2020, aprobada	REPROGRAMACION_DEL_POA_2020.pdf	05/03/2020
40	D6. Documento de Proyectos Formato SENPLADES	2020-01-28_02-15-26_PROYECTODEINVERSIN28ENERO2020.pdf	23/03/2020
41	D7. Cedula Presupuestaria mes marzo 2020	Marzo_2020.pdf	03/04/2020
42	D8. Ficha Proyecto Corredores viales por delegación SIPeIP	Ficha_Proyecto_Corredores_viales_por_delegacion_SIPeIP.pdf	03/04/2020
43	D9. Comunicación de disminución de asignación presupuestaria por el monto de 9,994,979.31 millones (Por Pandemia COVID-19)	Desminucion_de_Presupuesto_2020.pdf	03/04/2020
44	E1. HITO 17. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Rumichaca-Riobamba Aporte para ampliación tramo Riobamba - Ambato) suscrito	MTOP-SDCT-2020-122-ME(2).pdf	13/04/2020
45	E2. HITO 18. Informe de Corrida Financiera (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_de_Evaluación_Económico.pdf	13/04/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
46	E3. HITO19. Informe de Evaluación Técnico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_Tecnico_compressed.pdf	21/04/2020
47	E4. HITO20. Informe Económico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Informe_de_Evaluación_Económico_compressed.pdf	04/05/2020
48	E5. Cédula Presupuestaria mes abril 2020	Abril_2020__CUP_175200000.0000.382584.pdf	04/05/2020
49	E6. HITO 21. Informe Jurídico del proyecto (Naranjal - Tenguel) elaborado	Naranjal-Tenguel_Resolucion-de-Inicio-de-Concurso-Publico-1_compressed.pdf	04/06/2020
50	E7. Cédula presupuestaria mes de mayo 2020	Mayo_31_2020__CUP_175200000.0000.382584.pdf	04/06/2020
51	E8. Cédula presupuestaria mes de Junio 2020	Junio_2020.pdf	03/07/2020
52	E9. HITO 22. Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel) elaborado	DECRETO_EXCEPCIONALIDAD_802_2019_NARANJAL_TENGUEL_802_2019.pdf	03/07/2020
53	F1. Acción 1. Riesgo 3. Gestionar con el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones la asignación de recursos económicos por parte de la CAF para el Proyecto	programa_de_infraestructura_logística_en_ecuador_(caf2).pdf	14/07/2020
54	F2. HITO 23 Decreto de Excepcionalidad del proyecto (Naranjal-Tenguel), suscrito	Decreto_de_Excepcionalidad_Naranjal_Tenguel_802_2019_suscrito.pdf	03/08/2020
55	F3. Cédula presupuestaria del mes de julio 2020	Cédula_presupuestaria_mes_de_julio_2020.pdf	05/08/2020
56	F4. HITO 24. Nombramiento comisión técnica del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrito	Nombramiento_comisión_técnica_del_proyecto_(Naranjal-Tenguel)_suscrito.pdf	01/09/2020
57	F5. Cédula presupuestaria mes de Agosto 2020	Agosto_2020.pdf	02/09/2020
58	F6. HITO25. Modelo de contrato y anexos del proyecto (Naranjal-Tenguel), emisión de pliegos elaborado	Naranjal-Tenguel_MODELO-DE-CONTRATO.pdf	01/10/2020
59	F7. Cédula presupuestaria mes de septiembre 2020	Septiembre_2020.pdf	01/10/2020
60	F8. ACCIÓN 2. RIESGO 3. Realizar el seguimiento a la asignación de recursos económicos por parte de la CAF para el Proyecto	MTOP-MTOP-20-1135-OF_(CAF).pdf	14/10/2020
61	F9. HITO 26. Resolución de inicio del proyecto (Naranjal-Tenguel) suscrita	Naranjal-Tenguel_Resolucion-de-Inicio-de-Concurso-Publico-1.pdf	04/11/2020
62	G1. Cédula presupuestaria mes octubre 2020	Octubre_2020.pdf	04/11/2020
63	G2. Cédula presupuestaria mes de noviembre 2020	Noviembre_2020.pdf	01/12/2020
64	G3. HITO 27. Concurso público del proyecto (Naranjal-Tenguel)	Concurso_público_del_proyecto_(Naranjal-Tenguel).pdf	01/12/2020
65	G4. Dictamen de prioridad proyectos Concesiones 2020	STPE-SIP-2020-0025._DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_PROYECTO_CONCESIONES..pdf	14/12/2020
66	G5. Asociado al HITO 11. Contrato de Concesión y Convenios de Delegación Vigentes (Transferencia para ampliación tramo Alóag Santo Domingo) suscrito,	MTOP-SDCT-2019-365-ME-LIQUIDACION_CERTIFICACIÓN_PRESUPUEST_TUNEL_BOMBOLÍ.pdf	15/12/2020
67	G6. HITO 28 Informe de Viabilidad Técnica del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado.	BFBJ_Anexo-1-Informe-de-Evaluacion-Tecnica_MTOP.pdf	01/02/2021
68	G7. HITO 29 Informe de Viabilidad Técnica del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	Informe_de_Viabilidad_Técnica_del_proyecto_(Cuenca_-_Azogues_-_Biblián).pdf	23/02/2021
69	G8. Cédula presupuestaria mes febrero 2021	Febrero_28_2021__CUP_175200000.0000.382584.pdf	01/03/2021
70	G9. HITO 30. Informe de Viabilidad Económica/ Financiera del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado	BFBJ_Anexo-3-Informe-de-Evaluacion-Economica_MTOP.pdf	01/03/2021
71	H1. HITO 31. Informe de Viabilidad Económica/ Financiera del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	INFORME-ECONOMICO-FINANCIERO-CUENCA-AZOGUES-BILBIAN-VF.pdf	01/03/2021
72	H2. HITO 32. Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) elaborado	ANEXO_informe_legal_quevedo-babahoyo-jujan.pdf	01/04/2021
73	H3. HITO 33. Informe de Viabilidad Jurídica del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) elaborado	ANEXO_informe_de_viabilidad_legal_cuenca_azogues_biblian.pdf	01/04/2021
74	H4. Cédula presupuestaria mes marzo 2021	Marzo_2021__cedula_presupuestaria.pdf	05/04/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
75	H5. Memorando cambio de líder del proyecto K003 MTOP - Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación	MTOP-DNEPFD-2021-11-ME.pdf	27/04/2021
76	H6. HITO 34. Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Buena fe - Babahoyo - Jujan) suscrito	Acta_de_Presentación_de_Oferta_del_proyecto_(Buena_fe_-_Babahoyo_-_Jujan)_suscrito.rar	03/05/2021
77	H7. HITO 35. Acta de Presentación de Oferta del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito	Acta_de_Presentación_de_Oferta_del_proyecto_(Cuenca_-_Azogues_-_Biblián)_suscrito.rar	03/05/2021
78	H8. Cédula presupuestaria mes abril 2021	Cédula_presupuestaria_mes_abril_2021.pdf	03/05/2021
79	H9. HITO 36. Acta de Negociación del proyecto (Cuenca - Azogues - Biblián) suscrito	CV_Azogues-Biblián_Acta-de-Reunion-Nro.-01_MTOP_2021.pdf.pdf	03/06/2021
80	I1. Acción 2. Riesgo 3. Realizar el seguimiento a la asignación de recursos económicos por parte de la CAF para el Proyecto	Solicitud ampliación de plazo último desembolso crédito CAF.pdf	05/06/2021
81	I2. Cédula Presupuestaria Junio 2021	CEDULA_PRESUPUESTARIA_JUNIO_2021.pdf	03/08/2021
82	I3. Cédula presupuestaria mes mayo 2021	Cédula_presupuestaria_mes_de_mayo_2021.pdf	04/06/2021
83	I4. HITO 37. Acta de revisión integral del proceso del concurso para el corredor Buena Fe - Babajoy - Jujan	BFBJ_ACTA-16-COMISION-TECNICA-CONCESION-BUENA-FE-JUJAN.pdf	06/07/2021
84	I5. Cédula presupuestaria julio 2021	CEDULA_PRESUPUESTARIA_JULIO_2021.pdf	04/08/2021
85	I6. Hito 38. Acta de la Subcomisión de profesionales.	ACTA_DE_LA_SUBCOMISIÓN_DE_PROFESIONALES._TORO-BABAHOYO-BUENA_FE.pdf	08/09/2021
86	I7. Cédula presupuestaria agosto 2021	CEDULA_382584._Agosto_2021.pdf	03/09/2021
87	I8. Documentos respaldos cambio de hitos	DOCUMENTOS_APROBACIÓN_CAMBIOS_DE_HITOS.pdf	05/10/2021
88	I9. HITO 39 Plan Operativo anual 2021 del proyecto	POA_2021_PROYECTO_382584.pdf	05/10/2021
89	J1. HITO 40. Informe de supervisión diciembre 2021	DADST-IT-032_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_DICIEMBRE_2020.pdf	05/10/2021
90	J2. HITO 41. Informe de supervisión julio 2021	DADST-IT-040_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_JULIO_2021.pdf	05/10/2021
91	J3. HITO 42. Informe supervisión junio 2021	DASDT-IT-039_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_JUNIO_2021.pdf	05/10/2021
92	J4. HITO 43. Informe supervisión mayo 2021	DADST-IT-038_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_MAYO_2021_TOTAL.pdf	05/10/2021
93	J5. HITO 44. Informe de supervisión de agosto 2021	DADST-IT-041-INFORM_MATN_RUTIN_Y_PER_AGOSTO_2021.pdf	05/10/2021
94	J6. HITO 45. Informe ejecutivo para la actualización del dictamen de prioridad	Anexo_5._Informe_Ejecutivo_2021._Proyecto_382584.pdf	05/10/2021
95	J7. HITO 46. Informe evaluación del POA, PAI. I SEMESTRE 2021	informe_poa_pai_pac._sdstop_(07.06.2021)-signed-signed-signed.pdf	05/10/2021
96	J8. HITO 47. Reajuste POA 2021. Proyecto 382584	FORMATO_REPROGRAMACIÓN_POA_PROYECTO_382584.pdf	05/10/2021
97	J9. Cédula Presupuestaria septiembre 2021	CUP_382524._cédula_septiembre_2021.pdf	05/10/2021
98	K1. HITO 48. Documentos para la postulación PAI 2022 elaborados	DOCUMENTOS_POSTULACIÓN_PAI_2022_ELABORADOS.pdf	05/11/2021
99	K2. HITO 49. Informe de supervisión aprobado	DADST-IT-043_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_TOTAL.pdf	05/11/2021
100	K3. Cédula Presupuestaria octubre 2021	Cédula_382584_Octubre.pdf	05/11/2021
101	K4. Respaldo gestiones relacionadas con el problema: demora en la asignación de presupuesto	RESPALDO_ACCIONES_GESTIONES_PRESUPUESTO.pdf	25/11/2021
102	K5. Respaldo documento acciones ante CAF en relación con pagos para ejecución del proyecto	mtop-sdstop-2021-411-me._Solicitud_gestión_a_la_CAF_pago_R7H.pdf	03/12/2021
103	K6. HITO 50. Documento y anexos para actualización del dictamen de prioridad del proyecto	DOCUMENTO_ACTUALIZACIÓN_DICTAMEN_PRIORIDAD_03/12/2021.pdf	03/12/2021
104	K7. HITO 51. Informe de supervisión	DADST-IT-045_INFORM_MANT_RUTIN_Y_PER_OCTUBRE_2021_TOTAL.pdf	03/12/2021
105	K8. Informe justificativo para la actualización del dictamen de prioridad del proyecto	INFORME_TÉCNICO_AVANCES_PROYECTO_382584_(30.03.2022).pdf	03/12/2021
106	K9. Cedula presupuestaria noviembre 2021	cedula_noviembre_delegaciones.pdf	04/12/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	L1. Cédula presupuestaria diciembre 2021	CEDULA_382584_diciembre_2021.pdf	10/01/2022
108	L2. Documento de la SNP que emite dictamen de arrastre del proyecto	oficio_nro._snp-spn-2021-1198-of._Dictamen_de_arrastre.pdf	10/01/2022
109	L3. Solicitud congelación proyecto	MTOP-SDSTOP-2022-18-ME._SOLICITUD_CONGELAR_PROYECTO_382584.pdf	11/01/2022
110	L4. Documento que contiene el requerimiento y la autorización para la ampliación del plazo del proyecto	AMPLIACIÓN_PLAZO_FECHA_FIN_2022.pdf	05/04/2022
111	L5. HITO 52. Solicitud de apoyo a la CGP para actualización del dictamen de prioridad	MTOP-SDSTOP-2021-502-ME._SOLICITUD_APOYO_ACTUALIZACIÓN_DICTAMEN_382584.pdf	08/06/2022
112	L6. HITO 53. POA del proyecto elaborado	poa_2022_PROYECTO_382584.pdf	09/06/2022
113	L7. HITO 54. Documento remitido a la SNP, solicitando autorización para gastos excepcionados	MTOP-MTOP-22-121-OF._SOLICITUD_AUTORIZACIÓN_CONTRATACIÓN_EQUIPO_SUPERVISIÓN.pdf	09/06/2022
114	L8. HITO 55. Autorización de la SNP, para gastos excepcionados	SNP-SPN-2022-0481._Autorización_gastos_excepcionados.pdf	09/06/2022
115	L9. HITO 56. Documento solicitando autorización para efectuar modificaciones presupuestarias	MTOP-SDSTOP-2022-171-ME.pdf	09/06/2022
116	M1. HITO 57. Documento solicitando la contratación de personal para la conformación del equipo de supervisión	MTOP-SDSTOP-2022-227-ME._A_CGAF_CONTRATOS_2022.pdf	09/06/2022
117	M2. Cédula presupuestaria del mes de abril de 2022	cup_382584_abril_21_2022.pdf	09/06/2022
118	M3. HITO 58. Documento revisión deudas pendientes de IVA en relación contratos con PANAVIAL	informe_deudas_panavial_iva-signed-signed-signed.pdf	09/06/2022
119	M4. Cédula presupuestaria del mes de mayo de 2022	382584.MAYO_2022.pdf	09/06/2022
120	M5. HITO59.DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE LAS DEUDAS PENDIENTES	ANALISIS_PROYECTOS.pdf	05/07/2022
121	M6. HITO 60. DOCUMENTO SOBRE GESTIONES SOBRE AJUSTES PRESUPUESTARIOS PARA CANCELAR OBLIGACIONES PENDIENTES	Informe_justificativo_de_modificación_Gestión_y_Operación_05/07/2022.pdf	05/07/2022
122	M7.CEDULA PRESUPUESTARIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	cédula_presupuestaria_382584._junio_2022.pdf	05/07/2022
123	M8. INFORME PARA CIERRE DEL PROYECTO. TEMAS FINANCIEROS.	INFORME_SOBRE_PAGOS_PENDIENTES_A_LA_EMPRESA_05/08/2022.pdf	05/08/2022
124	M9. HITO 62. INFORME DE SUPERVISIÓN	HITO_62._CRONOGRAMA_SUPERVISIÓN.pdf	05/08/2022
125	N1. CEDULA PRESUPUESTARIA. JULIO 2022	382584(Julio_2022).pdf	05/09/2022
126	N2. HITO 63. INFORME DE AVANCE PARA CIERRE DEL PROYECTO. TEMAS LEGALES	HITO_63._MTOP-SDSTOP-22-692-OF._ACCIONES_POSTERIORES_A_LA_ENTREGA_TRAMO_AMB_-RIOBAMBA.pdf	05/09/2022
127	N3. HITO 64. INFORME DE SUPERVISIÓN APROBADO	HITO_64._INFORME_DE_SUPEVISIÓN_APROBADO.pdf	05/09/2022
128	N4. CÉDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO 2022	382584._AGOSTO_2022.pdf	05/09/2022
129	N5. HITO 65. INFORME DE SUPERVISIÓN	informe_deudas_panavial_iva-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
130	N6. HITO 66. INFORME DE AVANCE. TEMAS TÉCNICOS	ANEXO_2._INFORME_TÉCNICO_DNAD-FR-142-signed-signed-signed.pdf	05/10/2022
131	N7. CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2022	Cédula_175200000.0000.382584_sep_2022.pdf	05/10/2022
132	N8. HITO 67. INFORME DE AVANCE TEMAS FINANCIEROS	Anexo_2_-_Informe_justificativo_reprogramacio	01/11/2022
133	N9. HITO 68. INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME_DE_SUPERVISIÓN_TEMAS_FINANCIEROS_SEPTIEMBRE_2022..pdf	05/11/2022
134	O1. CÉDULA PRESUPUESTARIA. OCTUBRE 2022	382584._Gestión_y_Operación_RVE._Octubre_2022.pdf	01/11/2022
135	O2. Documento de solicitud de apertura del sistema, para actualizar los hitos,.	SOLICITUD_APERTURA_SISTEMA__MODIFICACIÓN_HITOS_11/2022	05/11/2022

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Cañizares Jaramillo, Ana Katherin	Director del Proyecto	Subsecretaria de Delegaciones de los	acanizares@mtop.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
		Servicios del Transporte y Obras Públicas		
Garzón Guamán, Ana Lourdes	Entregar reportes SIPEIPE actualizados	Servidor Publico 6	agarzon@mtop.gob.ec	023974600
Navarrete Veloz, Fidel Augusto	Supervisor del Proyecto (PANAVIAL)	Director/a Nacional de Administración de Delegaciones	fnavarrete@mtop.gob.ec	26072
Riofrio Inga, Fernando	Supervisor del Proyecto (ALOAG - SANTO DOMINGO)	Director de Administración de Delegaciones y Concesiones, Subrogante	firiofrio@mtop.gob.ec	023974600
Uzcategui Calisto, Teofilo Fabian	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario/a de Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Publicas	tuzcategui@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
126119_1.jpg	25/03/2020
