

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría de Obras Públicas**  
**Dirección Nacional de Producción de Obras Públicas**

**PROYECTO: K120** MTOP: Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva.

|                                |   |                                 |                         |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Freire Flores, Marlon Benigno (mfreire@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Santamaría Loor, Kiura Ninoska                      | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Prado Leverone, Juan Carlos                         | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                     | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 91480000.651.2501                                   | TIR:                            | 41.00 %                 |
| Objetivos Operativos:          | 1   | VAN:                            | 5,667,079.98            |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 1,482,000.08            |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                    |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2025 |
| Fecha de última actualización: | 30/12/2022  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2025              |
| Modificado por:                | Freire Flores, Marlon Benigno                       | Fecha del siguiente Hito:       | 31/12/2022              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

\* DESCRIPCIÓN: El proyecto Planificación, Ejecución y Terminación de Obras de Infraestructura Deportiva, además de contribuir a la reducción de la tasa de sedentarismo mediante el fomento de la actividad deportiva y recreativa, también pretende que las nuevas generaciones se mantengan alejadas de los vicios y, al mismo tiempo, inculcar valores importantes como la responsabilidad, constancia, perseverancia, compañerismo entre otros, e impulsar el acceso universal para el fomento del Deporte y la Actividad Física a escenarios deportivos y recreativos a niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad.

\* PRODUCTO: Infraestructura deportiva.

\* LÍNEA BASE: Establecer la necesidad de implementar un plan de intervención en la generación de nueva infraestructura deportiva a fin de lograr disminuir la desigualdad en la distribución de la misma, para de esta manera el país entero se vea beneficiado de la infraestructura deportiva..

\* OBJETIVO GENERAL: Aumentar la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las provincias que mantienen un déficit en la misma con respecto a la media nacional, a través de la planificación de nuevos proyectos de infraestructura y la readecuación de los existentes.

\* OBJETIVO ESPECÍFICO O COMPONENTES:

- Componente 1: Realizar la contratación de estudios y obras de infraestructura nueva para la práctica deportiva y recreativa.
- Componente 2: Remodelar, rehabilitar obras de infraestructura deportiva y recreativa existente a nivel nacional.
- Componente 3: Liquidar contratos de obra de infraestructura deportiva y fiscalización que se encuentran pendientes de pago de ejercicios anteriores.
- Componente 4: Implementar y equipar obras de Infraestructura Deportiva identificada para tal efecto

**Beneficios Cualitativos**

Este proyecto contribuye a solucionar el problema a nivel nacional respecto a la falta de infraestructura deportiva a nivel nacional, además de asegurar el libre acceso de la población al desarrollo deportivo.

**Tipo de Beneficiario**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 996.736, conforme el índice al 11% de la población que realiza actividad física según el "Estudio de Mediación del Sedentarismo en la población Ecuatoriana 2010" y cuya proyección beneficiaria se utiliza la tasa de crecimiento intercensal anual emitida por el INEC que es del 1,52%

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 11.613.483 del cálculo de la densidad de infraestructura deportiva por habitante nacional 1,30 m2

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tiene una duración de 14 años.

COSTO: Presupuesto límite transferido por el Ministerio del Deporte


ALCANCE: Contratar las obras de infraestructura deportiva y ejecutar sus etapas precontractual, contractual y de administración de cada contrato tanto de obra, fiscalización y demás servicios relacionados, en cumplimiento de la normas vigentes.

RECURSOS: Humanos y materiales.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 80.03 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

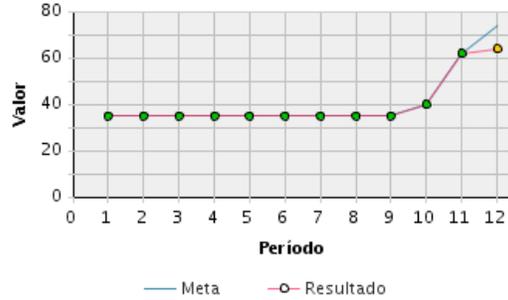

| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2022                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 35 %                        | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 40 % | 62 % | 74 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 35 %                        | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 40 % | 62 % | 64 % |
| Estado               |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ▼    |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>NOVIEMBRE 2022:</b></p> <p>1.- El proyecto de inversión tiene como entidad requirente al Ministerio del Deporte (MD) y co-ejecutado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOPE), en la etapa precontractual y contractual mediante la transferencia de recursos y la necesidad del MD (conforme el convenio interinstitucional), etapas que se desarrollan conforme lo determinado en la ley vigente del proceso de contratación de: consultoría de estudios, fiscalización de obra y contratos de obra, competencias que el MTOPE asumió mediante Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020 una vez suprimido el Servicio de Contratación de Obras (SECOB).</p> <p>2.- Mediante Informe del Proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva CUP 91480000.651.2501 se determina la inversión desarrollada por el Ministerio del Deporte. (Anexo 1)</p> <p>3.- La presente ficha denominada K120 MTOPE: "Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva", fue creada por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MTOPE en la cual no hay registro de valores devengados de años previos, lo que causa que los porcentajes de costo total devengados y el tiempo transcurrido no sean coincidentes. (Anexo 2)</p> <p>4.- El SECOB realizó en su momento contrataciones conforme los requerimientos del MD a partir del año 2011 sin embargo el convenio marco de cooperación interinstitucional se suscribió el 28 de febrero de 2015. (Hito 1).</p> <p>5.- Mediante Oficio Nro. MD-CGPGE-2022-0057-OF de 15 de septiembre de 2022 la CGPGE del MD solicitó a la CGPGE del MTOPE el registro de modificación presupuestaria en el sistema de Administración Financiera e-SIGEF, según el dictamen favorable para inclusión del proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva para la cancelación de los contratos adjuntos al presente documento. (Hito 3)</p> <p>6.- Con memorando Nro. MTOPE-DNPOP-2022-0694-ME de 30 de noviembre de 2022, se solicitó la información de contratos de estudios y fiscalización de obra del proyecto de inversión, con el fin de recopilar la documentación que permita registrar el avance real del proyecto y registrarlo mediante los hitos, que podrán variar de acuerdo con la información que proporcione cada una de las áreas correspondientes. (Hito 4)</p> | Freire Flores, Marlon Benigno | 04/12/2022 - 12:32 PM         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 1 - Norte > Carchi > Bolívar                          |
| 2                    | Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas                   |
| 3                    | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui              |
| 4                    | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi |
| 5                    | Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta                         |
| 6                    | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda                      |
| 7                    | Zona 5 - Litoral > Bolívar > Las Naves                     |
| 8                    | Zona 5 - Litoral > Galápagos > Santa Cruz                  |
| 9                    | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Baba                         |
| 10                   | Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo                      |
| 11                   | Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona  |
| 12                   | Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)            |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Convenio interinstitucional suscrito.  | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011         |                | 01/01/2011 |          | Sí            | 10.0          |
| 2  | EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-016-2016 suscrito.  | 5-Entregables Intermedios  | 07/02/2017         |                | 07/02/2016 |          | Sí            | 15.0          |
| 3  | EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-009-2017 suscrito.  | 5-Entregables Intermedios  | 12/04/2017         |                | 12/04/2017 |          | Sí            | 5.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Contrato No. RE-SECOB-024-2017 suscrito.  | 5-Entregables Intermedios  | 24/05/2017         |                | 24/05/2017 |          | Sí            | 5.0           |
| 5  | PLANEACIÓN: Recursos presupuestarios asignados.  | 1-Solicitud de Información | 01/10/2022         |                | 31/10/2022 |          | Sí            | 5.0           |
| 6  | EJECUCIÓN: Pago Planilla de liquidación Nro. 02 Contrato No. RE-SECOB-024-2017   | 5-Entregables Intermedios  | 15/11/2022         |                | 15/11/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Pago Planilla de Avance de Obra Nro. 15, 16, 17 y 18 Contrato No. RE-SECOB-016-2016                         | 5-Entregables Intermedios  | 28/11/2022         |                | 28/11/2022 |          | Sí            | 3.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Solicitud de información realizada.   | 1-Solicitud de Información | 30/11/2022         |                | 30/11/2022 |          | Sí            | 17.0          |
| 9  | EJECUCIÓN: Pago Planilla de liquidación Nro. 03 Contrato No. RE-SECOB-009-2017   | 5-Entregables Intermedios  | 01/12/2022         |                | 23/12/2022 |          | Sí            | 2.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Recopilación de contratos de obra con Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral del contrato | 5-Entregables Intermedios  | 01/12/2022         | 31/12/2022     |            |          | No            | 3.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 5-Entregables Intermedios  | 01/12/2022         | 31/12/2022     |            |          | No            | 7.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Recopilación de Contratos de estudios suscrito.   | 5-Entregables Intermedios  | 01/01/2023         | 31/01/2023     |            |          | No            | 4.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Recopilación de Contratos de Fiscalización suscrito.  | 5-Entregables Intermedios  | 01/01/2023         | 31/01/2023     |            |          | No            | 7.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Recopilación de información de Fiscalización y Estudios.  | 9-Entregables Formales     | 01/01/2023         | 31/01/2023     |            |          | No            | 5.0           |
| 15 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional firmada   | 9-Entregables Formales     | 31/08/2023         | 31/08/2023     |            |          | No            | 4.0           |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 16 | CIERRE: Actas Entrega Recepción Definitiva firmada       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/05/2024         | 30/09/2024     |            | ▼        | No            | 4.0           |
| 17 | CIERRE: Informe final de proyecto de inversión ejecución | 9-Entregables Formales                 | 01/04/2025         | 31/12/2025     |            | ▼        | No            | 2.0           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,482,000.08 ** |
| Costo Total:                  | 1,482,000.08    |
| Total Devengado:              | 943,769.28      |
| % Costo Total Devengado:      | 63.68 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 63.68 %

Perfil Económico 2022

|   | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total        |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado  | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| Ppto. Codificado  | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 943,769.28        | 0.00         | 943,769.28   |
| Planeado - Codificado (2022)                            |              | 0.00              |              |              |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| Ppto. Devengado   | 0.00         | 943,769.28        | 0.00         | 943,769.28   |
| Pagado Real   | 0.00         | 107,343.15        | 0.00         | 107,343.15   |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 1,482,000.08      | 0.00         | 1,482,000.08 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 63.68 %           | 0.00 %       | 63.68 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2022 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Abr                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| May                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Jun                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Jul                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Ago                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Sep                      | 372,177.53                 | 0.00                | 372,177.53                   | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Oct                      | 464,248.60                 | 0.00                | 836,426.13                   | 0.00                  | 0.00 %           |        | 0.00 %       |
| Nov                      | 207,138.55                 | 943,769.28          | 1,043,564.68                 | 943,769.28            | 90.44 %          |        | 63.68 %      |
| Dic                      | 438,435.40                 |                     | 1,482,000.08                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>1,482,000.08</b>        | <b>943,769.28</b>   |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Incrementar procesos de ejecución y entrega de obras de infraestructura pública a nivel nacional, MEDIANTE el desarrollo de herramientas de supervisión y control de proyectos de conformidad con la normativa legal vigente aplicable a los procesos de contratación de obra pública. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1  | A.1 - Hito 1 - Convenio interinstitucional suscrito  | CONV-INTER-150228.pdf  | 02/12/2022    |
| 2  | A.2 - Hito 2 - Contrato No. RE-SECOB-016-2016 suscrito   | CONTRATO_N.-_RE-SECOB-016-2016.pdf   | 02/12/2022    |
| 3  | A.3 - Hito 3 - Contrato No. RE-SECOB-009-2017 suscrito   | RE-SECOB-009-2017_PISCINA_TULCAN.pdf   | 07/12/2022    |
| 4  | A.4 - Hito 4 - Contrato No. RE-SECOB-024-2017 suscrito   | RE-SECOB-024-2017_PISCINA_TULCAN.pdf   | 07/12/2022    |
| 5  | A.5 - Hito 5 - Recursos presupuestarios asignados.   | dictamen_arrastre_Planificación_Deporte_2022.zip   | 02/12/2022    |
| 6  | A.6 - Hito 6 - Pago Planilla de liquidación Nro. 02 Contrato No. RE-SECOB-024-2017   | COMPROBANTE_DE_PAGO.pdf  | 07/12/2022    |
| 7  | A.7 - Hito 7 - Pago Planilla de Avance de Obra Nro. 15, 16, 17 y 18 Contrato No. RE-SECOB-016-2016   | Comprobante_pago_15_16_17_18.pdf   | 07/12/2022    |
| 8  | A.8 - Hito 8 - Solicitud de información realizada.   | Memorando_Nro._MTOB-DNPOP-2022-0694-ME.pdf   | 02/12/2022    |
| 9  | A.9 - Anexo 1 - Informe del Proyecto Planificación Ejecución y Terminación de Infraestructura Deportiva CUP 91480000.651.2501 Ministerio del Deporte | Actualizacion_Proyecto_Planificacion_Final_06_2022-signed-signed_(2).zip                                 | 04/12/2022    |
| 10 | B.1 - Anexo 2 - Creación de la ficha K120 por la CGPGE   | ZimbraCGPGE.pdf  | 04/12/2022    |
| 11 | B.2- Anexo 3 - Riesgo 1 - Acción 1: Solicitud de Ejecución presupuestaria de recursos entregados por el Ministerio del Deporte                       | MTOB-SOP-2022-1614-ME.pdf  | 14/12/2022    |
| 12 | B.3 - Hito 10 - 1: Recopilación de contratos de obra con Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral del contrato                       | RESOLUCIÓN_MUTUO_ACUERDO_ICO-004-2012_CONTRATO DE OBRA COTO-ICO-020-2011_COLISEO_CALUMA.pdf              | 15/02/2022    |
| 13 | B.4 - Hito 10 - 2: Recopilación de contratos de obra con Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral del contrato                       | RESOLUCIÓN_TERMINACIÓN_UNILATERAL_SECOB-DG-2017-001_CONTRATO_LICO-ICO-041-2013_COMPLEJO_HOMERO_LOPEZ.pdf | 15/12/2022    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 14 | B.5 - Hito 10 - 3: Recopilación de contratos de obra con Terminaciones de Mutuo Acuerdo y Anticipada y Unilateral del contrato | RESOLUCIÓN_TERMINACIÓN_UNILATERAL_SECOB-MJLN-2013-0138_CONTRATO_COTO-ICO-018-2011_COLISEO_TAMBO.pdf | 15/12/2022    |
| 15 | B.6 - Hito 11 - 1: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 1.-LICO-ICO-001-2012_COMPLEJO_DEPORTIVO_TITO_NAVARRETE-MORONA_SANTIAGO.pdf                          | 15/12/2022    |
| 16 | B.7 - Hito 11 - 2: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 2.-LICO-ICO-072-2012_INFRAESTRUCTURA_DEPORTIVA_VARIOS-TUNGURAHUA.pdf                                | 15/12/2022    |
| 17 | B.8 - Hito 11 - 3: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 3.-MCO-ICO-006-2012_CANCHA_BARRIO_LAS_AMERICAS-PASTAZA.pdf  | 15/12/2022    |
| 18 | B.9 - Hito 11 - 4: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 4.-COTO-ICO-025-2013_COLISEO_ACHUPALLAS-CHIMBORAZO.pdf  | 15/12/2022    |
| 19 | C.1 - Hito 11 - 5: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 5.-LICO-ICO-006-2011_COLISEO_CATAMAYO-LOJA.pdf  | 15/12/2022    |
| 20 | C.2 - Hito 11 - 6: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 6.-COTO-ICO-004-2013_COLISEO_DE_CALUMA-BOLIVAR.pdf  | 15/12/2022    |
| 21 | C.3 - Hito 11 - 7: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 7.-COTO-ICO-020-2011_TERMINACION_COLISEO_CALUMA-BOLIVAR.pdf   | 15/12/2022    |
| 22 | C.4 - Hito 11 - 8: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 8.-COTO-ICO-018-2011_COLISEO_DE_TAMBO-CAÑAR.pdf   | 15/12/2022    |
| 23 | C.5 - Hito 11 - 9: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 9.-MCO-0002-SECOB-2014_COLISEO_DE_TAMBO-CAÑAR.pdf   | 15/12/2022    |
| 24 | C.6 - Hito 11 - 10: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 10.-COTO-ICO-014-2011_COLISEO_DELEG-CAÑAR.pdf   | 15/12/2022    |
| 25 | C.7 - Hito 11 - 11: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 11.-COTO_ICO_042-2012_COLISEO_ESTEBAN_LUCER_GIRON-AZUAY.pdf   | 15/12/2022    |
| 26 | C.8 - Hito 11 - 12: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 12.-LICO-ICO-081-2012_COLISEO_LA_TRONCAL-CAÑAR.pdf  | 15/12/2022    |
| 27 | C.9 - Hito 11 - 13: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 13.-COTO-ICO-0015-2011_COLISEO_PACCHA-EL_ORO.pdf  | 15/12/2022    |
| 28 | D.1 - Hito 11 - 14: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 14.-COTO-ICO-022-2012_REMODELACIÓN_COLISEO_QUIMIAG-CHIMBORAZO.pdf                                   | 16/12/2022    |
| 29 | D.2- Hito 11 - 15: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 15.-COTO-ICO-037-2012_COLISEO_RUMIÑAHUI_DE_PILLARO-TUNGURAHUA.pdf                                   | 16/12/2022    |
| 30 | D.3- Hito 11 - 16: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 16.-COTO-ICO-041-2012_REMODELACIÓN_COLISEO_SEVERO_ESPINOZA-CHIMBORAZO.pdf                           | 16/12/2022    |
| 31 | D.4- Hito 11 - 17: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 17.-COTO-ICO-017-2011_COLISEO_SEVILLA_DE_ORO-AZUAY.pdf  | 16/12/2022    |
| 32 | D.5- Hito 11 - 18: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 18.-COTO_ICO_016-2011_COLISEO_TIPO_MIL-CAÑAR.pdf  | 16/12/2022    |
| 33 | D.6- Hito 11 - 19: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 19.-COTO-ICO-013-2011_COMPLEJO_TENNIS_CHARASOL-CAÑAR.pdf  | 16/12/2022    |
| 34 | D.7- Hito 11 - 20: Recopilación de Contratos de obra suscrito.   | 20.-LICO-ICO-011-2011_COMPLEJO_DEPORTIVO_GUACHAPALA-AZUAY.pdf                                       | 16/12/2022    |
| 35 | D.8 - Hito 11 - 21: Recopilación de Contratos de obra suscrito.  | 21.-CDE-SECOB-003-2017_COMPLEJO_DEPORTIVO_HOMERO_LOPEZ-ESMERALDAS.pdf                               | 16/12/2022    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 36 | D.9 - Hito 11 - 22: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 22.-LICO-ICO-041-2013_COMPLEJO_DEPORTIVO_HOMERO_LOPEZ-ESMERALDAS.pdf | 16/12/2022    |
| 37 | E.1 - Hito 11 - 23: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 23.-LICO-ICO-008-2011_COMPLEJO_DEPORTIVO_LOS_CHIRIJOS-CAÑAR.pdf      | 16/12/2022    |
| 38 | E.2 - Hito 11 - 24: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 24.-LICO-ICO-063-2012_ESTADIO_BORBON-ESMERALDAS.zip                  | 16/12/2022    |
| 39 | E.3 - Hito 11 - 25: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 25.-LICO-ICO-005-2013_ESTADIO_SHELL-PASTAZA.pdf                      | 16/12/2022    |
| 40 | E.4 - Hito 11 - 26: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 26.-LICO-ICO-025-2013_ESTADIO_PANGUI-ZAMORA_CHINCHIPE.pdf            | 16/12/2022    |
| 41 | E.5 - Hito 11 - 27: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 27.-LICO-ICO-008-2013_ESTADIO_JOCAJ-MANABI.pdf                       | 16/12/2022    |
| 42 | E.6 - Hito 11 - 28: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 28.-COTO-ICO-019-2011_ESTADIO_JORGE_ANDRADE-CAÑAR.pdf                | 16/12/2022    |
| 43 | E.7 - Hito 11 - 29: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 29.-LICO-ICO-070-2012_ESTADIO_LA_COCHA-COTOPAXI.pdf                  | 16/12/2022    |
| 44 | E.8 - Hito 11 - 30: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 30.-COTO-ICO-019-2012_ESTADIO RICARDO FLATZ-ZAMORA_CHINCHIPE.pdf     | 16/12/2022    |
| 45 | E.9 - Hito 11 - 31: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 31.-COTO-ICO-077-2012_ESTADIO_SALINAS_GUARANDA-BOLIVAR.pdf           | 16/12/2022    |
| 46 | F.1 - Hito 11 - 32: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 32.-COTO-ICO-002-2013_GRADERIO_CUBIERTO_ESTADIO_BABALOS_RIOS.pdf     | 16/12/2022    |
| 47 | F.2 - Hito 11 - 33: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 33.-COTO-ICO-040-2012_ILUMINACIÓN_CASA_SELECCIÓN-PICHINCHA.pdf       | 16/12/2022    |
| 48 | F.3 - Hito 11 - 34: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 34.-LICO-ICO-012-2012_ILUMINACIÓN_ESTADIO_7_OCTUBRE-LOS_RIOS.pdf     | 16/12/2022    |
| 49 | F.4 - Hito 11 - 35: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 35.-LICO-ICO-009-2011_ILUMINACION_ESTADIO_AZOGUEZ-CAÑAR.pdf          | 16/12/2022    |
| 50 | F.5 - Hito 11 - 36: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 36.-COTO-ICO-017-2013_PISCINA_CARIAMANGA-LOJA.pdf                    | 19/12/2022    |
| 51 | F.6 - Hito 11 - 37: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 37.-LICO-ICO-130-2012_PISCINA_ITS_BOLIVAR-CARCHI.pdf                 | 16/12/2022    |
| 52 | F.7 - Hito 11 - 38: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 38.-LICO-ICO-135-2012_PISTA_ATHLETICA_FDB-BOLIVAR.pdf                | 16/12/2022    |
| 53 | F.8 - Hito 11 - 39: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 39.-MCO-ICO-019-2011_SEDE_TRES_DE_MAYO-COTOPAXI.pdf                  | 16/12/2022    |
| 54 | F.9 - Hito 11 - 40: Recopilación de Contratos de obra suscrito.                    | 40.-RE-ICO-019-2011-1_ESTADIO_EDDY_COELLO-MORONA_SANTIAGO.pdf        | 19/12/2022    |
| 55 | G.1 - Hito 9 - Pago Planilla de liquidación Nro. 03 Contrato No. RE-SECOB-009-2017 | COMPROBANTE_DE-PAGO_RE-SECOB-009-2017.pdf                            | 28/12/2022    |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo      | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 151033_1.jpg | 30/11/2022    |
