

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas
PROYECTO: K002 Nueva Infraestructura Educativa

Líder del Proyecto:	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo (aestrella@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Santamaría Loor, Kiura Ninoska	Programas Relacionados:	
Titular:	Romero Echeverría, Antonina de los Angeles	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91400000.78.6172	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viability Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,375,573.63
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/03/2009 - 26/12/2023
Fecha de última actualización:	05/05/2023	Fecha de Fin Base:	26/12/2023
Modificado por:	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	Fecha del siguiente Hito:	30/05/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:: Nueva Infraestructura Educativa: se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

PRODUCTO / SERVICIO: Construcción y potenciación de Unidades Educativas y direcciones distritales a nivel Nacional en Ecuador

LÍNEA BASE: Ampliación de cobertura educativa: infraestructura, equipamiento y contratación de personal docente

OBJETIVO: Contratar los Estudios Obra y Fiscalización de las UEM , financiadas por el crédito CAF

OBJETIVO ESPECÍFICO: Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.

RECURSOS: Humanos Materiales y Económicos.

Beneficios Cualitativos

Este proyecto propone el mejoramiento de accesibilidad a los distintos niveles de educación proponiendo para este fin la creación de infraestructura educativa adecuada y completa, brindando así una educación de calidad.

: Se ha ampliado y mejorado progresivamente la oferta de infraestructura escolar existente para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad escolar en base al reordenamiento de la oferta educativa.

Tipo de Beneficiario

1.- Beneficiarios Directos 1,302,487.00

Beneficiarios Directos Femenino 664,270.00

Beneficiarios Directos Masculino 638,217.00

2.- Beneficiarios Indirectos 3,279,960.00

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de ejecución será el estipulado dentro del contrato CFA- 8741 y a lo determinado dentro del mismo aproximadamente 14 años de duración

COSTO : valor de la ficha SIPeIP 3´ 134,845,229.50 usd

Restricciones

RECURSO: Materiales, Humanos y materiales

ALCANCE: Cumplir con las fases precontractual y contractual de estudios, obra y fiscalización según sea del caso

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 96.14 %

Fecha de Inicio: 03/03/2009

Fecha de Fin: 26/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

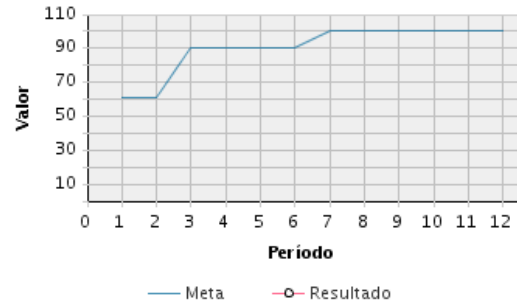

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	61 %	61 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2023 : Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, pues no existe variación en su estatus.	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	05/05/2023 - 12:53 PM
MARZO 2023: Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME del 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución, esto se evidencia conforme a lo detallado en la cedula presupuestaria adjunta	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	03/04/2023 - 09:59 AM
FECRERO 2023: Se mantiene el estado de CONGELADO para el proyecto en conformidad a lo expresado en el MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023, ya que hasta el momento no se han asignado recursos para su ejecución	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	05/03/2023 - 08:13 PM
ENERO 2023: 1.-Mediante Memorando Nro. MTOP-SOP-2023-0067-ME de 30 de enero del 2022, Se solicita el cambio de estado del proyecto a "CONGELADO", esto en conformidad a lo detallado en el documento presentado como líder de proyecto que en su parte pertinente detalla: ("") "Mediante memorando Nro. MTOP-CGPGE-2023-67-ME de 14 de enero de 2023 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica (MTOP) remitió el POA de inversión 2023 de esta Cartera de Estado, aprobado por el Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas; cuya información del POA 2023 ha sido definida conforme los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el ejercicio fiscal en curso.	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	03/02/2023 - 03:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Al verificar el Plan Operativo Anual 2023 antes detallado se evidencia que la institución no ha recibido por parte del Ministerio de Educación, la asignación de recursos para financiar el proyecto de inversión en mención; causal para que el proyecto sea CONGELADO en la herramienta GPR."		
DICIEMBRE 2022 Se da cumplimiento a los Hitos Hito 12 : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO). Hito 13: Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP). Hito 14: Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG). Hito 15: Pago de planilla de liquidación por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS. Hito 16: Pago de la planilla No. 2 de contrato complementario n° 3 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS. Hito 17: Pago de la planilla No. 2 orden de trabajo por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI-CHEMIS. Hito 18: Pago de la planilla No. 20 y 21 por la fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa Milenio Naranjal - Naranjito - TARQUI- CHEMIS. Esta ejecución se evidencia en conformidad a la información detallada en el Reportes - CUR de Ejecución del Gasto correspondiente al mes de diciembre del 2022.	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	04/01/2023 - 12:05 PM
NOVIEMBRE 2022 UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS 1.- PAGO DE PLANILLA 3 CC2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1652-ME PERIODO SEP 2022 2.- - PAGO DE LA PLANILLA 4 CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 2 DE OBRA DE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO. MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2022-1817- ME OCT 2022 UNIDAD EDUCATIVA SAMANES 1- PAGO DE PLANILLA No. 16 CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. 2., PAGO DE PLANILLAS DE ORDEN DE CAMBIO No. 1 PLANILLA No. 1 Y 2 POR EL INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR SAMANES 3.,PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONTRATO RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI 4.- PADO DE PLANILLA PLANILLA No. 12 C. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. CANTON GUAYAQUIL. MTOP-DDG-2022-2079-ME 5.- PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDACION CONT. COMPLEMENTARIO 1 RE SECOB 034 2017 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SAMANES TERMINAL TERRESTRE UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI CANTON GUAYAQUIL. MTOP-DDG-2022-2558-ME.	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	05/12/2022 - 09:12 PM
OCTUBRE Se da cumplimiento a los siguientes Hitos: Hito 6: Determinación de contratos cerrados de fiscalización: Con memorandos :	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	01/11/2022 - 02:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MTOP-DNCFOP-2022-0449-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0451-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0473-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0467-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0472-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0453-ME, MTOP-DNCFOP-2022-0469-ME Se recepta la información de la Dirección de Fiscalización para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, para lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/pK7RNSTiq7J6MYc https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/NrxagN4mNnEZTaF https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/5MBbpNFHjWX4fXi https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/e4rfRTrgtDYSN9D https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/AgdM4QTcw49Dtgx https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/CWl9SjAZkDwiDzB Hito 7: Determinación de contratos cerrados de obra Con memorando MTOP-DNPOP-2022-0585-ME , Se recepta la información de la Dirección de Obras para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, para lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/c6Qofa7JjW44M6W Hito 8 : Determinación de contratos cerrados de estudios+ Con memorando MTOP-DNEOP-2022-2105-ME , Se recepta la información de la Dirección de Estudios para el análisis correspondiente sobre los contratos cerrado y el estado de los contratos abiertos o pendientes de cierre, para lo cual en cada informe se adjunta un enlace de almacenamiento con la información disponible https://almacenamiento.mtop.gob.ec/index.php/s/Z2Aw8SiffjbtbnH		
SEPTIEMBRE 2022: 1.-Mediante memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1211-ME de 06 de septiembre de 2022, remitido por la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS se realiza la designación de LÍDERES DE PROYECTO para proyectos inversión Ex-SECOB y Ecuador Estratégico E.P. en la herramienta GPR. 2.- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1968-ME, de 20 de septiembre de 2022, se realiza la solicitud información a las distintas Direcciones de la SOP, correspondiente a los contratos parte del proyecto NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . 3.- Modificación de los datos económicos del proyecto, debido a un decremento en los valores asignados según cédula presupuestaria de septiembre 2022 4.- Se da cumplimiento de los siguientes Hitos. Hito 1 : convenio Interinstitucional Hito 2 : Identificación de recursos asignados Hito 3 : Solicitud de Información a las Direcciones de Fiscalización, Estudios y Obras perteneciente a la Subsecretaria de Obras Publica. 5.- Se registra el devengado correspondiente al mes de Septiembre, se anexa Cedula Presupuestaria.	Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	05/10/2022 - 08:57 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Espejo
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo
4	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Orellana
5	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > La Mana
6	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Saquisilí
7	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos
8	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
9	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pajan
10	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Santa Ana
12	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Chillanes
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
15	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
19	Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas
20	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque
21	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Quevedo
22	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
23	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
24	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
25	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
26	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
27	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
28	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
29	Zona 8 - DMG > Guayas > Samborombon
30	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Firma de convenio Interinstitucional	Z - Compromiso Ministerial	09/12/2014		09/12/2014		Sí	10.0
2	PLANEACION: Identificación de recursos asignados	9-Entregables Formales	20/12/2014		20/12/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de estudios	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de fiscalización	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Solicitud de información de contratos de obras	1-Solicitud de Información	20/09/2022		20/09/2022		Sí	2.0
6	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de fiscalización	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0
7	EJECUCION : Determinación de contratos cerrados de obra	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN Determinación de contratos cerrados de estudios	5-Entregables Intermedios	11/10/2022		07/11/2022		Sí	2.0
9	EJECUCIOON : Pago de planillas de avance de obra pendientes, ordenes de cambio, contrato complementario y liquidación de contratos UNIDAD EDUCATIVA SAMANES	5-Entregables Intermedios	24/11/2022		06/12/2022		Sí	2.0
10	EJECUCIOON : Pago de planillas 2 y 3 del contrato complementario para la UNIDAD EDUCATIVA VENTANAS	5-Entregables Intermedios	25/11/2022		06/12/2022		Sí	2.0
11	EJECUCIOM : PAGO DE PLANILLA No. 9 Y 10 CO POR LA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR VENTANAS ZAPOTAL VIEJO	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
12	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (GUAYAS- NARNJITO)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		13/12/2022		Sí	2.0
13	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA- INIAP)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		22/12/2022		Sí	2.0
14	EJECUCION : Levantamiento técnico para cierre de proyectos de construcción unidades educativas estandarizada del milenio - (PICHINCHA-ALOAG)	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		22/12/2022		Sí	2.0
15	EJECUCION : PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	1.0
16	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 DEL CINTRATO COMPLMRNTARIO N° 3 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
17	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 2 ORDEN DE TRABAJO POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NARANJAL -	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	NARANJITO - TARQUI-CHEMIS,							
18	EJECUCION :PAGO DE LA PLANILLA No. 20 Y 21 POR LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILENIO NARANJAL - NARANJITO - TARQUI-CHEMIS	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		02/12/2022		Sí	2.0
19	CIERRE : Firma de actas definitivas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	01/01/2023	30/06/2023			No	10.0
20	EJECUCION : Determinación del estado de contratos pendientes	4-Inicio de Trabajo	30/03/2023	30/05/2023			No	29.0
21	CIERRE : Informe de cierre de proyecto de inversión suscrito	9-Entregables Formales	01/07/2023	26/12/2023			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de informes de monitoreo y control de los procesos .		-	-	-	01/10/2022	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,375,573.63 **
Costo Total:	11,168,856.28
Total Devengado:	5,375,573.63
% Costo Total Devengado:	48.13 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 48.13 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,597,251.53	0.00	0.00	6,597,251.53
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	11,168,856.28	0.00	0.00	11,168,856.28
Ppto. Codificado	6,597,251.53	0.00	0.00	6,597,251.53
Ppto. Comprometido	6,146,825.39	0.00	0.00	6,146,825.39
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	6,597,251.53	0.00	0.00	6,597,251.53
Ppto. Devengado	5,375,573.63	0.00	0.00	5,375,573.63
Pagado Real	5,375,573.63	0.00	0.00	5,375,573.63
Estimado a fin de año	* 5,375,573.63	0.00	0.00	5,375,573.63
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,221,677.90	0.00	0.00	1,221,677.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 81.48 %	0.00 %	0.00 %	81.48 %
Ppto. Codificado 998	1,842,767.26	0.00	0.00	1,842,767.26
Ppto. Devengado 998	1,511,161.70	0.00	0.00	1,511,161.70

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- Incrementar el desarrollo de estudios de Obras Públicas requeridos por las entidades de la administración gubernamental, MEDIANTE la administración y supervisión de los procesos en la fase preparatoria de contratación de obras publicas, bajo la normativa y especificaciones técnicas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Convenio interinstitucional	01._MINEDUC-_CAF-2014-0000075.pdf	08/09/2022
2	A.2.Detalle del proyecto de nueva infraestructura	02._proyecto-nueva-infraestructura.pdf	08/09/2022
3	A.3 Ficha SIPEIP	03.Ficha_Proyecto-91400000.78.6172.pdf	08/09/2022
4	A.4 Solicitud de información a las Direcciones de la SOP	MTOP-DNEOP-2022-1968-ME_(PEDIDO_DE_INFORMACION_).pdf	27/09/2022
5	A.5 CEDULA PRESUPUESTARIA A SEPT 2022 CAMBIO DE PRESUPUESTO CODIFICADO	Cedula_SEPTIEMBRE.pdf	03/10/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	A.6 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE FISCALIZACION - ESTADO DE PROYECTO	01_fisca.rar	01/11/2022
7	A.7 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE OBRAS - ESTADO DE PROYECTO	02_obras.rar	01/11/2022
8	A.8 ENTREGA DE INFORMACION DIRECCION DE ESTUDIOS - ESTADO DE PROYECTO	03_estudios.rar	01/11/2022
9	A.9 RIESGO 1 ACCION 1 : CONSIDERACIÓN DE RECURSOS AL MINEDUC EN EL POA 2023,	MTOP-DNEOP-2022-2294-ME.pdf	01/12/2022
10	B.1 PAGOS UEM VENTANAS	UEM_VENTANAS.rar	05/12/2022
11	B.2 PAGO DE PLANILLAS Y LIQUIDACION UEM SAMANES	UEM_SAMANES.zip	05/12/2022
12	B.3.Reportes - CUR de Ejecución del Gasto - diciembre	Reportes_-CUR_de_Ejecución_del_Gasto_-_diciembre.pdf	04/01/2023
13	B.4 CEDULA DE EJECUCIOM PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE	Nueva_Infraestructura_Educativa_-_Diciembre.pdf	04/01/2023
14	B.5 SOLICITU DE CAMBIO DE ESTADO DE PROYECTO A CONGELADO	INFORME_CONTROL_DE_PROYECTOS_INFRAESTRUCTURA-30-01-2023-signed-signed.pdf	30/01/2023
15	B.6 SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA (SOP), PARA CAMBIO DE FASE DE EJECUCIÓN A CONGELADO PARA FICHAS GPR	Memorando_Congelamiento_MTOP-SOP-2023-0067-ME_(SOP).pdf	03/02/2023
16	B.7 NO INCLUSION EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL MES DE MARZO 2023	CEDULA_DE_MARZO_2023.pdf	03/04/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Estrella Jaramillo, Andres Bayardo	LIDER DE PROYECTO	Servidor Publico 7	aestrella@mtop.gob.ec	
Romero Echeverria, Antonina de los Angeles	DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PUBLICAS	Director/a Nacional Estudios de Obras Públicas	Aaromero@mtop.gob.ec	
Santamaría Loor, Kiura Ninoska	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Subsecretaria de Obras Públicas	ksantamaria@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
150607_1.jpg	28/09/2022
