



Ministerio
de **Transporte**
y **Obras Públicas**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014



ecuador
ama la vida

TEMARIO

- *PROYECTOS DE ARRASTRE Y NUEVOS (OBRAS, CONSULTORÍAS)*
 - *INFRAESTRUCTURA*
 - *CONSERVACIÓN VIAL*
- *CONTRATACIONES*
- *EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA*
- *MATRICULACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS*
- *PESOS Y DIMENSIONES*
- *PATRULLAJE DE CAMINOS*

RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

La Dirección Provincial del Guayas planificó ejecutar en el 2014, entre proyectos de arrastre y nuevos, 44 proyectos ubicados en la provincia del Guayas y Galápagos, teniendo un cumplimiento de avance físico del 72.85% en proyectos de infraestructura, 100.00% en conservación vial y el 100.00% en ejecución de estudios.



RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

Ejecución 2014	
RUBROS	% AVANCE FÍSICO
Infraestructura	72.85
Conservación Vial	100.00
Estudios	100.00
PROMEDIO	90.95

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MANTA - MANAOS: MANTA - QUEVEDO SUBTRAMO 2: FIN DE VARIANTE DE SAN SEBASTIÁN PICHINCHA - EL EMPALME EL CUAL FORMA PARTE DEL EJE TRANSVERSAL E-30, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ

Contratista:	FOPECA S. A.
Fiscalizador:	C.P.R. Asociados.
Monto Contractual:	\$ 18.596.594,88
Fecha de Inicio de Obra:	17 octubre del 2012
Fecha de Terminación Vigente:	22 octubre del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONSTRUCCION DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y DE SERVICIOS UBICADA EN LA AUTOVIA GUAYAQUIL-SALINAS, EN EL SECTOR DE PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS

Contratista:	ADOKASA S.A.
Fiscalizador:	Ing. Alberto Hernández.
Monto Contractual:	\$ 3,272,473.28
Fecha de Inicio de Obra:	26 diciembre del 2012
Fecha de Terminación Vigente:	2 enero del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL PUERTO AZUL EN LA RUTA E-40, TRAMO GUAYAQUIL-CHONGON, UBICADO EN LA ABSCISA 0+800 DE LA VÍA A LA COSTA

Contratista:	MASSUH & MASSUH CONSTRUCCIONES MASCONTRUC
Fiscalizador:	Ing. Teófilo Moncada.
Monto Contractual:	\$ 1,093,753.15
Fecha de Inicio de Obra:	24 enero del 2013
Fecha de Terminación Vigente:	20 marzo del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM 18.5 (NARANJAL-MACHALA) - COMUNA SHUAR (LÍMITE PROVINCIAL) CON UNA LONGITUD DE 7.5 KM INCLUYE PUENTES.

Contratista:	CONSORCIO SHUAR.
Fiscalizador:	CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.
Monto Contractual:	\$ 3,357,657.85
Fecha de Inicio de Obra:	20 febrero del 2013
Fecha de Terminación Vigente:	28 enero del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA UBICADA EN LA RUTA E-40 TRAMOS: CHONGÓN- PARQUE LAGO- CERECITA- PROGRESO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 42.72 KM



Contratista:	GADOLA S.A.
Fiscalizador:	Consulsismica.
Monto Contractual:	\$ 7,802,559.10
Fecha de Inicio de Obra:	15 marzo del 2013
Fecha de Terminación Vigente:	15 julio del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE SERVICIO (IZQUIERDA) GUAYAQUIL CHONGÓN DE 7.82 KM DE LONGITUD Y CICLOVIA DE UNA LONGITUD DE 15.80 KM.

Contratista:	COMPAÑÍA VERDÚ S.A.
Fiscalizador:	DIGECONSA S.A.
Monto Contractual:	\$ 12,508,724.16
Fecha de Inicio de Obra:	12 abril del 2013
Fecha de Terminación Vigente:	03 marzo del 2014
Estado del Proyecto:	En ejecución.



CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLIMES - OLMEDO DE 35.4 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABÍ

Contratista:	COMPAÑÍA VERDÚ S.A.
Fiscalizador:	ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL
Monto Contractual:	\$ 23,639,294.73
Fecha de Inicio de Obra:	12 junio del 2013
Fecha de Terminación de Obra:	12 junio del 2015
Fecha de Terminación del Mantenimiento:	08 junio del 2019
Estado del Proyecto:	En ejecución.




REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA VÍA ACTUAL PLAYAS - DATA POSORJA CON UNA LONGITUD DE 20KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR EL PERIODO TOTAL DE 5 AÑOS.

Contratista:	COMPAÑÍA VERDÚ S.A.
Fiscalizador:	ASOCIACION CEVACONSULT – DIGECONSA.
Monto Contractual:	\$ 12,757,563.03
Fecha de Inicio de Obra:	28 agosto del 2013
Fecha de Terminación de Obra:	26 febrero del 2015
Fecha de Terminación del Mantenimiento:	26 febrero del 2019
Estado del Proyecto:	En ejecución.



CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL UBICADO EN LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL, SECTOR ISLA TRINITARIA JUNTO A LA COOPERATIVA "DE MIRO"

Contratista:	BELLO SABANDO NESDKY GEOVANNY.
Fiscalizador:	Arq. SALAS ARAGUNDI DANIEL ANTONIO.
Monto Contractual:	\$ 572,933.40
Fecha de Inicio de Obra:	21 febrero del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	21 julio del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.

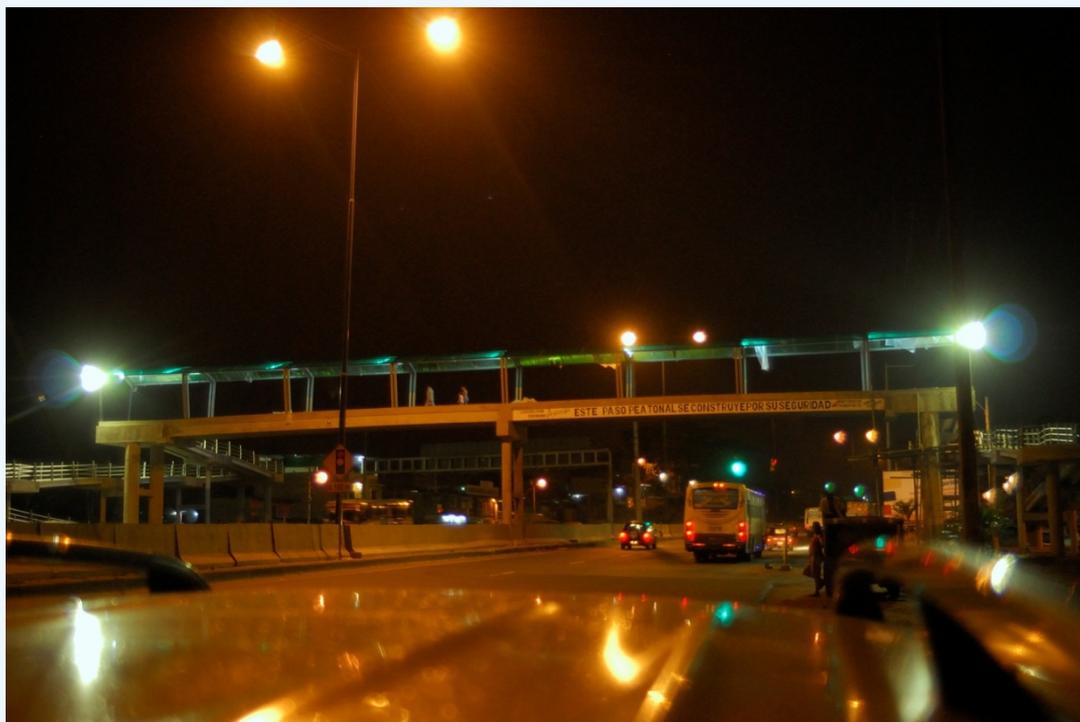

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE PARADEROS DE BUSES EN LAS VÍAS GUAYAQUIL - BABAHOYO Y GUAYAQUIL - MACHALA.



Contratista:	CONSTRUCTORA JUNCO&NOBOA JUNNOSA S.A.
Fiscalizador:	Ing. CALDERON CANAR EDGAR MIGUEL.
Monto Contractual:	\$ 70,941.07
Fecha de Inicio de Obra:	21 febrero del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	05 junio del 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CORRECCIÓN GEOMÉTRICA DE L DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO Y AUMENTO GALIBO PROGRESO

Contratista:	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
Fiscalizador:	Arq. SALAS ARAGUNDI DANIEL ANTONIO.
Monto Contractual:	\$ 3,175,103.57
Fecha de Inicio de Obra:	22 julio del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	02 septiembre del 2015
Estado del Proyecto:	En ejecución.



REHABILITACIÓN Y AMPLICACIÓN DE LA VIA SAN VICENTE-MACUL, LONG. 8KM. INCLUYE PUENTES, UBICADO EN EL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS.

Contratista:	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
Fiscalizador:	Ing. AGUILAR RONQUILLO MARCO ANTONIO.
Monto Contractual:	\$ 4,125,154.59
Fecha de Inicio de Obra:	22 julio del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	02 julio del 2015
Estado del Proyecto:	En ejecución.



CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN CARLOS-LA JOYA-ABDÓN CALDERÓN, UBICADO EN EL CANTÓN BALAO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Contratista:	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.
Fiscalizador:	Ing. JACOME CEVALLOS HERMES AROLD.
Monto Contractual:	\$ 3,612,262.48
Fecha de Inicio de Obra:	22 julio del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	02 julio del 2015
Estado del Proyecto:	En ejecución.



REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL, NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y REMODELACIÓN DEL HANGAR DEL AEROPUERTO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL - PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Contratista:	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.
Fiscalizador:	CEPMONTI S.A.
Monto Contractual:	\$ 7,472,984.54
Fecha de Inicio de Obra:	18 octubre del 2012
Fecha de Terminación Vigente:	28 enero del 2015
Estado del Proyecto:	Finalizada.



REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO AYORA - CANAL DE ITABACA DE UNA LONGITUD DE 39.70 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Contratista:	MOLINA VEGA JOSE GERMANICO.
Fiscalizador:	COMPAÑIA PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA "IPHc"
Monto Contractual:	\$ 9,882,716.84
Fecha de Inicio de Obra:	24 agosto del 2011
Fecha de Terminación Vigente:	31 mayo del 2015
Estado del Proyecto:	En ejecución.



CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO - PROGRESO - PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS.

Contratista:	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.
Fiscalizador:	INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES.
Monto Contractual:	\$ 10,028,373.69
Fecha de Inicio de Obra:	22 abril del 2013
Fecha de Terminación Vigente:	06 abril del 2015
Estado del Proyecto:	En ejecución.



PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS CARRETERA E-40 , TRAMO: GUAYAQUIL - SANTA ELENA

Contratista:	COMPAÑÍA VERDÚ S.A.
Fiscalizador:	ASOCIACION INTEGRAL - INDETEC
Monto Contractual:	\$ 26'778,672.84
Fecha de Inicio de Obra:	10 noviembre del 2010
Fecha de Terminación Vigente:	31 Octubre 2014
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO VIAL QUE INCLUYE LOS CUATRO PUNTES QUE UNEN DURÁN - LA PUNTILLA - GUAYAQUIL DENOMINADO PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL.


Contratista:	CONSTRULIMPIO S.A.
Fiscalizador:	Arq. SALAS ARAGUNDI DANIEL ANTONIO
Monto Contractual:	\$ 245.487,60
Fecha de Inicio de Obra:	21 enero del 2014
Fecha de Terminación Vigente:	20 enero de 2015
Estado del Proyecto:	Finalizado.



CONTRATACIONES A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

CONTRATACIONES

En el año 2014 se elevaron al Portal de Compras 15 Procesos de los cuales 2 se han declarado desiertos, 1 se ha cancelado y 12 procesos se han adjudicado, por un valor de Cuatro millones quinientos diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 4'517.689,34).



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014

- *El valor comprometido entre proyectos de arrastre y proyectos nuevos para el año 2014 fue de USD \$ 97'381.637,93 y el valor devengado en este período fue de USD \$ 95'862.288,40; los valores entregados como anticipo son de USD \$ 4'909.427,41, es decir que se ha cancelado en el año 2014 el valor de USD \$ 97'381.637,93; existiendo un porcentaje de cumplimiento económico durante este año del 98.34% del programado, como se demuestra en el siguiente Cuadro de Ejecución de Gastos:*

MINISTERIO DE FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

PRESUPUESTO	VALOR
MODIFICADO	\$ 97,479,933.22
CODIFICADO	\$ 97,479,933.22
COMPROMETIDO	\$ 97,381,637.93
DEVENGADO	\$ 95,862,288.40
ANTICIPOS PAGADO	\$ 4,909,427.41

MATRICULACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

MATRICULACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

- *En la Dirección Provincial del Guayas se han matriculado 2.223 equipos y/o maquinarias durante el año 2014.*
- *Los valores recabados por Matriculación de Equipos y/o Maquinarias es de USD \$ 306.516,46 y por multas USD \$ 231.551,14; lo que da un valor total de recaudación de USD \$ 538.067,60.*

PESOS Y DIMENSIONES

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS

- *En el Departamento de Pesos y Dimensiones durante el período correspondiente al año 2014 de han generado Certificados de Operación por un valor de USD \$ 261.188,00 ; Y 489 vehículos fueron citados por no cumplir con las dimensiones y/o cargas permitidas.*

PATRULLAJE DE CAMINOS



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
