

Ministerio
de **Transporte**
y **Obras Públicas**

DIRECCION PROVINCIAL MTOP COTOPAXI

RENDICION DE CUENTAS

2014

VIA JAMBELI LATACUNGA AMBATO



“Trabajo en equipo, calidad, integración, coordinación”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), se maneja a través de un esquema coordinado, en el que el acceso a los servicios y a la información, son las principales aristas de un grupo de valores que enriquecen el trabajo diario de esta cartera de Estado.

En este sentido, tanto autoridades como empleados, son el fiel reflejo de un trabajo en equipo y a conciencia, que busca el más alto nivel de calidad. Somos más fuertes juntos, por lo que la integración es nuestra fórmula para conseguir el éxito. Solidarios, confiables y convencidos de que la gestión del sistema de transportación multimodal a nivel país, es nuestra responsabilidad, nos enfrentamos al reto diario de la excelencia.

ANILLO VIAL SALCEDO



Valores

Apertura: Admitir nuevas ideas, propuestas y enfoques, que nos permitan enriquecernos y mejorar el servicio a la ciudadanía.

Calidad: Hacer correctamente nuestro trabajo desde el inicio.

Eficiencia: Lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado, mejorando la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.

Eficacia: Optimizar el uso racional de los medios con que contamos para alcanzar un objetivo predeterminado; mejorando la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.

Honestidad: Siempre pensar, hablar y actuar con simpatía a lo correcto y la verdad.

Lealtad: Cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores Institucionales, por encima de nuestros intereses personales.

Mejora Continua: Siempre buscar fortalecer y mejorar nuestro trabajo.

Servicio: Brindar a la ciudadanía servicios que les permita vivir mejor socialmente.

Solidaridad: Hacer nuestras las necesidades de formación e información.

Probidad

Lealtad

Vocación de servicio

Responsabilidad

Disciplina

Prudencia

Honestidad

Misión

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País.

Visión

Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y Calidad.

DIRECCION PROVINCIAL MTOP COTOPAXI

PROVINCIA DE COTOPAXI:

CANTON: LATACUNGA

PARROQUIA: IGNACIO FLORES


Calle: GABRIELA MISTRAL 42-33 Y SANCHEZ DE ORELLANA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO



ESTADO ACTUAL

PLANO

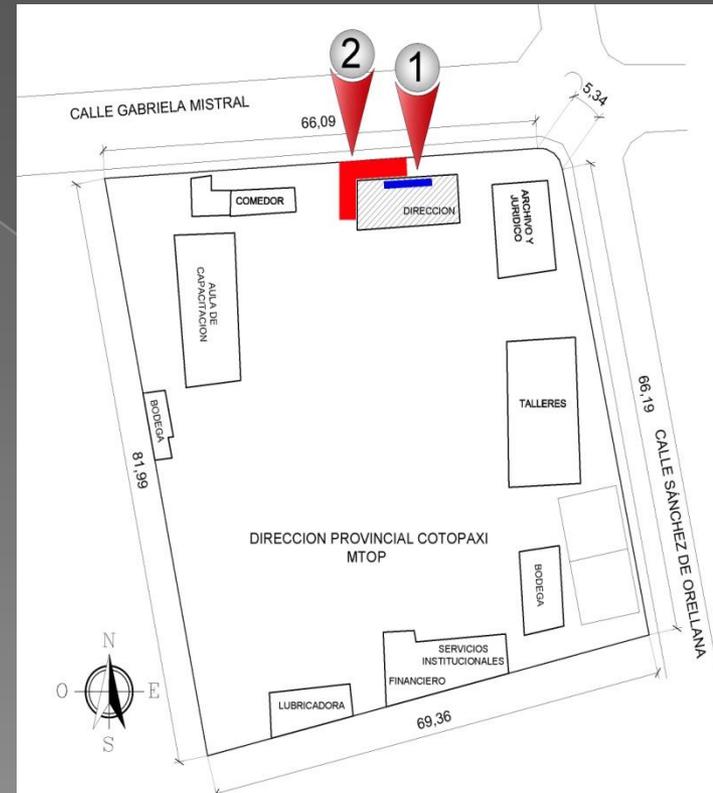

OBRAS PROVINCIA DE COTOPAXI

Anillo Vial Salcedo

Longitud : 9+800 km

Contratista : Imbavial Empresa Pública

Monto: 10'850.036.10 dólares

Fiscalización Contratada: Asociación Consulnac – RHV

Monto: 726.108.22 dólares



Construcción del colector principal de Alcantarillado 7+762-7+800




Construcción de acometidas domiciliarias
7+300-7+762



Colocación de sub base



Colocación de base

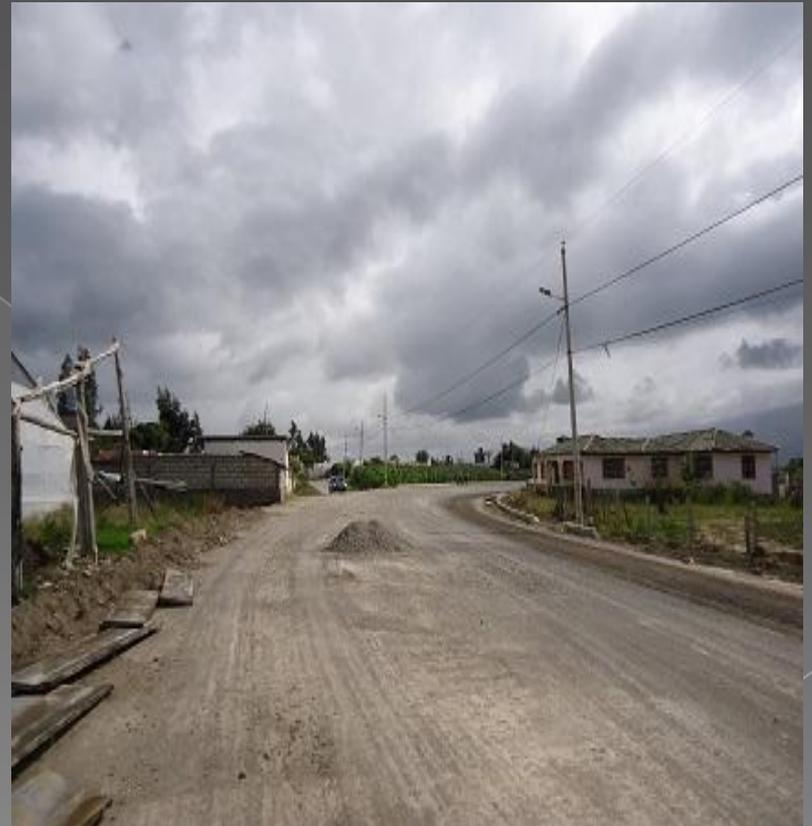

Ampliación a seis carriles de la carretera Jambelí – Latacunga - Ambato

Longitud : 90 Km

Contratista : Panavial S. A.

Monto : 197'680.868,93 dólares

Adenda: 219'900.000,00 dólares

Abscisa 92+100 puente Cutuchi 2 Sector acceso al Cotopaxi hacia el sur



Paso lateral de Latacunga



Anexo Fotográfico

Intercambiador Latacunga está terminado y se encuentra la nivelación de la tierra para las áreas verdes, se encuentra en funcionamiento.



Anexo Fotográfico

En el Acceso al Aeropuerto de Latacunga está colocado la carpeta asfáltica, se tiene realizado la señalización horizontal, vertical se encuentra colocado semáforos, se encuentra terminado y está en funcionamiento



Rehabilitación y mantenimiento de la vía Quilotoa Chugchilan
Longitud 18.64 km
Monto : 17'989.635.65 dólares .
Contratista : Becerra Cuesta .
Fiscalización: Trazados S.A
Monto: 443.300,00 dólares.

Construcción de obras de arte



Construcción de muro de hormigón armado



Cunetas de hormigón simple (lado derecho) se encuentra construido hasta la abscisa 16+950, avance físico 90%, falta por ejecutar los sectores correspondientes al muro 15+800 y en la alcantarilla en la abscisa 2+540 hasta la abscisa 2+940 (L=350



Mantenimiento de la vía Latacunga la Mana.
Monto : 817.864.01 dólares
Contratista : Becerra Cuesta .

Limpieza de cunetas



ESTUDIOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA

ESTUDIOS QUE SE EJECUTAN EN LA PROVINCIA SUPERVISOR A CARGO DEL ING. ORLANDO MEZA				
DESCRIPCIÓN	LONGITUD	MONTO DE ESTUDIO	MONTO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMADO	ESTADO ACTUAL
Sigchos-Chugchilan	24.00 km	448.931,00	20'000.000,00	Terminado, se va a proceder con el acta única de recepción
Sigchos-Las Pampas-Alluriquin	84.00 km	2'364.026,80	137'000.000,00	Revisión en supervisión
Estudios de vías del programa del Buen Vivir en territorios rurales	46.70 km	346.847,56	13'614.598,32	Revisión en Supervisión
Acceso al Boliche	4.00km	150.590,00	3'848.252,73	Revisión en Supervisión
Acceso al Machachi	21.8km	345.054,81	6'240.438,80	Revisión en Supervisión

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA 01				
ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS COMUNICACIÓN VIAL	136,261.06	132,161.80	96.99	
PROGRAMA 02				
SOPORTE DE APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				
DIFUSION E INFORMACION	879.73	879.73	100	
PROGRAMA 22				
DISEÑOS ESTUDIOS SUPERVISION VIAL				
FISCALIZACION QUILOTOA CHUGCHILAN	221,650.00	221,650.00	100	
OBRA QUILOTOA CHUGCHILAN	24,301,473.03	24,301,473.00	100.00	
ESTUDIOS SAN FELIPE PUJILI	278,166.47	278,166.47	100	
ESTUDIOS LAS PAMPAS ALLURIQUIN	1,102,108.84	1,065,421.33	96.67	
PROGRAMA 23				
CONSTRUCCIONES VIALES				
VIA SALCEDO CUMBIJIN PARQUE NACIONAL COTOPAXI	797,017.95	797,017.95	100	
PROGRAMA 24				
DESARROLLO VIAL				
FISCALIZACION ANILLO VIAL SALCEDO	277,975.22	277,975.22	100	
EXPROPIACIONES ANILLO VIAL SALCEDO	207,617.59	207,617.59	100	
OBRA ANILLO VIAL SALCEDO	1,404,494.18	1,404,494.18	100	
PROGRAMA 25				
MANTENIMIENTO VIAL				
SERVICIO DE VIGILANCIA	84,608.00	53,424.00	63.14	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,322.33	16,322.33	100	
VEHICULOS	9,594.83	9,594.83	100	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,021.98	31,021.98	100	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	5,963.63	5,963.63	100	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,308.46	61,308.46	100	
PROGRAMA 33				
PLAN RELAMPAGO				
OBRA LATAACUNGA LA MANA	5,985,121.31	5,985,121.31	100	
EXPROPIACIONES LATAACUNGA LA MANA	29,777.46	29,777.46	100	
AUDITORIA TECNICA LATAACUNGA LA MANA	10,183.50	10,183.50	100	
FISCALIZACION LATAACUNGA LA MANA	103,810.34	103,810.34	100	
OBRA JAMBELI LATAACUNGA AMBATO	52,625,526.52	52,559,926.57	99.88	
EXPROPIACIONES JAMBELI LATAACUNGA AMBATO	850,182.23	847,377.22	99.67	
REAJUSTE DE PRECIOS AEROPUERTO LATAACUNGA	1,136,100.06	1,136,100.06	100	
MANTENIMIENTO CULAGUANGO BELISARIO QUEVEDO	31,126.80	31,126.80	100	
TOTAL AÑO 2014	89,708,291.52	89,567,915.76	99.84	

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA 01 Y 02				
GASTOS CORRIENTES	137.140,79	133.041,53		
PROGRAMA 25				
MANTENIMIENTO VIAL	208.819,23	177.635,23		
PROGRAMA 22,23,24,33				
GASTOS DE INVERSION	89.362.331,50	89.257.239,00		
TOTAL	89.708.291,52	89.567.915,76	99,84	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS año 2014

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía			157	84,569.23	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación	1	17,989,635.65			
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	37,939.71			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	50,000			
Lista corta	1	353,750.00			
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	23,965.48			
Catálogo Electrónico	3	2,900			
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

**PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES
DE LA DIRECCION PROVINCIAL MTOP-C**



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO POR:

NOMBRE	CARGO
ING. JAVIER CASTELLANO	DIRECTOR PROVINCIAL MTOP-C
ING. RAMIRO VARGAS	SUPERVISOR DE OBRAS
ING. CESAR FLORES	SUPERVISOR DE OBRAS
ING. ORLANDO MEZA	SUPERVISOR DE OBRAS
ING. WAGNER IBARRA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)
DR. MILTON JIMENEZ	SUPERVISOR RECURSOS HUMANOS
ING. GEOVANNA ORTEGA	SUPERVISORA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

