



Ministerio  
de **Transporte**  
y **Obras Públicas**

# RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

## DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS


# GUAYAS Y GALÁPAGOS

- PROYECTOS NUEVOS Y DE ARRASTRE
- CONTRATACIONES
- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- MATRICULACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
- CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES
- PATRULLAJE DE CAMINOS

# RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

*La Dirección Provincial del Guayas planificó ejecutar en el 2015, 18 proyectos ubicados en la provincia del **Guayas y Galápagos**.*

Proyectos  
Nuevos y  
de Arrastre

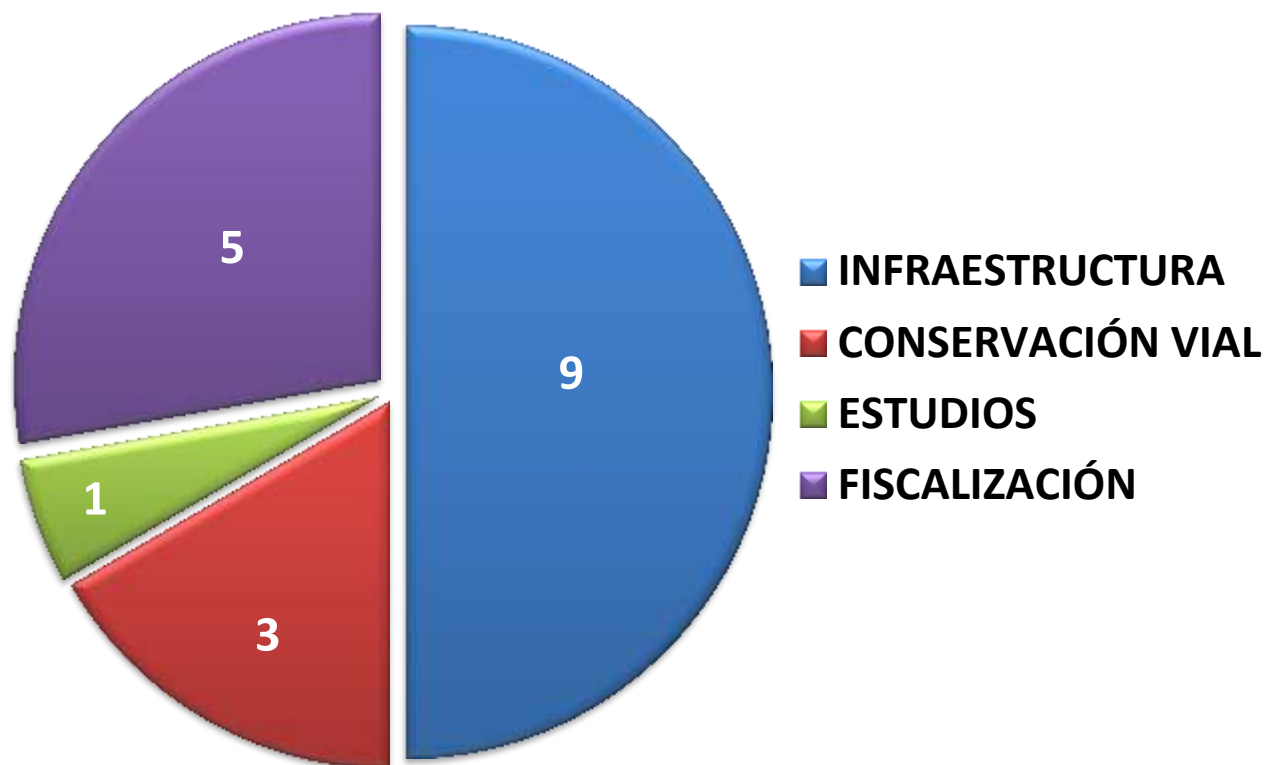

*La Dirección Provincial del Guayas logró un promedio de ejecución del 78,8 % en el periodo 2015.*

| <b>Ejecución 2015</b> |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Rubros</b>         | <b>% Avance físico</b> |
| Infraestructura       | 84.5                   |
| Conservación Vial     | 100                    |
| Estudios              | 52                     |
| <b>Promedio</b>       | <b>78,8</b>            |

# PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

# REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO AYORA - CANAL DE ITABACA DE UNA LONGITUD DE 39.70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

•**Contratista:**

MOLINA VEGA JOSE GERMANICO.

•**Fiscalizador:**

COMPAÑIA PABLO HERRERA  
ALVAREZ CONSULTORA "IPHc"

•**Monto Contractual:**

\$ 9,882,716.84

•**Fecha de Inicio de Obra:**

24 agosto del 2011

•**Fecha de Terminación Vigente:**

28 octubre del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Suspendida (Avance físico 77%)



# REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL, NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y REMODELACIÓN DEL HANGAR DEL AEROPUERTO DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL - PROVINCIA DE GALÁPAGOS

•**Contratista:**

OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.

•**Fiscalizador:**

CEPMONTI S.A.

•**Monto Contractual:**

\$ 7,831,859.09

•**Fecha de Inicio de Obra:**

18 octubre del 2012

•**Fecha de Terminación Vigente:**

27 junio del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizada e inaugurada.



# CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO - PROGRESO - PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS.

•**Contratista:**

OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.

•**Fiscalizador:**

INTEGRAL INGENIEROS  
CONSULTORES.

•**Monto Contractual:**

\$ 10,508,750.32

•**Fecha de Inicio de Obra:**

22 abril del 2013

•**Fecha de Terminación Vigente:**

06 junio del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizada e inaugurada.





# CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE SERVICIO (IZQUIERDA) GUAYAQUIL ? CHONGÓN DE 7.82 KM DE LONGITUD Y CICLOVIA DE UNA LONGITUD DE 15.80 KM.

•**Contratista:**

COMPAÑÍA VERDÚ S.A.

•**Fiscalizador:**

DIGECONSA S.A.

•**Monto Contractual:**

\$ 13,143,034.55

•**Fecha de Inicio de Obra:**

12 abril del 2013

•**Fecha de Terminación Vigente:**

02 junio del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizado.



# CORRECCIÓN GEOMÉTRICA DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO Y AUMENTO GALIBO PROGRESO

•**Contratista:**

SINOHYDRO CORPORATION  
LIMITED.

•**Fiscalizador:**

ARQ. SALAS ARAGUNDI DANIEL  
ANTONIO - MTOP

•**Monto Contractual:**

\$ 3,175,103.57

•**Fecha de Inicio de Obra:**

22 julio del 2014

•**Fecha de Terminación Vigente:**

31 marzo del 2016

•**Estado del Proyecto:**

En ejecución (Avance físico 45 %).



# REHABILITACIÓN Y AMPLICACIÓN DE LA VIA SAN VICENTE-MACUL, LONG. 8KM. INCLUYE PUENTES, UBICADO EN EL CANTON BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS.

•**Contratista:**

SINOHYDRO CORPORATION  
LIMITED.

•**Fiscalizador:**

ING. AGUILAR RONQUILLO  
MARCO ANTONIO - MTOP

•**Monto Contractual:**

\$ 4,125,154.59

•**Fecha de Inicio de Obra:**

22 julio del 2014

•**Fecha de Terminación Vigente:**

31 marzo del 2016

•**Estado del Proyecto:**

En ejecución (Avance físico 68 %).



# CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN CARLOS-LA JOYA-ABDÓN CALDERÓN, UBICADO EN EL CANTÓN BALAO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

•**Contratista:**

SINOHYDRO CORPORATION  
LIMITED.

•**Fiscalizador:**

ING. DE FRANC ARSELLES  
VICENTE

•**Monto Contractual:**

\$ 3,612,262.48

•**Fecha de Inicio de Obra:**

22 julio del 2014

•**Fecha de Terminación Vigente:**

31 marzo del 2016

•**Estado del Proyecto:**

En ejecución (Avance físico 68 %).





# MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA VÍA E25, TRAMOS: NARANJAL- RIO SIETE- "Y" DEL CAMBIO DE 83 KM. DE LONGITUD, PROVINCIAS DEL GUAYAS, AZUAY Y EL ORO.

•**Contratista:**

COMPAÑIA VERDU S.A.

•**Fiscalizador:**

ING. AGUILAR RONQUILLO  
MARCO ANTONIO - MTOP

•**Monto Contractual:**

\$ 5'499,714.52

•**Fecha de Inicio de Obra:**

21 abril del 2015

•**Fecha de Terminación Vigente:**

20 junio del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizado.



# INTERVENCIÓN EMERGENTE, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO BONITO EN EL CANTÓN EL GUABO Y PUENTE SOBRE RÍO GUANACHE EN EL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ UBICADOS EN LA CARRETERA E-25, TRAMO NARANJAL - MACHALA, PROVINCIAS DE GUAYAQUIL Y EL ORO.

•**Contratista:**

PATE C.A.

•**Fiscalizador:**

ING. JOSÉ AGUSTO BRIONES.

•**Monto Contractual:**

\$ 1'384,389.83

•**Fecha de Inicio de Obra:**

15 mayo del 2015

•**Fecha de Terminación Vigente:**

15 octubre del 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizado.



\* Fuente: SITOP

# PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL

# CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLIMES - OLMEDO DE 35.4 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABÍ.

•**Contratista:**

COMPAÑÍA VERDÚ S.A.

•**Fiscalizador:**

ASESORES Y CONSULTORES DEL  
LITORAL

•**Monto Contractual:**

\$ 28'488,290.79

•**Fecha de Inicio de Construcción Vía:**

12 junio del 2013

•**Fecha de Terminación Construcción Vía:**

30 junio del 2015

•**Fecha de Terminación del  
Mantenimiento:**

27 mayo del 2019

•**Estado del Proyecto:**

En mantenimiento por niveles de servicio.





# REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA VÍA ACTUAL PLAYAS - DATA - POSORJA CON UNA LONGITUD DE 20KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR EL PERIODO TOTAL DE 5 AÑOS.

•**Contratista:**

COMPAÑÍA VERDÚ S.A.

•**Fiscalizador:**

ASOCIACION CEVACONSULT –  
DIGECONSA.

•**Monto Contractual:**

\$ 14'695,449.11

•**Fecha de Inicio Rehabilitación Vía:**

28 agosto del 2013

•**Fecha de Terminación Rehabilitación Vía:**

27 marzo del 2015

•**Fecha de Terminación del Mantenimiento:**

28 marzo del 2019

•**Estado del Proyecto:**

En mantenimiento por niveles de servicio.



# CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO VIAL QUE INCLUYE LOS CUATRO PUENTES QUE UNEN DURÁN - LA PUNTILLA - GUAYAQUIL, DENOMINADO PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL.

•**Contratista:**

CONSTRULIMPIO S.A.

•**Fiscalizador:**

ARQ. SALAS ARAGUNDI DANIEL  
ANTONIO - MTOP

•**Monto Contractual:**

\$ 327,316.80

•**Fecha de Inicio de Obra:**

21 enero del 2014

•**Fecha de Terminación Vigente:**

21 mayo de 2015

•**Estado del Proyecto:**

Finalizado.



# TRABAJOS EN PARQUE SAMANES POR VISITA PAPAL

# TRABAJOS EJECUTADOS

*Mediante **decreto ejecutivo, 633** del 29 de abril del 2015, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declaró de interés nacional la visita del Papa, la misma que se realizó los días 6, 7 y 8 de julio del 2015.*

## TRABAJOS EJECUTADOS

Adecuación del área, nivelación del terreno, corte, relleno y compactación, colocación de tuberías PVC para fibra óptica, relleno con base, asfaltado en área de discapacitados, canales de drenaje.

Colocación y desmontaje de adoquines

Señalización e instalación de 327 Letreros



# ESTADO INICIAL



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas



# RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO







# TERRAPLÉN PARA RECORRIDO DEL PAPA





# COLOCACIÓN DE ADOQUINES





Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

*Ecuador  
ya cambia*

# ASFALTADO DE BLOQUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD






# CONTRATACIONES A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

# CONTRATACIONES

*En el año 2015 se elevaron al Portal de Compras Públicas 10 Procesos, de los cuales 4 se declararon desiertos y 6 fueron adjudicados, con un presupuesto referencial de siete millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos trece con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 7,789,213.80 ).*

**Procesos elevados al  
Portal de Compras Publicas**

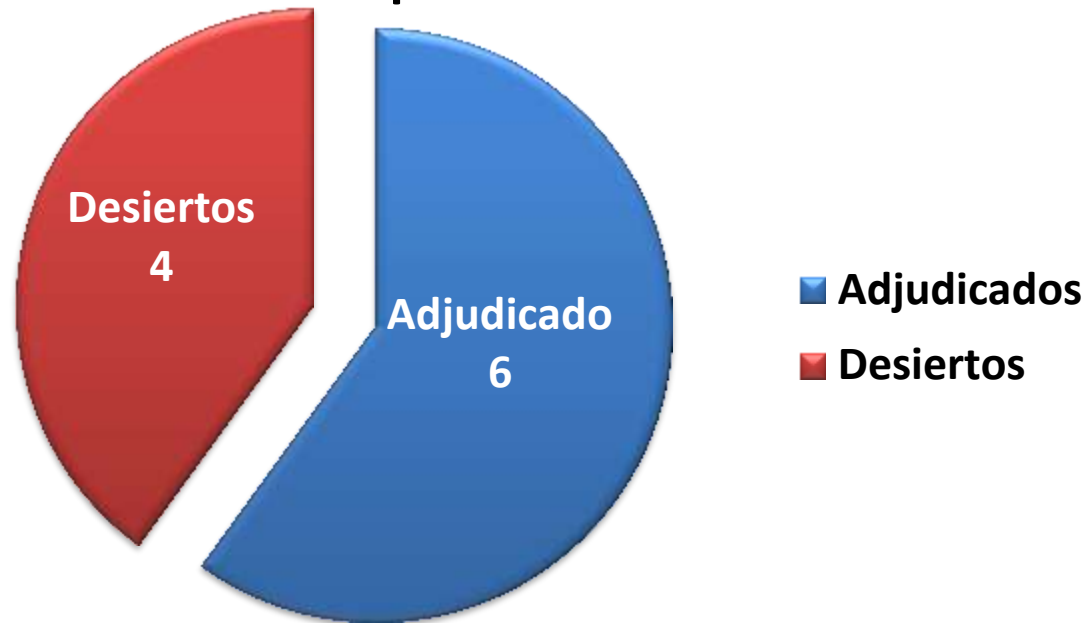

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015

-El valor asignado para **gasto corriente** fue de USD \$ 84,953.00.

-Para proyectos de arrastre y nuevos, el valor **codificado** fue de USD \$ 64'287,035 y el valor **devengado** en este período fue de USD \$ 60'405,275.67, existiendo un porcentaje de ejecución presupuestaria del **93.96 %**, como se demuestra en el siguiente Cuadro de [Ejecución](#).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015\*

| PRESUPUESTO      | VALOR         |
|------------------|---------------|
| ASIGNADO         | \$ 84,953     |
| CODIFICADO       | \$ 64'287,035 |
| COMPROMETIDO     | \$ 62'231,921 |
| DEVENGADO        | \$ 60'405,275 |
| ANTICIPOS PAGADO | \$ 5'505,048  |



# MATRICULACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

# MATRICULACIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA

-En la Dirección Provincial del Guayas se han matriculado **2.222** equipos y/o maquinarias durante el año 2015.

-Los valores recaudados por Matriculación de Equipos y/o Maquinarias es de **USD \$ 261,776.76** y por multas es **USD \$ 125,435.16**, dando un total recaudado de **USD \$ 387,211.92**

| REPUBLICA DEL ECUADOR<br>MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS |  | CLASE:                              |  | MARCA:                 |  | MODELO:                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------|--|
| AÑO:                                                               |  | SERIE CHASIS:                       |  | AÑO FABRI:             |  |                                          |  |
| MATRÍCULA:                                                         |  | MOTOR:                              |  | NÚMERO:                |  | POTENCIA:                                |  |
| PROPIETARIO:                                                       |  | SUBSECRETARIO DEL<br>MTO-REGIONAL S |  | DIRECTOR<br>PROVINCIAL |  | COORDINADOR DE GESTIÓN<br>DEL TRANSPORTE |  |
| CÉDULA/RUC:                                                        |  | FECHA DE EMISIÓN:                   |  | CADUCA:                |  |                                          |  |
| TELÉFONO:                                                          |  | AVALÚO:                             |  | CONDICIÓN:             |  |                                          |  |
| DIRECCIÓN:                                                         |  |                                     |  |                        |  |                                          |  |
| CIUDAD:                                                            |  |                                     |  |                        |  |                                          |  |

# CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES

# CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS

| Documento                                                | Cantidad | Recaudación      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Certificado Operación Regular                            | 4292     | \$170,596        |
| Certificado de Operación Especial por Peso y Dimensiones | 130      | <i>\$13,000</i>  |
| Citaciones                                               | 410      | \$41,000         |
| <b><u>TOTAL</u></b>                                      |          | <b>\$224,596</b> |


# PATRULLAJE DE CAMINOS



# Patrulla de Caminos

*La Dirección Provincial del Guayas, cuenta con 2 patrullas de caminos que son las encargadas de recorrer los 857,53 km de la red estatal de la Provincia del Guayas.*



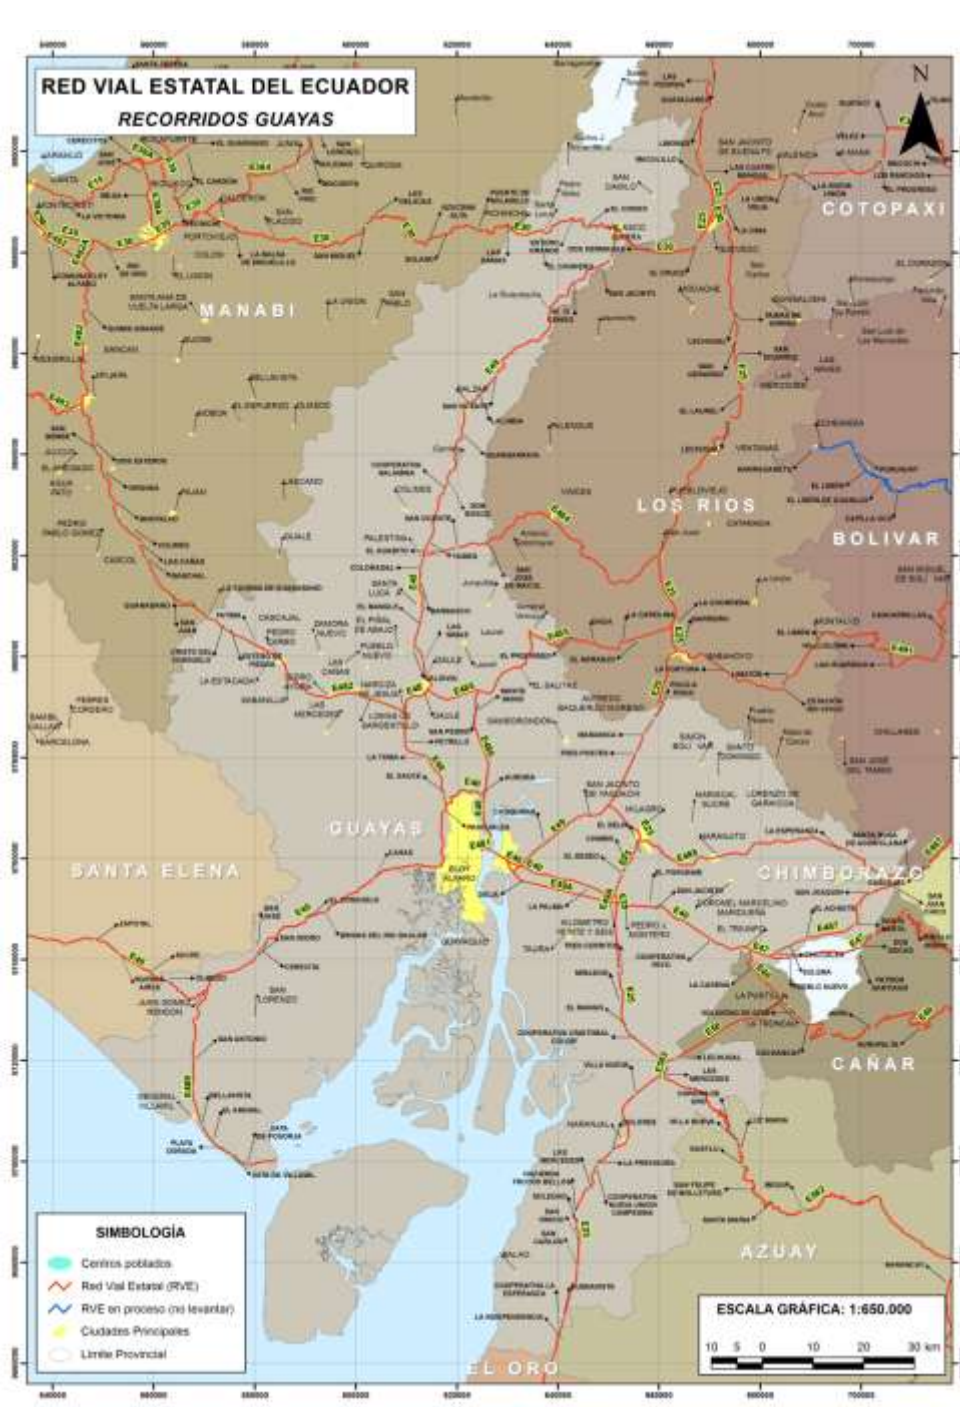

| CARRETERA                                                                             | UBICACIÓN | LONGITUD Kms. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| LIMITE LOS RIOS-T MILAGRO-MILAGRO-BOLICHE                                             | E25       | 43.78         |
| BOLICHE- KM. 27-TAURA-PTO. INCA- NARANJAL                                             | E25       | 56.72         |
| NARANJAL-ENTRADA ESPERANZA-LIMITE GUAYAS-EL ORO                                       | E25       | 44.27         |
| LIM(GYE-LOS RIOS)-EMPALME                                                             | E30       | 2.96          |
| EMPALME-PICHINCHA                                                                     | E30       | 24.00         |
| PROGRESO-KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO                                               | E40       | 40.30         |
| KM 19.4 VIA GUAYAQUIL/PROGRESO-GUAYAQUIL                                              | E40       | 17.15         |
| PERIMETRAL DE GUAYAQUIL (VIA A LA COSTA-VIA A DAULE/LOOP NOR OCCIDENTAL)              | E40       | 12.78         |
| PERIMETRAL DE GUAYAQUIL. (VIA DAULE-LA AURORA-LA PUNTILLA/LOOP NORTE Y LOOP ORIENTAL) | E40       | 22.06         |
| LA PUNTILLA-DURAN (PUENTE RMA)                                                        | E40       | 2.00          |
| DURAN-BOLICHE                                                                         | E40       | 27.72         |
| BOLICHE-EL TRIUNFO-M.J. CALLE                                                         | E40       | 32.02         |
| EMPALME-NOBOL-PASCUALES                                                               | E48       | 146.26        |
| DURAN-YAGUACHI-EMP E25                                                                | E49       | 23.78         |
| DURAN-KM. 26- BOLICHE                                                                 | E49A      | 27.99         |
| PUERTO INCA-PANCHO NEGRO (LIMITE GUAYAS-CAÑAR)                                        | E58       | 7.16          |
| GUAYAQUIL-LA PUNTILLA                                                                 | E481      | 1.70          |
| LIMITE GUAYAS-MANABI-NOBOL                                                            | E482      | 46.27         |
| LIMITE GUAYAS-LOS RIOS-PALESTINA                                                      | E484      | 13.98         |
| DAULE-SALITRE                                                                         | E485      | 21.22         |
| SALITRE-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS                                                        | E485      | 18.00         |
| T DE SALITRE-LA AURORA                                                                | E486      | 21.87         |
| EL TRIUNFO-BUCAY-LIMITE CAÑAR                                                         | E487      | 27.26         |
| CUMANDA-EMPALME BUCAY-EL TRIUNFO                                                      | E487      | 33.35         |
| MILAGRO-NARANJITO                                                                     | E488      | 16.39         |
| NARANJITO-BUCAY                                                                       | E488      | 41.35         |
| PROGRESO-PLAYAS                                                                       | E489      | 26.50         |
| PLAYAS-POSORJA                                                                        | E489      | 23.30         |
| COLIMES-OLMEDO                                                                        | S/N       | 35.40         |
| <b>TOTAL PROVINCIA</b>                                                                |           | <b>857.53</b> |

# GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
