



Ministerio
de **Transporte**
y **Obras Públicas**

SUBSECRETARÍA ZONAL 7

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
CHINCHIPE**

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2015

Ing. Jhon Fernando Pesantez Jiménez
DIRECTOR PROVINCIAL





CONSTRUCCIONES





OBRAS



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA VILCABAMBA-BELLAVISTA (E682)

UBICACIÓN: Provincias de Loja y Zamora Chinchipe formando parte del cuarto eje vial (E682).
Tramo Vilcabamba–Valladolid – Palanda–Bellavista

Longitud 101,79 Km.

Contratista: TECNICA GENERAL CONSTRUCCIONES S.A.

Fiscalización: MTOP Zamora Chinchipe

MONTO CONTRACTUAL \$ 125.903.912,10



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA VILCABAMBA-BELLAVISTA (E682)

MONTO DEVENGADO EN EL 2015	EN \$ 26.740.981,72
PORCENTAJE EJECUTADO 2015	9,35%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2015	98.00%
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO 2015	99.00%
BENEFICIARIOS	232.063,00 hab. de la provincia de Loja, Zamora Chinchipe (Palanda y Chinchipe)



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA VILCABAMBA-BELLAVISTA (E682)

KILOMETROS EJECUTADOS EN PRINCIPALES RUBROS EN EL AÑO 2015 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

Movimiento de tierras	5 Km.
Afirmados (mejoramiento - sub-base)	4 Km.
Capa de Rodadura de Pavimento Rígido	3 Km.
Cunetas revestidas de hormigón (2 sentidos)	2 Km.



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA VILCABAMBA-BELLAVISTA (E682)



Km. EJECUTADO A LA FECHA	Longitud del Proyecto
98 Km.	101,79 km



OBSERVACIONES

El avance físico es del 98,00% y el económico es del 99 %



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA VILCABAMBA-BELLAVISTA (E682)



OBRAS EMERGENTES VIA LOJA - ZAMORA

Longitud 57, 235 Km.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA RESOLUCIÓN NRO. 079

Contratista: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.
Fiscalización: MTOP Zamora Chinchipe

DETALLE	MONTO	PLAZO
CONTRATO ORIGINAL	6.260.772,92	6 MESES
ORDEN DE CAMBIO No. 01		4 MESES
TOTAL	6.260.772,92	10 MESES

BENEFICIARIOS:

- ❖ **DIRECTOS: 25.510 HAB.**
- ❖ **INDIRECTOS: 240.365 HAB.**



OBRAS EMERGENTES VIA LOJA - ZAMORA

RUBROS:

- ✓ MOVIMIENTOS DE TIERRA
- ✓ DRENAJE
- ✓ CALZADA
- ✓ ESTABILIZACION DE TALUDES
- ✓ IMPACTOS AMBIENTALES



MONTOS EJECUTADOS

MONTO CONTRACTUAL	\$ 6.260.772,92	100%	
MONTO PLANILLADO	\$ 6.260.273,98	99,99%	ABRIL 2015

Avance Físico 85%



OBRAS EMERGENTES VIA LOJA-ZAMORA

INTERVENCIÓN EN SECTORES MAS CRÍTICOS O PRIORITARIOS:

Km. 6+700 : muros y obras de drenaje

Km. 10+870: muros y obras de drenaje

Km. 19+100: estabilización de talud

Km. 20+700: construcción de muro.

Km. 21+405: estabilización de talud y obras de drenaje

Km. 24+380 y km 24+500 : escollera, reposición del pavimento y canales de encauzamiento

Km. 38+600 construcción de variante, obras de drenaje, reposición de pavimento rígido.

Km . 44+135 construcción de variante, obras de drenaje, reposición de pavimento rígido

Km. 30+500 construcción de escollera.





VIDEO

OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

CONTRATISTA: CIA. VERDU.
FISCALIZACION: MTOP ZAMORA

**AVANCE
FISICO
60%**



BENEFICIARIOS: 91,376 hab.

- **INICIO: 20/11/2015**
- **TERMINO: 03/04/2016**

INVERSIÓN: \$ 777.359,76

- **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PITA**
- **11 ESTABILIZACIONES DE TALUDES**
- **2 CALCES DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA DE CHIMBUTZA Y CAYAMATZA**





ESTUDIOS



Estudios de consultoría para obras civiles y proyectos viales

VIA ZAMORA – ROMERILLOS ALTO

VIGENCIA CONTRATO	DEL	19/07/2013 HASTA 18/09/2014
LONGITUD		27 km
BENEFICIARIOS		COMUNIDADES SANTA ELENA, JAMBOE BAJO, JAMBOE ALTO, LA PITUCA, NUMBAMI, SAKANTZA, SANTA CECILIA, EL PAILON, ROMERILLOS BAJO Y ROMERILLOS ALTO. DIRECTOS: 960 Hb. INDIRECTOS: 13.387 Hb.
MONTO CONTRACTUAL		\$ 213.294,04
AVANCE FÍSICO		100%
AVANCE ECONÓMICO 2015		0%
SITUACION ACTUAL		Los estudios se encuentran terminados, se encuentran en etapa de revisión y aprobación final.



Estudios de consultoría para obras civiles y proyectos viales

VIA PALANDA – LA CANELA

VIGENCIA CONTRATO	DEL	19/07/2013 HASTA 13/03/2015
LONGITUD		43 km
MONTO CONTRACTUAL		\$ 344.035,58
AVANCE FÍSICO		100%
AVANCE ECONÓMICO 2015		47,83%
BENEFICIARIOS		COMUNIDADES SAN FRANCISCO , EL PORVENIR DEL CARMEN, LA MINA, NUMBALA,LA CRUZ, SANTA CLARA DIRECTOS: 1.673 Hb. INDIRECTOS: 8.089 Hb.
SITUACION ACTUAL		Los estudios se encuentran terminados, se encuentran en etapa de revisión y aprobación final.



Estudios de consultoría para obras civiles y proyectos viales

VIA NANGUIPA BAJO – SAN JOSÉ

LONGITUD	10.4 km
VIGENCIA DEL CONTRATO	18/10/2013 HASTA 27/01/2014
MONTO CONTRACTUAL	\$ 78.000,58
AVANCE FISICO	100%
AVANCE ECONOMICO 2015	61%
BENEFICIARIOS	COMUNIDADES ZUMBI, NANGUIPA BAJO, SAN JOSE
SITUACION ACTUAL	Los estudios se encuentran terminados, se encuentran en etapa de revisión y aprobación final.

CONSERVACIÓN VIAL



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAL

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LONGITUD	152,02 KM
UBICACIÓN:	E682, E50, E45 Zamora Chinchipe.
BENEFICIARIOS	91.376 Hab. de Zamora Chinchipe y provincias vecinas de Loja y Morona Santiago
MONTO INVERTIDO EN EL 2015	\$ 922.761,16
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA LOJA-ZAMORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- Limpiezas de derrumbes
- Estabilización de talud
- Limpieza de alcantarillas
- Limpieza de señalética vertical



Maquinaria Propia del MTOP Zamora



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA LOJA-ZAMORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA


BELLAVISTA – LA Balsa POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



**VÍA E50 LOJA –ZAMORA
123 EVENTOS
ATENDIDOS**

**VÍA E45 ZAMORA-
CHUCHUMBLETZA
190 EVENTOS ATENDIDOS**

**VÍA 682 VILCABAMBA-
BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA
211 EVENTOS ATENDIDOS**

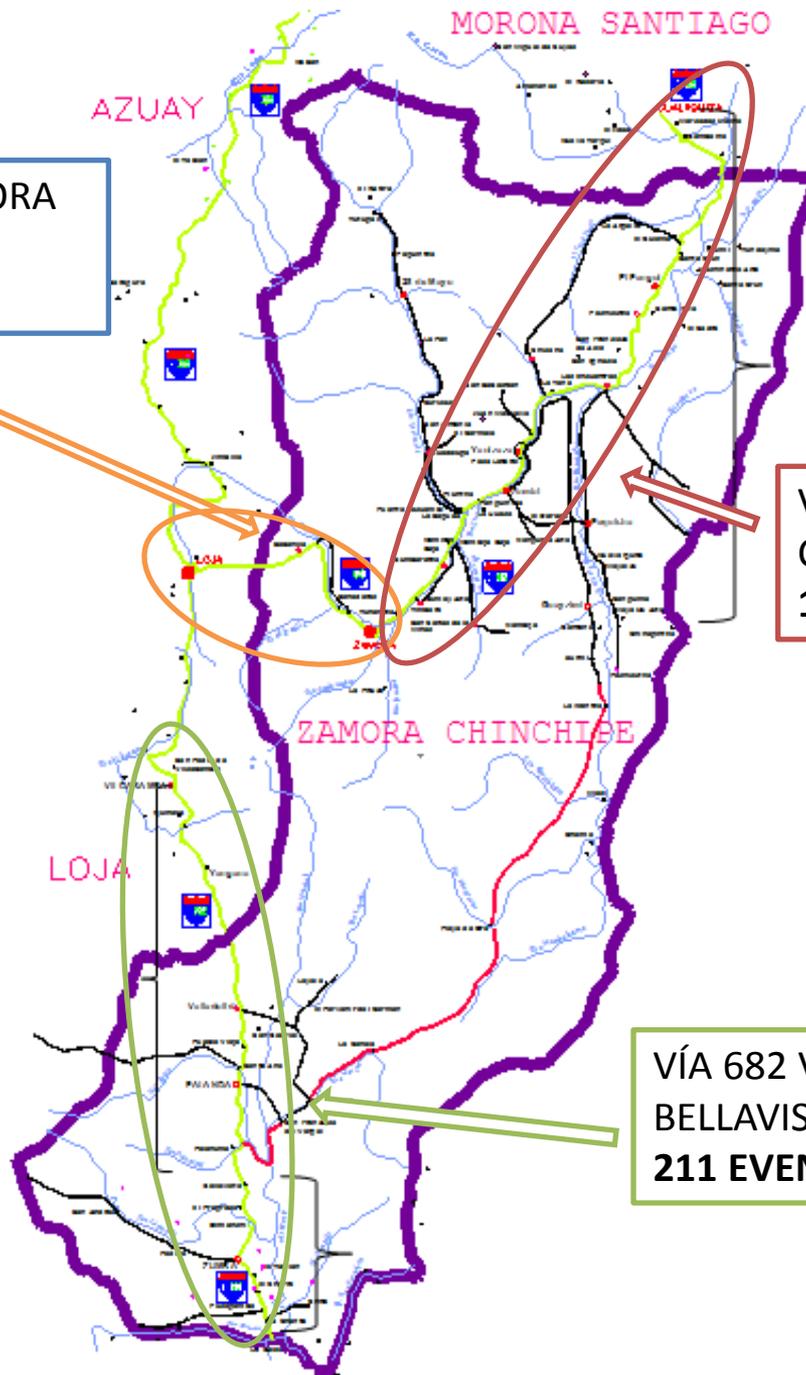

MANTENIMIENTO RUTINARIO CON MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL

Fecha de inicio	Agosto del 2014
Fecha de terminación	Mayo del 2015
Plazo	261días



AVANCE ECONÓMICO

\$ 100.515,84

PORCENTAJE DE AVANCE

100%

CARRETERA	TRAMO	LONGITUD	MICROEMPRESA	NRO. SOCIOS	MONTO DE CONTRATO	VALOR PLANILLADO: ENERO-MAYO 2015	PORCENTAJE ECONÓMICO DE AVANCE
Loja - Zamora	Loja- El Tambo	28,6 km	Sabanilla	10	59.791,05	25.112,24	100%
	El Tambo - Zamora	28,6 km	Zamorana	10	59.791,05	25.112,24	100%
Bellavista- Zumba-La Balsa	Bellavista – Zumba	28,6 km	Zumba	10	59.870,65	25.145,68	100%
	Zumba-La Balsa	28,6 km	Unidad Chinchipense	10	59.870,65	25.145,68	100%
	TOTAL	114.4 km	4	40	239.323,40	100.515,84	100%

MANTENIMIENTO PASO LATERAL YANTZAZA

LONGITUD	8.7 KM
CONTRATISTA	SIMAR
VIGENCIA DEL CONTRATO	Obra: 12/11/2008 HASTA 09/05/2012 Mantenimiento: 1/12/2012 HASTA 1/12/2016
UBICACIÓN:	Yantzaza
BENEFICIARIOS	91.376 habitantes.
MONTO CONTRACTUAL	\$ 12.457.753,75
MONTO DEVENGADO EN EL 2015	\$ 32.042,91
PORCENTAJE ECONÓMICO ACUMULADO	AVANCE 98,99%



Mantenimiento por Resultados de la carretera Zamora - Gualaquiza

LONGITUD : 114.15 KM

BENEFICIARIOS: PROVINCIA DE LOJA – ZAMORA CH.- MORONA SANTIAGO

**MANTENIMIENTO: CIA. VERDU.
FISCALIZACION: CIA. TRAZADOS**

**EL MANTENIMIENTO Y
FISCALIZACION CONCLUYO EL
19/12/2015**

- La carretera está constituida por los siguientes tramos:

TRAMO	INICIO	FIN	KM
I	Zamora	Zumbi	33,35 km
II	Zumbi	Los Encuentros	26,15 km
III	Los encuentros	Chuchumbleza	32,25 km
IV	Chuchumbleza	Gualaquiza	22,40 km

MICROEMPRESA

AMAZONAS

C. DEL CÓNDOR

VALLE DE LAS LUCIÉRNAGAS

ORQUÍDEA DE LA AMAZONÍA

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA ZAMORA - GUALAQUIZA

MONTO DEVENGADO EN EL 2015	\$ 1.655.023,05 (Mantenimiento) \$ 438.855,54 (fiscalización)
AVANCE FISICO	100%



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA

ZAMORA - GUALAQUIZA



ADMINISTRATIVO - FINANCIERO



CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCRIPCION DE PROCESOS	INVERSION REALIZADA
Contratación del Servicio de pasajes aéreos nacionales	\$ 8,928.57
Adquisición de Suministros de oficina	\$ 1,534.14
Adquisición de Filtros de Aceite, Aire y combustible, para la Maquinaria y Equipo Pesado de Marca CASE	\$ 8,211.19
Adquisición de Filtros de Aceite, Aire y combustible, para Volquetas y Carro Taller Volkswagen, Volquetas Mitsubishi, Cargadora Dresser y Cargadora Komatsu	\$ 10,806.85
Adquisición de repuestos originales para la Reparación de la Cargadora de Marca CASE	\$ 10,310.29
Contratación de los Servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas de la Dirección Provincial	\$ 10,548.86
TOTAL	\$ 50.339,90

Matriculación de Equipo y Maquinaria

TOTAL DE MATRICULAS EMITIDAS:

165

VALORES RECAUDADOS EN EL AÑO 2015:

\$ 31.246,05




EJECUCION PRESUPUESTARIA

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	111.555,66	111.340,17	99,81%
ESTUDIOS PROGRAMAS PUENTES	113.830,99	51.687,49	45,41%
CAF CFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA	26.822.001,61	26.740.981,72	99,70%
PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES	184.326,05	184.326,05	100,00%
OBRAS EMERGENTES VIA LOJA-ZAMORA	3.485.648,40	3.485.648,40	100,00%
TERMINACION DE LA CARRETERA LOJA EL TIRO SAN FRANCISCO ZAMORA	936.658,32	936.658,32	100,00%
CONSTRUCCION PASO LATERAL YANTZAZA(CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD DE YANTZAZA)	32.042,91	32.042,91	100,00%
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA	2.093.878,59	2.093.878,59	100,00%
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (RUBROS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO)	507.243,93	493.766,91	95,29%
TOTAL	34.287.186,46	34.130.330,56	99,54%

RESUMEN PRESUPUESTO 2015

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
34.287.186,46	111.555,66	111.340,17	34.175.630,80	34.018.990,39



99,54 %

=



99,80 %

+



99,54 %

TALENTO HUMANO

INVERSION EN NOMINA
DE PERSONAL



\$ 513.024,48

21 -LOSEP

33 – CODIGO DE TRABAJO

54 SERVIDORES
EN TOTAL

CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN.- Se declaró 3 ganadores, para que ocupen 3 puestos institucionales bajo Nombramiento Permanente.

DESVINCULACIÓN PERSONAL DE PLANTA: TOTAL 8.
2 servidores (LOSEP) y 6 Trabajadores (Código de Trabajo).

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Traspaso de maquinaria a GAD Municipales.
 - GAD de Zamora
 - GAD de Paquisha
 - GAD de El Pangui
 - GAD Yantzaza
 - GAD Provincial de Zamora Chinchipe



LEGALIZACIÓN. Los representantes de los municipios suscribieron un documento con el MTOP, para recibir de manera definitiva los bienes.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Lanzamiento de la VI Semana de seguridad Vial en coordinación con el ANT.



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Supervisión de la Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Chuchumletza – Tundayme (Campamento Mirador), obra a cargo de ECSA





Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

GRACIAS

*Ecuador
ya cambio!*
