



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2017

DIRECCIÓN DISTRIITAL DE SUCUMBÍOS



RED VIAL ESTATAL – SUCUMBÍOS



LONGITUD RED VIAL ESTATAL

637,01 Km



VÍAS ARTERIALES

159,59 Km

VÍAS COLECTORAS

183,30 Km





Índice

Antecedentes

- Inversión Provincial (Gasto corriente e inversión)

Estado Actual

- Obras en ejecución
- Mantenimiento vial

Otras Acciones en la Provincia

- Comprometidos con la comunidad
- Obras emergentes
- Matriculación

Acciones Futuras

- Plan Vial de la Provincia







Antecedentes

“Las vías son el camino que nos abre puertas, nos mantiene seguros, esta comunicación latente esta vida misma que necesita el país para continuar hacia adelante”


Paúl Granda
Ministro de Transporte y Obras Públicas



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA





Gasto Corriente e Inversión

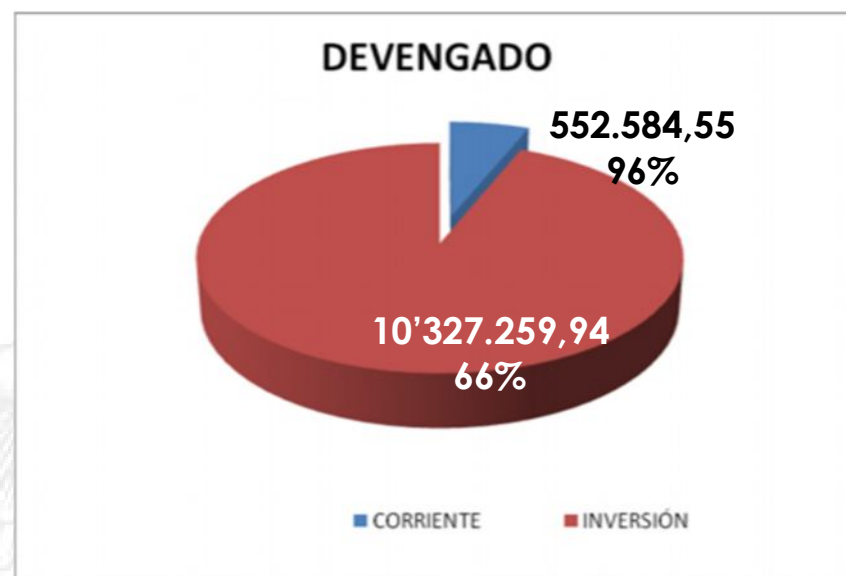


67% Ejecución Total

USD 16'326.315,78

USD 10'879.844,49



EJECUCIÓN MANTENIMIENTO VIAL SUCUMBIOS

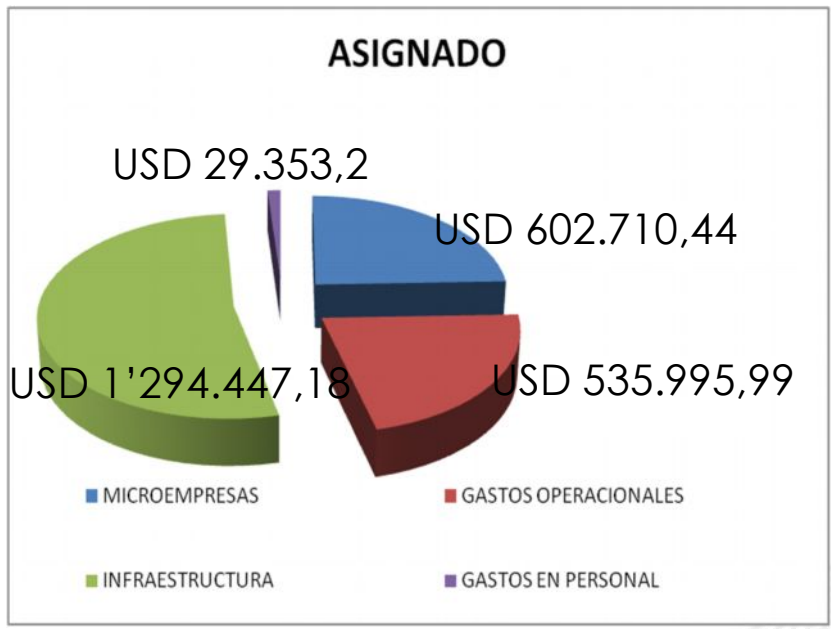

75% Ejecución Total

USD 2'462506,81



USD 1'847.201,72



Obras en la Provincia

“La infraestructura vial fortalece la conectividad y dinamiza el desarrollo socio-económico de esta Patria de todos”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Bacheo Asfáltico Mayor en la RVE 45 Nueva Loja – Simón Bolívar



DESCRIPCIÓN

- **RVE E45:** Se interviene la RVE E45 en el tramo inicial desde el Km 0+000 al 75+000 con Bacheo Mayor, este proyecto tiene un plazo de 45 días contados a partir del 18 de Mayo de 2017, se interviene también con el bacheo mayor de puntos críticos en la RVE de .

ACCIONES EN MARCHA

Recapeo Total de la Vía Nueva Loja –
Simón Bolívar.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 252.367,92

LONGITUD

75 KM

AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Julio 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Bacheo Asfáltico Mayor en la RVE 27 Jivino Verde - Shushufindi



DESCRIPCIÓN

- **RVE E27:** Se interviene la RVE E10 en el tramo inicial desde el Km 0+000 al 22+000 con Bacheo Mayor, este proyecto tiene un plazo de 45 días contados a partir de Mayo de 2017, se interviene también con el bacheo mayor de puntos críticos en la RVE de .

ACCIONES EN MARCHA

Recapeo Total de la Vía Jivino Verde - Shushufindi

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 143.652,50

LONGITUD

22 KM



AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Julio 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Bacheo Asfáltico Mayor Tramo Nueva Loja - Chiritza



DESCRIPCIÓN



- **RVE E10:** Se interviene la RVE E10 en el tramo inicial desde el Km 0+000 hasta 181+000 con el bacheo asfáltico mayor de la vía, este proyecto tiene un plazo de 45 días contados a partir de Mayo de 2017,.

ACCIONES EN MARCHA

Rehabilitación de sitios críticos en la Vía Nueva Loja – Pto. El Carmen.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 274.406,90

LONGITUD

181.00 Km


AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Julio 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Construcción de Muro de Gaviones en la vía Nueva Loja - Chiritza



DESCRIPCIÓN

- **RVE E10:** Se interviene la RVE E10 en el tramo inicial desde el Km 38+000 y 59+000 con la construcción de muros de gaviones para la estabilización de la Vía, este proyecto tiene un plazo de 45 días contados a partir de Mayo de 2017, se interviene también con el bacheo mayor de puntos críticos en la RVE de .

ACCIONES EN MARCHA

Rehabilitación de sitios críticos en la Vía Nueva Loja – Pto. El Carmen.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 56.964,50

LONGITUD

50 M



AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Julio 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Construcción de los Accesos al Puente sobre la Quebrada El Oso ubicado en el Tramo La Bonita – La Fama.



DESCRIPCIÓN

- **RVE E10:** Construcción de los accesos al puente provisional sobre la quebrada El Oso.

ACCIONES EN MARCHA

Rehabilitación de sitios críticos en la Vía Nueva Loja – Pto. El Carmen.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 167.277,95

LONGITUD

400,00 m



AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Julio 2017

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Construcción de Puerto Providencia Fase 1



DESCRIPCIÓN

- Construcción del Puerto de Embarque de Pasajeros
- Construcción de Vías Internas
- Construcción de Plataformas de acceso al puerto para plataformas

ACCIONES EN MARCHA

Gestión para el financiamiento de la segunda etapa.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD. 12'537.192,79

AREA

6,00 Ha.

AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS



Julio 2017



Compromiso con la Comunidad

Microempresas de Conservación Vial

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



RVE de la Provincia de Sucumbíos

MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL



DESCRIPCIÓN

RVE de la Provincia de Sucumbíos:

Trabajos de limpieza de cunetas, desbroce de maleza, Limpieza de calzada, espaldones y derecho de Vía.

Sello de Fisuras, grietas y relleno de Huecos aislados; materiales proporcionados por MTOP

Limpieza y reparación de cunetas
Limpieza y reparación de cunetas de coronación

Limpieza de alcantarillas

Limpieza de canales



ACCIONES EN MARCHA

Contratación de microempresas para un periodo mas extenso de tiempo para realizar Mantenimiento rutinario de la via.

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN

USD. 574.998,96

LONGITUD

500,62 km

AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

DICIEMBRE 2017



RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Obras emergentes

Intervención emergente

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



ADMINISTRACIÓN DIRECTA NUEVA LOJA – EL REVENTADOR, LUMBAQUI – LA BONITA – LIMITE PROVINCIAL CARCHI



DESCRIPCIÓN

- **RVE E10:** Se atienden eventos emergentes relacionados con deslizamientos de material en la calzada, derrumbes, entre otros, con la maquinaria y personal de la Dirección Distrital de Sucumbíos, atendiendo constantemente los eventos ocurridos en la vía.
- **RVE E45:** Se atienden eventos emergentes relacionados con deslizamientos de material en la calzada, derrumbes, pérdida de mesa en la vía, a través de la colaboración conjunta con las microempresas de conservación vial

ACCIONES EN MARCHA

Procesos de contratación para mantenimiento de maquinaria y vehículos

DATOS DEL PROYECTO

INVERSIÓN APROXIMADA

USD 500.000,00

LONGITUD

249.17 km

AVANCE DEL PROYECTO

100%

CULMINACIÓN TRABAJOS

DICIEMBRE 2017


RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Plan Vial de la Provincia de Sucumbíos

“La infraestructura vial fortalece la conectividad y dinamiza el desarrollo socio-económico de esta Patria de todos”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



RECAPEO ASFÁLTICO RVE E45 NUEVA LOJA – SIMÓN BOLÍVAR (75 KM)



DESCRIPCIÓN

- **RVE E45:** Se intervendrá en el tramo de la vía Nueva Loja – Simón Bolívar, comprendiendo una longitud de 75,00 km desde la terminación de la vía de 4 carriles hasta la parroquia Simón Bolívar, este proyecto cuenta con estudios de soporte técnico aprobados y se iniciará en el mes de Junio,.

ACCIONES EN MARCHA

Etapa precontractual.

DATOS DEL PROYECTO

LONGITUD

75,00 KM

AVANCE DEL PROYECTO



0%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Diciembre 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017





RECAPEO ASFÁLTICO RVE E27 JIVINO VERDE – SHUSHUFINDI (21,2 KM)



DESCRIPCIÓN

- **RVE E27:** Se intervendrá en el tramo de la vía Jivino Verde – Shushufindi, comprendiendo una longitud de 21,20 km desde el desvío El Proyecto hasta el Cantón Shushufindi, este proyecto cuenta con estudios de soporte técnico aprobados y se iniciará en el mes de Julio,.

ACCIONES EN MARCHA

Etapa precontractual.

DATOS DEL PROYECTO

LONGITUD

21,20 KM



AVANCE DEL PROYECTO

0%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Diciembre 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Construcción Puente Sobre el Rio Santa Fe (26,00 m)



DATOS DEL PROYECTO

LONGITUD

26,00 m

AVANCE DEL PROYECTO

0%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Diciembre 2018



DESCRIPCIÓN

- **Puente Santa Fe:** Construcción de Puente de 26 m de longitud sobre el Rio Santa Fe, ubicado en la vía Jivino Verde – Shushufindi km 1+200, y construcción de los accesos al puente.

ACCIONES EN MARCHA

Etapa precontractual.





Construcción Puentes Teteye, Parahuaico y Dureno



DESCRIPCIÓN

- Construcción de tres puentes sobre los ríos Teteye, Parahuaico y Dureno
- La construcción del Puente, constituye una solución para el tráfico en la carretera Nueva Loja – Dureno- Parahuayco – Tarapoa – Cuyabeno – Puerto El Carmen del Putumayo.

ACCIONES EN MARCHA

Etapa entrega de anticipo y precontractual para el Puente Dureno

DATOS DEL PROYECTO

LONGITUD


45.00, 50.00 y 55.00 m

AVANCE DEL PROYECTO

0%

CULMINACIÓN TRABAJOS

Diciembre 2018



GRACIAS



ObrasPublicasEcuador



ObrasPublicasEc
