

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**

**Dirección Provincial Chimborazo**

**PROYECTO: K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo**

|                                |                                                  |                                 |                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Andrade Almache, Patricio (pandrade@mtop.gob.ec) |                                 |                                                                                                                      |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Gamboa López, Enma Katherine                     | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Santillan Morocho, Ingrid Pamela                 | Prioridad:                      | 0                                                                                                                    |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                  | Retorno Económico:              | 0.00                                                                                                                 |
| CUP:                           | 175200000.506.3813                               | TIR:                            | 0.00 %                                                                                                               |
| Objetivos Operativos:          | 4                                                | VAN:                            | 0.00                                                                                                                 |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                            | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 12,899,443.16                                                                                                        |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                 |                                 |                                                                                                                      |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2020                                                                                              |
| Fecha de última actualización: | 03/09/2018                                       | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013                                                                                                           |
| Modificado por:                | Santillan Morocho, Ingrid Pamela                 | Fecha del siguiente Hito:       | 15/12/2018                                                                                                           |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.  
 Contratista: PATECA

**Microempresas Contratadas:**

Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan  
 Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino  
 Tramo Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha  
 Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe  
 Tramo Riobamba - Penipe - Puela: Microempresa 9 de Febrero  
 Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

**MONTO:** Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

**PRODUCTO/SERVICIO:**

Al termino de la ejecucion de trabajos de mantenimiento vial, las vías presentaran condiciones confortables y seguras

**LINEA BASE:** Mantenimiento por administración directa y contratada

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

Presntar las condiciones de la vía en óptimas condiciones  
 Mejorar la seguridad de los usuarios  
 Mejorar el servicio de las vías  
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.  
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.  
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

**Beneficios Cualitativos**

Seguridad  
 Mejor servicio al ciudadano  
 Conservación de la infraestructura vial

**Tipo de Beneficiario**

Todos los usuarios de la vía

**Restricciones**

Condiciones climáticas

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación


**Ejecución**

Cierre

Completado

Congelado


Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**
**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**


Transcurrido: 74.12 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2020

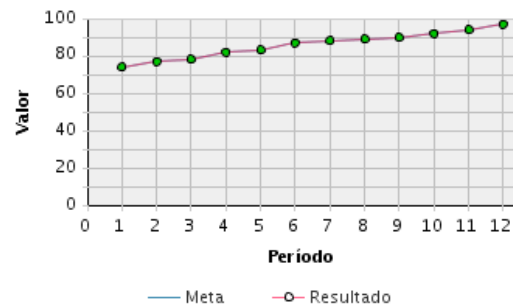**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**


| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2017                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 74 %                        | 77 % | 78 % | 82 % | 83 % | 87 % | 88 % | 89 % | 90 % | 92 % | 94 % | 97 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 74 %                        | 77 % | 78 % | 82 % | 83 % | 87 % | 88 % | 89 % | 90 % | 92 % | 94 % | 97 % |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>AGOSTO 2018:</b><br>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.<br>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:<br>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua<br>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis<br>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar<br>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales<br>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/09/2018 - 05:03 PM         |
| <b>JULIO 2018:</b><br>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.<br>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:<br>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua<br>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis<br>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar<br>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales<br>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud  | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/08/2018 - 11:02 AM         |
| <b>JUNIO 2018:</b><br>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.<br>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:<br>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua<br>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis<br>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar                                                                                              | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2018 - 11:07 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales<br>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                               |
| <p>MAYO 2018:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                        | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 04/06/2018 -<br>09:14 AM      |
| <p>ABRIL 2018:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                       | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/05/2018 -<br>09:20 AM      |
| <p>MARZO 2018:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                       | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/04/2018 -<br>10:06 AM      |
| <p>FEBRERO 2018:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                     | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/03/2018 -<br>03:10 PM      |
| <p>ENERO 2018:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos.</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                       | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/03/2018 -<br>03:09 PM      |
| <p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/01/2018 -<br>10:10 AM      |
| <p>NOVIEMBRE 2017:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 04/12/2017 -<br>10:27 AM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                               |
| <p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                                | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 02/11/2017 -<br>08:24 AM      |
| <p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales</p> <p>Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <p>-Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua</p> <p>-Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis</p> <p>-Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar</p> <p>-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales</p> <p>-Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p>                                                                                                             | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/10/2017 -<br>07:38 PM      |
| <p>AGOSTO 2017:</p> <p>CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.</p> <p>ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo menor, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.</p> <p>tramos:</p> <p>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</p> <p>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS</p> <p>*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</p> <p>*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES</p> <p>*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p> | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/09/2017 -<br>01:50 PM      |
| <p>JULIO 2017:</p> <p>CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales.</p> <p>ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo menor, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial.</p> <p>tramos:</p> <p>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</p> <p>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS</p> <p>*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</p> <p>*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES</p> <p>*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p>  | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/08/2017 -<br>10:46 AM      |
| <p>JUNIO 2017:</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</p> <p>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS</p> <p>*CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</p> <p>*GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES</p> <p>*CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.</p> <p>bacheo menor.</p>                                                                                                                                                                                                                      | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/07/2017 -<br>05:03 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>MAYO 2017:</b><br/>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*ALASÍ - PEPINALES</li> <li>+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI</li> <li>*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)</li> <li>*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO</li> <li>*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS</li> <li>*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO</li> <li>*CALPI - CASA CONDOR</li> <li>*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</li> <li>*GUASUNTOS - CHUNCHI</li> <li>*SAN LUIS - SOCAVÓN</li> <li>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</li> <li>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS</li> </ul> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.<br/>bacheo menor.</p>                             | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/06/2017 -<br>03:11 PM      |
| <p><b>ABRIL 2017:</b><br/>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*ALASÍ - PEPINALES</li> <li>+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI</li> <li>*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)</li> <li>*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO</li> <li>*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS</li> <li>*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO</li> <li>*CALPI - CASA CONDOR</li> <li>*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</li> <li>*GUASUNTOS - CHUNCHI</li> <li>*SAN LUIS - SOCAVÓN</li> <li>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</li> <li>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS</li> </ul> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.<br/>bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/05/2017 -<br>12:30 PM      |
| <p><b>MARZO 2017:</b><br/>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*ALASÍ - PEPINALES</li> <li>+PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI</li> <li>*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)</li> <li>*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO</li> <li>*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS</li> <li>*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO</li> <li>*CALPI - CASA CONDOR</li> <li>*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</li> <li>*GUASUNTOS - CHUNCHI</li> <li>*SAN LUIS - SOCAVÓN</li> <li>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</li> <li>*GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS</li> </ul> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.<br/>bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/04/2017 -<br>09:31 AM      |
| <p><b>FEBRERO 2016</b><br/>Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*ALASÍ - PEPINALES</li> <li>*PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI</li> <li>*Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR)</li> <li>*QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS</li> <li>*PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO</li> <li>*CALPI - CASA CONDOR</li> <li>*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR</li> <li>*GUASUNTOS - CHUNCHI</li> <li>*SAN LUIS - SOCAVÓN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 04/03/2017 -<br>09:25 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - RUNGURAHUA</p> <p>*PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones.</p> <p>bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p>                                                                                                                                                                                |                                        |                               |
| <p>ENERO 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos:</p> <p>* Riobamba - Penipe</p> <p>*Penipe - Puela - Cahuají Bajo</p> <p>* Cahuají Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua</p> <p>* Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas)</p> <p>* Socavón (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi)</p>                                   | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 04/03/2017 -<br>09:16 PM      |
| <p>DICIEMBRE 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>* Riobamba - Penipe - Cahuají</p> <p>* Riobamba - Cebadas</p> <p>* Guamote - Socavón</p> <p>* Guasuntos - Chunchi</p> <p>* Alausí - Huigra</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas.</p> <p>Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>   | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 04/01/2017 -<br>04:54 PM      |
| <p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>* Riobamba - Penipe - Cahuají</p> <p>* Riobamba - Cebadas</p> <p>* Guamote - Socavón</p> <p>* Guasuntos - Chunchi</p> <p>* Alausí - Huigra</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> <p>Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p> | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 05/12/2016 -<br>06:37 PM      |
| <p>OCTUBRE 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> <p>Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                                                                                                                                                     | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 01/11/2016 -<br>04:26 PM      |
| <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> <p>Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                                                                                                                                                  | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/10/2016 -<br>10:32 AM      |
| <p>AGOSTO 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> <p>Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                                                                                                                                                      | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 01/09/2016 -<br>07:26 AM      |
| <p>JULIO 2016</p> <p>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:</p> <p>*Calpi - San Juan - El Arena,</p> <p>*Huigra - Piedrero.</p> <p>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 03/08/2016 -<br>10:43 AM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                               |
| <p><b>JUNIO 2016</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.<br/> Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                   | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2016 - 12:35 PM         |
| <p><b>MAYO 2016</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.<br/> Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                    | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/06/2016 - 11:37 AM         |
| <p><b>ABRIL 2016:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.<br/> Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada</p>                  | Paula López, Ricardo Octavio     | 05/05/2016 - 10:07 AM         |
| <p><b>MARZO 2016:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> * Guasuntos- Chunchi,<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Alausí - Huigra,<br/> *Riobamba - Penipe,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>     | Paula López, Ricardo Octavio     | 08/04/2016 - 11:38 AM         |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> * Guasuntos- Chunchi,<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Alausí - Huigra,<br/> *Riobamba - Penipe,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>   | Paula López, Ricardo Octavio     | 09/03/2016 - 10:44 PM         |
| <p><b>ENERO 2016:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> * Guasuntos- Chunchi,<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Alausí - Huigra,<br/> *Riobamba - Penipe,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p>     | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 10/02/2016 - 07:31 AM         |
| <p><b>DICIEMBRE 2015:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> * Guasuntos- Chunchi,<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Alausí - Huigra,<br/> *Riobamba - Penipe,<br/> *Huigra - Piedrero.<br/> Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | Paula López, Ricardo Octavio     | 06/01/2016 - 05:35 PM         |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015:</b><br/> Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br/> * Guasuntos- Chunchi,<br/> *Calpi - San Juan - El Arena,<br/> *Alausí - Huigra,</p>                                                                                                                                 | Paula López, Ricardo Octavio     | 07/12/2015 - 03:57 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| *Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                               |
| OCTUBRE 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br>* Guasuntos- Chunchi,<br>*Calpi - San Juan - El Arena,<br>*Alausí - Huigra,<br>*Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                  | Paula López,<br>Ricardo Octavio        | 06/11/2015 -<br>12:25 AM      |
| SEPTIEMBRE 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br>* Guasuntos- Chunchi,<br>*Calpi - San Juan - El Arena,<br>*Alausí - Huigra,<br>*Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                               | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 07/10/2015 -<br>03:28 PM      |
| AGOSTO 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br>* Guasuntos- Chunchi,<br>*Calpi - San Juan - El Arena,<br>*Alausí - Huigra,<br>*Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                   | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 08/09/2015 -<br>11:59 AM      |
| JULIO 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br>* Guasuntos- Chunchi,<br>*Calpi - San Juan - El Arena,<br>*Alausí - Huigra,<br>*Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.<br>Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo  | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 06/08/2015 -<br>10:47 AM      |
| Junio 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:<br>* Guasuntos- Chunchi,<br>*Calpi - San Juan - El Arena,<br>*Alausí - Huigra,<br>*Riobamba - Penipe,<br>*Huigra - Piedrero.<br>Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.<br>Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo. | Santillan<br>Morocho, Ingrid<br>Pamela | 06/07/2015 -<br>01:15 PM      |
| Mayo 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                                             | Paula López,<br>Ricardo Octavio        | 05/06/2015 -<br>01:14 PM      |
| Abril 2015:<br>En etapa precontractual para contratación de microempresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén           | 07/05/2015 -<br>11:26 PM      |
| Marzo 2015<br>Proyecto con microempresas terminado.<br>Por contratar 6 microempresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén           | 07/04/2015 -<br>04:34 PM      |
| Febrero 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba                                                                                                                                                                                                                | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén           | 09/03/2015 -<br>01:27 PM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |
| Enero 2015:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                      | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 09/02/2015 -<br>09:40 AM      |
| Diciembre 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 08/01/2015 -<br>08:31 AM      |
| Noviembre 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                  | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 01/12/2014 -<br>04:31 PM      |
| Octubre 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                    | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 07/11/2014 -<br>12:37 PM      |
| Septiembre 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                 | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 06/10/2014 -<br>11:51 AM      |
| Agosto 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                     | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 11/09/2014 -<br>08:56 AM      |
| Julio 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                      | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 03/08/2014 -<br>06:37 PM      |
| Junio 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                      | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 03/07/2014 -<br>03:24 PM      |
| Mayo 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                       | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 05/06/2014 -<br>11:44 PM      |
| Abril 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                      | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 07/05/2014 -<br>09:00 AM      |
| Marzo 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                          | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 07/04/2014 -<br>09:20 AM      |
| Febrero 2014:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                        | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 10/03/2014 -<br>11:34 AM      |
| Enero 2014:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 10/02/2014 -<br>08:24 AM      |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                               |
| Diciembre 2013:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 06/01/2014 -<br>11:28 AM      |
| Noviembre 2013:<br>Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial.<br>Construcción de sistemas bta's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 02/12/2013 -<br>04:20 PM      |
| Enero - Octubre 2013:<br>Contratación de Microempresas.<br>Construcción de muros<br>Alquiler de maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 13/11/2013 -<br>03:13 PM      |
| Diciembre 2012:<br>Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 07/01/2013 -<br>10:34 AM      |
| Noviembre 2012:<br>Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 07/12/2012 -<br>09:20 AM      |
| Octubre 2012:<br>Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH<br>Septiembre 2012:<br>Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.<br>Agosto 2012:<br>Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.<br>Julio 2012:<br>Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.<br>Junio 2012:<br>Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.<br>Mayo 2012:<br>Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012:<br>Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza.<br>Marzo 2012:<br>Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la la Red vial Estatal de la Provincia.<br>Febrero 2012:<br>-Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa.<br>Enero 2012:<br>- Campamento Chunchi: % de Avance 20% | Solis Mazón,<br>Nestor Rubén | 12/11/2012 -<br>06:15 PM      |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                                              | Fecha de última actualización | Responsable            | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Recursos.</b><br>Falta de asignación de recursos, CAUSARÍA retraso de la ejecución de los trabajos. | 05/06/2018                    | Wilson Horna Sanipatín | 30 %         | 10      | 3            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                    | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo |

## HITOS

|    | Hito                                                                                    | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | EJECUCIÓN: Continuación de trabajos del año pasado. Trabajos ejecutados                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 01/01/2014         |                | 01/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 2  | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempres. Trabajos terminados                           | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/01/2014         |                | 22/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 3  | EJECUCIÓN: Inspección de Obra. Trabajos revisados                                       | 5-Entregables Intermedios              | 22/01/2014         |                | 22/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Actas firmadas FASE 1: Realizado                       | 5-Entregables Intermedios              | 23/01/2014         |                | 23/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 5  | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información             | 28/01/2014         |                | 28/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 6  | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado                                                        | 1-Solicitud de Información             | 30/01/2014         |                | 30/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizados                                           | 1-Solicitud de Información             | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado                                        | 2-Publicación de Pliegos               | 05/02/2014         |                | 05/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 9  | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados                               | 3-Adjudicación                         | 13/02/2014         |                | 13/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 10 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                      | 3-Adjudicación                         | 20/02/2014         |                | 20/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                       | 4-Inicio de Trabajo                    | 21/02/2014         |                | 21/02/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado                                         | 5-Entregables Intermedios              | 19/06/2014         |                | 19/06/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado                                                | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |          | Sí            | 1.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de señalización. Realizado                                     | 5-Entregables Intermedios              | 10/02/2015         |                | 10/02/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado                                               | 5-Entregables Intermedios              | 20/02/2015         |                | 20/02/2015 |          | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Ejecución de Planillas. Planillas ejecutadas                                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 21/02/2015         |                | 21/02/2015 |          | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                    | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 18 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado                                             | 5-Entregables Intermedios              | 24/02/2015         |                | 24/02/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 2: Realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 2.1: Realizado                            | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/03/2015         |                | 03/03/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 21 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información             | 17/04/2015         |                | 17/04/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 22 | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado                                                        | 1-Solicitud de Información             | 22/04/2015         |                | 22/04/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 23 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado                                        | 1-Solicitud de Información             | 29/04/2015         |                | 29/04/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 24 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado                                        | 2-Publicación de Pliegos               | 04/05/2015         |                | 04/05/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados                               | 3-Adjudicación                         | 11/05/2015         |                | 11/05/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                      | 3-Adjudicación                         | 18/05/2015         |                | 18/05/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                       | 4-Inicio de Trabajo                    | 25/05/2015         |                | 25/05/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado                                         | 5-Entregables Intermedios              | 26/06/2015         |                | 26/06/2015 |   | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado                                                | 5-Entregables Intermedios              | 26/06/2015         |                | 26/06/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado                                               | 5-Entregables Intermedios              | 28/08/2015         |                | 28/08/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 25/09/2015         |                | 25/09/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado                                             | 5-Entregables Intermedios              | 30/10/2015         |                | 30/10/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 3: Realizado       | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2015         |                | 30/12/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 3.1: Realizado                            | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2015         |                | 30/12/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 35 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información             | 09/03/2016         |                | 09/03/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 36 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado                                        | 2-Publicación de Pliegos               | 16/03/2016         |                | 16/03/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Contratos adjudicados                              | 3-Adjudicación                         | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                      | 3-Adjudicación                         | 08/04/2016         |                | 08/04/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                       | 4-Inicio de Trabajo                    | 12/04/2016         |                | 12/04/2016 |  | Sí            | 4.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado                                         | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |  | Sí            | 6.0           |
| 41 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado                                                | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2016         |                | 31/08/2015 |  | Sí            | 6.0           |
| 42 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado                                               | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 6.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                              | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 43 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado                                                                 | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2016         |                | 30/09/2016 |    | Sí            | 6.0           |
| 44 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |    | Sí            | 6.0           |
| 45 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 4: Realizado                 | 5-Entregables Intermedios              | 27/12/2016         |                | 27/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 46 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 4.1: Realizado                                      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2016         |                | 30/12/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 47 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                                | 3-Adjudicación                         | 02/02/2017         |                | 02/02/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 48 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 03/02/2017         |                | 03/02/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 49 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada           | 1-Solicitud de Información             | 06/02/2017         |                | 06/02/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 50 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1                      | 5-Entregables Intermedios              | 02/03/2017         |                | 02/03/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 51 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 5: Realizado | 5-Entregables Intermedios              | 02/04/2017         |                | 02/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 52 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                                | 3-Adjudicación                         | 02/04/2017         |                | 02/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 53 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 5.1: Realizado                                      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/04/2017         |                | 02/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 54 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 03/04/2017         |                | 03/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 55 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1                      | 5-Entregables Intermedios              | 02/05/2017         |                | 02/05/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 56 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 6 Realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 02/06/2017         |                | 02/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 57 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 6.1: Realizado                                      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/06/2017         |                | 02/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 58 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado                                                | 3-Adjudicación                         | 09/06/2017         |                | 09/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 59 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados                                                 | 4-Inicio de Trabajo                    | 12/06/2017         |                | 12/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 60 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1                      | 5-Entregables Intermedios              | 11/07/2017         |                | 11/07/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 61 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 2                              | 5-Entregables Intermedios              | 12/08/2017         |                | 11/08/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 62 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 3                              | 5-Entregables Intermedios              | 11/09/2017         |                | 11/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 63 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 4                              | 5-Entregables Intermedios              | 20/10/2017         |                | 20/10/2017 |  | Sí            | 1.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                              | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 64 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, Derrumbes menores                                                 | 5-Entregables Intermedios              | 25/10/2017         |                | 25/10/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 65 | EJECUCIÓN: Desmonte, roza a mano, ayuda emergente                                                 | 5-Entregables Intermedios              | 01/11/2017         |                | 01/11/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 66 | EJECUCIÓN: Limpieza de todos los sistemas de drenaje                                              | 5-Entregables Intermedios              | 25/11/2017         |                | 25/11/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 67 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 7: Realizado | 4-Inicio de Trabajo                    | 21/12/2017         |                | 21/12/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 68 | EJECUCIÓN: limpieza de derrumbes y ayudas emergentes                                              | 5-Entregables Intermedios              | 25/12/2017         |                | 25/12/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 69 | EJECUCIÓN:Recepción definitiva. Firmada FASE 7.1 Realizado                                        | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/12/2017         |                | 27/12/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 70 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos                                                                     | 4-Inicio de Trabajo                    | 15/03/2018         |                | 15/03/2018 |          | Sí            | 1.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias                                        | 5-Entregables Intermedios              | 15/12/2018         | 15/12/2018     |            |          | No            | 1.0           |
| 72 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva                                                                   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018         | 31/12/2018     |            |          | No            | 1.0           |

## SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|   | Supervisión                                             | Supervisor            | Organización Supervisora      | Fecha de creación |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | La obra esta en Curso                                   | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 26/08/2016        |
| 2 | Las obras estan en ejecución                            | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/09/2015        |
| 3 | El mantenimiento esta en proceso                        | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 27/10/2015        |
| 4 | Las obras siempre esta en constante mantenimiento       | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/06/2015        |
| 5 | El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 23/12/2014        |
| 6 | la obra esta en ejecución                               | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 19/08/2014        |
| 7 | Dr. Hermuy Calle V.                                     | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 25/02/2014        |

## INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                           | Estado | Avance al Período | Meta   | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de microempresas contratadas |        | 120.00 %          | 5      | 6                     | 01/01/2012      | Oct-Dic                    |
| 2 | Kilómetros Mantenidos               |        | 100.00 %          | 433.95 | 433.95                | 01/01/2012      | Diciembre                  |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

## COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 12,899,443.16 ** |
| Costo Total:                  | 20,000,000.00    |
| Total Devengado:              | 16,050,609.96    |
| % Costo Total Devengado:      | 80.25 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

## % COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 80.25 %

## Perfil Económico 2017

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 8,217,056.69   | 1,387,060.14      | 3,045,678.36 | 12,649,795.19 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 7,300,367.13   | 1,638,627.18      | 3,042,163.86 | 11,981,158.17 |
| Ppto. Codificado                                        | 7,318,170.96   | 7,613,235.08      | 3,421,203.61 | 18,352,609.65 |
| Ppto. Comprometido                                      | 4,743,740.94   | 7,074,459.85      | 1,298,756.55 | 13,116,957.34 |
| Planeado - Codificado (2017)                            |                | -6,226,174.94     |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 9,230,775.89   | 2,145,074.54      | 3,045,678.36 | 14,421,528.79 |
| Ppto. Devengado                                         | 7,708,690.26   | 7,074,459.85      | 1,267,459.85 | 16,050,609.96 |
| Pagado Real                                             | 4,351,115.01   | 7,074,459.85      | 1,053,524.61 | 12,479,099.47 |
| Estimado a fin de año                                   | * 7,708,690.26 | 0.00              | 0.00         | 7,708,690.26  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,522,085.63   | 2,145,074.54      | 3,045,678.36 | 6,712,838.53  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 83.51 %      | 329.80 %          | 41.62 %      | 111.30 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 27,690.38      | 0.00              | 0.00         | 27,690.38     |
| Ppto. Devengado 998                                     | 27,690.38      | 0.00              | 0.00         | 27,690.38     |

\* Ppto. Devengado

## PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

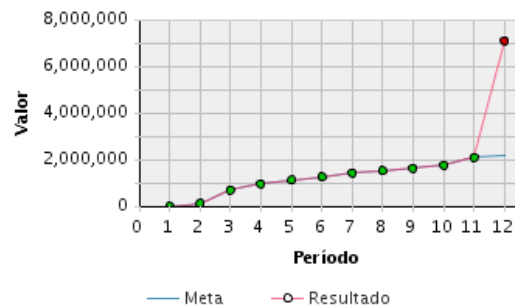

## Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2017 |                            |                     |                              |                       |                  |                                                                                     |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                                                                              | Avance Anual |
| Feb                      | 129,687.77                 | 129,687.77          | 129,687.77                   | 129,687.77            | 100.00 %         |  | 6.05 %       |
| Mar                      | 566,343.89                 | 566,343.89          | 696,031.66                   | 696,031.66            | 100.00 %         |  | 32.45 %      |
| Abr                      | 255,526.27                 | 255,526.27          | 951,557.93                   | 951,557.93            | 100.00 %         |  | 44.36 %      |
| May                      | 155,305.60                 | 155,305.60          | 1,106,863.53                 | 1,106,863.53          | 100.00 %         |  | 51.60 %      |
| Jun                      | 153,381.55                 | 153,381.55          | 1,260,245.08                 | 1,260,245.08          | 100.00 %         |  | 58.75 %      |
| Jul                      | 158,710.13                 | 158,710.13          | 1,418,955.21                 | 1,418,955.21          | 100.00 %         |  | 66.15 %      |
| Ago                      | 94,076.44                  | 94,076.44           | 1,513,031.65                 | 1,513,031.65          | 100.00 %         |  | 70.54 %      |
| Sep                      | 118,651.02                 | 118,651.02          | 1,631,682.67                 | 1,631,682.67          | 100.00 %         |  | 76.07 %      |
| Oct                      | 108,509.69                 | 108,509.69          | 1,740,192.36                 | 1,740,192.36          | 100.00 %         |  | 81.13 %      |
| Nov                      | 332,401.41                 | 332,401.41          | 2,072,593.77                 | 2,072,593.77          | 100.00 %         |  | 96.62 %      |
| Dic                      | 72,480.77                  | 5,001,866.08        | 2,145,074.54                 | 7,074,459.85          | 329.80 %         |  | 329.80 %     |
| <b>Total</b>             | <b>2,145,074.54</b>        | <b>7,074,459.85</b> |                              |                       |                  |  |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 12                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos.                                                     |
| 13                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                      |
| 15                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                | Archivo                                                 | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2011         | A.1.pdf                                                 | 11/03/2014    |
| 2  | A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012         | A.2.pdf                                                 | 11/03/2014    |
| 3  | A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012         | A.3.jpg                                                 | 11/03/2014    |
| 4  | A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero 2012 - Microempresa | A.4.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 5  | A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo 2012 - Microempresa   | A.5.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 6  | A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012 - Microempresa   | A.6.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 7  | A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012                   | A.7.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 8  | A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012 - Microempresa   | A.8.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 9  | A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 - Microempresa   | A.9.pdf                                                 | 13/03/2014    |
| 10 | Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015                              | Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf            | 02/07/2015    |
| 11 | Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015                   | Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf | 02/07/2015    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                 | Archivo                                                                   | Fecha de Alta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12 | Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015                                                           | Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf                          | 02/07/2015    |
| 13 | Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015                                                            | Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba_13-02-2015.pdf                           | 02/07/2015    |
| 14 | Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015                                                             | Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf                            | 02/07/2015    |
| 15 | Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015                                                        | Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo_13-02-2015.pdf                       | 02/07/2015    |
| 16 | ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato                                                                 | D.7.pdf                                                                   | 05/06/2015    |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018                                                        | k009.pdf                                                                  | 03/04/2018    |
| 18 | B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto 2012 - Microempresa                                   | B.1.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 19 | B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre 2012 - Microempresa                               | B.2.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 20 | B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2012 - Microempresa                                  | B.3.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 21 | B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre 2012 - Microempresa                                | B.4.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 22 | B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2012 - Microempresa                                | B.5.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 23 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.6.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 24 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2013 - Microempresa                                  | B.6.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 25 | B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2013 - Microempresa                                | B.7.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 26 | B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero 2014- microempresas                                    | B.8.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 27 | B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.9.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 28 | C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal                         | C.1.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 29 | C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero 2014- microempresas                                 | C.2.pdf                                                                   | 13/03/2014    |
| 30 | C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo 2014- microempresas                                   | C.3.pdf                                                                   | 07/04/2014    |
| 31 | C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril 2014- microempresas                                   | C.4.pdf                                                                   | 07/05/2014    |
| 32 | C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo 2014- microempresas                                    | C.5.pdf                                                                   | 06/06/2014    |
| 33 | C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio 2014- microempresas                                   | C.6.pdf                                                                   | 03/07/2014    |
| 34 | C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio 2014- microempresa                                    | C.7.pdf                                                                   | 03/08/2014    |
| 35 | C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto 2014- microempresa                                   | C.8.pdf                                                                   | 11/09/2014    |
| 36 | C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo septiembre 2014- microempresa                               | C.9.pdf                                                                   | 06/10/2014    |
| 37 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO                                  | cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf | 09/12/2016    |
| 38 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO                                  | cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf | 09/12/2016    |
| 39 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO                                  | cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf | 09/12/2016    |
| 40 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO                                  | cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf | 09/12/2016    |
| 41 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO                                  | cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia_de_chimborazo.pdf | 09/12/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                  | Archivo                                                        | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 42 | Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015                         | Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf           | 02/07/2015    |
| 43 | Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal 06-05-2015              | Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf | 02/07/2015    |
| 44 | Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015                     | Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf       | 02/07/2015    |
| 45 | Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015                      | Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf        | 02/07/2015    |
| 46 | Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015                       | Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf         | 02/07/2015    |
| 47 | Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo 15-05-2015                  | Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf     | 02/07/2015    |
| 48 | D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre 2014- microempresa   | D.1.pdf                                                        | 07/11/2014    |
| 49 | D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre 2014- microempresa | D.2.pdf                                                        | 08/01/2015    |
| 50 | D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero 2015- microempresa     | D.3.pdf                                                        | 09/02/2015    |
| 51 | D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015- microempresa   | D.4.pdf                                                        | 09/03/2015    |
| 52 | D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015- microempresa     | D.5.pdf                                                        | 07/04/2015    |
| 53 | D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015- microempresa    | D.6.pdf                                                        | 08/05/2015    |
| 54 | D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado                           | D.7.pdf                                                        | 09/06/2015    |
| 55 | D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos                            | D.8.pdf                                                        | 09/06/2015    |
| 56 | D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos                            | D.9.pdf                                                        | 08/07/2015    |
| 57 | E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos                             | E.1                                                            | 06/08/2015    |
| 58 | E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo 2016                     | E.10.pdf                                                       | 03/06/2016    |
| 59 | E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio 2016                    | E.11.pdf                                                       | 11/07/2016    |
| 60 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto 2016                   | E.12.pdf                                                       | 01/09/2016    |
| 61 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio 2016                    | E.12.pdf                                                       | 03/08/2016    |
| 62 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre 2016                  | E.12...pdf                                                     | 01/11/2016    |
| 63 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Septiembre 2016               | E.12..pdf                                                      | 04/10/2016    |
| 64 | E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos                             | E.2.pdf                                                        | 08/09/2015    |
| 65 | E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos                             | E.3.pdf                                                        | 07/10/2015    |
| 66 | E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes                          | E.4                                                            | 06/11/2015    |
| 67 | E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo noviembre 2015               | E.5.pdf                                                        | 07/12/2015    |
| 68 | E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre 2015               | E.6                                                            | 13/01/2016    |
| 69 | E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero 2016                   | E.7.pdf                                                        | 10/02/2016    |
| 70 | E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero 2016                 | E.8.pdf                                                        | 09/03/2016    |
| 71 | E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo 2016                   | E.9.pdf                                                        | 08/04/2016    |
| 72 | F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Noviembre 2016                | F.7.pdf                                                        | 05/12/2016    |
| 73 | F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre 2016                 | F.8.pdf                                                        | 04/01/2017    |
| 74 | F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO 2017                   | F.9..pdf                                                       | 04/03/2017    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                  | Archivo                                        | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 75 | G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento Administración Directa ENERO 2016 | %_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg | 04/03/2017    |
| 76 | G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL 2017                     | G.2.pdf                                        | 05/05/2017    |
| 77 | G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO 2017                      | G3.pdf                                         | 05/06/2017    |
| 78 | G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO 2017                     | G.4..pdf                                       | 05/07/2017    |
| 79 | G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO 2017                     | K009.pdf                                       | 04/08/2017    |
| 80 | G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO 2017                    | K009.pdf                                       | 05/09/2017    |
| 81 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017                | K009.pdf                                       | 05/10/2017    |
| 82 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE 20178                  | G.8.pdf                                        | 01/11/2017    |
| 83 | G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017                 | K009.pdf                                       | 04/12/2017    |
| 84 | H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017                 | k009..pdf                                      | 04/01/2018    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                           | Rol                               | Puesto                                        | Correo Electrónico     | Teléfono(s) |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Armijo Logroño, Angel Eduardo    | Fiscalizador                      | Experto de Infraestructura Provincial         | aarmijo@mtop.gob.ec    |             |
| Armijo Logroño, Angel Eduardo    | Supervisor Conservación Vial      | Experto de Infraestructura Provincial         | aarmijo@mtop.gob.ec    |             |
| Horna Sanipatín, Wilson          | Coordinador Técnico               | Supervisor Construcciones                     | whorna@mtop.gob.ec     | 023974600   |
| Narváez , Pablo                  | Supervisor Financiero             |                                               |                        |             |
| Santillan Morocho, Ingrid Pamela | Director Provincial de Chimborazo | Directora Provincial de Chimborazo, Encargada | isantillan@mtop.gob.ec | 023974600   |

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 35904_1.jpg | 05/06/2016    |
