

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3

Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo

Líder del Proyecto:	Horna Sanipatín, Wilson (whorna@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3813	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,828,828.47
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	05/06/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Fecha del siguiente Hito:	15/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.
 Contratista: PATECA

Microempresas Contratadas:

Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan
 Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino
 Tramo Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha
 Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe
 Tramo Riobamba - Penipe - Puela: Microempresa 9 de Febrero
 Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

MONTO: Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

PRODUCTO/SERVICIO:

Al termino de la ejecucion de trabajos de mantenimiento vial, las vías presentaran condiciones confortables y seguras

LINEA BASE: Mantenimiento por administración directa y contratada

OBJETIVO GENERAL: Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Presntar las condiciones de la vía en óptimas condiciones
 Mejorar la seguridad de los usuarios
 Mejorar el servicio de las vías
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Seguridad
 Mejor servicio al ciudadano
 Conservación de la infraestructura vial

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios de la vía

Restricciones

Condiciones climáticas

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 72.20 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	97 %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	97 %	97 %	98 %									
	Estado											
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/06/2018 - 09:14 AM
ABRIL 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/05/2018 - 09:20 AM
MARZO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2018 - 10:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud		
FEBRERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:10 PM
ENERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:09 PM
DICIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 10:10 AM
NOVIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2017 - 10:27 AM
OCTUBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/11/2017 - 08:24 AM
SEPTIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/10/2017 - 07:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2017: CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales. ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial. tramos: *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 01:50 PM
JULIO 2017: CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales. ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial. tramos: *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2017 - 10:46 AM
JUNIO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 05:03 PM
MAYO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 03:11 PM
ABRIL 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 12:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada		
MARZO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 09:31 AM
FEBRERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES *PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/03/2017 - 09:25 PM
ENERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos: * Riobamba - Penipe *Penipe - Puela - Cahuají Bajo * Cahuají Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua * Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas) * Socavón (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi)	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/03/2017 - 09:16 PM
DICIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahuají * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/01/2017 - 04:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahuají * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/12/2016 - 06:37 PM
OCTUBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/11/2016 - 04:26 PM
SEPTIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2016 - 10:32 AM
AGOSTO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/09/2016 - 07:26 AM
JULIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2016 - 10:43 AM
JUNIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2016 - 12:35 PM
MAYO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/06/2016 - 11:37 AM
ABRIL 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada	Paula López, Ricardo Octavio	05/05/2016 - 10:07 AM
MARZO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos:	Paula López, Ricardo Octavio	08/04/2016 - 11:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.		
FEBRERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	09/03/2016 - 10:44 PM
ENERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	10/02/2016 - 07:31 AM
DICIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	06/01/2016 - 05:35 PM
NOVIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	07/12/2015 - 03:57 PM
OCTUBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	06/11/2015 - 12:25 AM
SEPTIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	07/10/2015 - 03:28 PM
AGOSTO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi,	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	08/09/2015 - 11:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.		
JULIO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	06/08/2015 - 10:47 AM
Junio 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	06/07/2015 - 01:15 PM
Mayo 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Paula López, Ricardo Octavio	05/06/2015 - 01:14 PM
Abril 2015: En etapa precontractual para contratación de microempresas	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2015 - 11:26 PM
Marzo 2015 Proyecto con microempresas terminado. Por contratar 6 microempresas.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2015 - 04:34 PM
Febrero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/03/2015 - 01:27 PM
Enero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/02/2015 - 09:40 AM
Diciembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/01/2015 - 08:31 AM
Noviembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	01/12/2014 - 04:31 PM
Octubre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/11/2014 - 12:37 PM
Septiembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/10/2014 - 11:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.		
Agosto 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	11/09/2014 - 08:56 AM
Julio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/08/2014 - 06:37 PM
Junio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	03/07/2014 - 03:24 PM
Mayo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/06/2014 - 11:44 PM
Abril 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2014 - 09:00 AM
Marzo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2014 - 09:20 AM
Febrero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/03/2014 - 11:34 AM
Enero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/02/2014 - 08:24 AM
Diciembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/01/2014 - 11:28 AM
Noviembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial. Construcción de sistemas bta's	Solis Mazón, Nestor Rubén	02/12/2013 - 04:20 PM
Enero - Octubre 2013: Contratación de Microempresas. Construcción de muros Alquiler de maquinaria	Solis Mazón, Nestor Rubén	13/11/2013 - 03:13 PM
Diciembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/01/2013 - 10:34 AM
Noviembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/12/2012 - 09:20 AM
Octubre 2012:	Solis Mazón, Nestor Rubén	12/11/2012 - 06:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH Septiembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Agosto 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Julio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Junio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Mayo 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbes en las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Marzo 2012: Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la Red vial Estatal de la Provincia. Febrero 2012: -Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa. Enero 2012: - Campamento Chunchi: % de Avance 20%		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de asignación de recursos, CAUSARÍA retraso de la ejecución de los trabajos.	05/06/2018	Wilson Horna Sanipatín	30 %	10	3	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Continuación de trabajos del año pasado. Trabajos ejecutados	4-Inicio de Trabajo	01/01/2014		01/01/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempres. Trabajos terminados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Inspección de Obra. Trabajos revisados	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Actas firmadas FASE 1: Realizado	5-Entregables Intermedios	23/01/2014		23/01/2014		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	28/01/2014		28/01/2014		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado	1-Solicitud de Información	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizados	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
8	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	05/02/2014		05/02/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados	3-Adjudicación	13/02/2014		13/02/2014		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	20/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	21/02/2014		21/02/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	19/06/2014		19/06/2014		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento de señalización. Realizado	5-Entregables Intermedios	10/02/2015		10/02/2015		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	20/02/2015		20/02/2015		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Ejecución de Planillas. Planillas ejecutadas	4-Inicio de Trabajo	21/02/2015		21/02/2015		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	24/02/2015		24/02/2015		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 2: Realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 2.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/03/2015		03/03/2015		Sí	1.0
21	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	17/04/2015		17/04/2015		Sí	1.0
22	PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado	1-Solicitud de Información	22/04/2015		22/04/2015		Sí	1.0
23	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	1-Solicitud de Información	29/04/2015		29/04/2015		Sí	1.0
24	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	04/05/2015		04/05/2015		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados	3-Adjudicación	11/05/2015		11/05/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	18/05/2015		18/05/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	25/05/2015		25/05/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	26/06/2015		26/06/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	26/06/2015		26/06/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	25/09/2015		25/09/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 3: Realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 3.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
35	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	09/03/2016		09/03/2016		Sí	1.0
36	PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado	2-Publicación de Pliegos	16/03/2016		16/03/2016		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Contratos adjudicados	3-Adjudicación	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	08/04/2016		08/04/2016		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	12/04/2016		12/04/2016		Sí	4.0
40	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	6.0
41	EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2015		Sí	6.0
42	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	6.0
43	EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		30/09/2016		Sí	6.0
44	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	6.0
45	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 4: Realizado	5-Entregables Intermedios	27/12/2016		27/12/2016		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 4.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	02/02/2017		02/02/2017		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	03/02/2017		03/02/2017		Sí	1.0
49	PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada	1-Solicitud de Información	06/02/2017		06/02/2017		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	02/03/2017		02/03/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 5: Realizado	5-Entregables Intermedios	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 5.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/04/2017		02/04/2017		Sí	1.0
54	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	03/04/2017		03/04/2017		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	02/05/2017		02/05/2017		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 6 Realizado	5-Entregables Intermedios	02/06/2017		02/06/2017		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 6.1: Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/06/2017		02/06/2017		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado	3-Adjudicación	09/06/2017		09/06/2017		Sí	1.0
59	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	12/06/2017		12/06/2017		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1	5-Entregables Intermedios	11/07/2017		11/07/2017		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 2	5-Entregables Intermedios	12/08/2017		11/08/2017		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 3	5-Entregables Intermedios	11/09/2017		11/09/2017		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE-Chimborazo. Planilla 4	5-Entregables Intermedios	20/10/2017		20/10/2017		Sí	1.0
64	EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, Derrumbes menores	5-Entregables Intermedios	25/10/2017		25/10/2017		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: Desmonte, roza a mano, ayuda emergente	5-Entregables Intermedios	01/11/2017		01/11/2017		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: Limpieza de todos los sistemas de drenaje	5-Entregables Intermedios	25/11/2017		25/11/2017		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 7: Realizado	4-Inicio de Trabajo	21/12/2017		21/12/2017		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: limpieza de derrumbes y ayudas emergentes	5-Entregables Intermedios	25/12/2017		25/12/2017		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN:Recepción definitiva. Firmada FASE 7.1 Realizado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/12/2017		27/12/2017		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos	4-Inicio de Trabajo	15/03/2018		15/03/2018		Sí	1.0
71	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias	5-Entregables Intermedios	15/12/2018	15/12/2018			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
72	EJECUCIÓN: Recepción definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	La obra esta en Curso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/08/2016
2	Las obras estan en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/09/2015
3	El mantenimiento esta en proceso	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	27/10/2015
4	Las obras siempre esta en constante mantenimiento	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/06/2015
5	El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	23/12/2014
6	la obra esta en ejecución	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/08/2014
7	Dr. Hermuy Calle V.	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	25/02/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de microempresas contratadas		90.91 %	11	10	01/01/2012	Ene-Mar
2	Kilómetros Mantenidos		100.00 %	432.45	432.45	01/01/2012	Mayo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,828,828.47 **
Costo Total:	20,000,000.00
Total Devengado:	15,517,231.40
% Costo Total Devengado:	77.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 77.59 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,604,116.83	3,045,678.36	0.00	12,649,795.19
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	8,938,994.31	3,042,163.86	0.00	11,981,158.17
Ppto. Codificado	14,931,406.04	3,042,163.86	0.00	17,973,569.90
Ppto. Comprometido	11,818,200.79	734,081.29	0.00	12,552,282.08
Planeado - Codificado (2018)		3,514.50		
Programado a Devengar	11,375,850.43	3,045,678.36	0.00	14,421,528.79
Ppto. Devengado	14,783,150.11	734,081.29	0.00	15,517,231.40
Pagado Real	11,425,574.86	493,276.65	0.00	11,918,851.51
Estimado a fin de año	* 14,783,150.11	0.00	0.00	14,783,150.11
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,407,299.68	3,045,678.36	0.00	-361,621.32
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 129.95 %	24.10 %	0.00 %	107.60 %
Ppto. Codificado 998	27,690.38	0.00	0.00	27,690.38
Ppto. Devengado 998	27,690.38	0.00	0.00	27,690.38

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

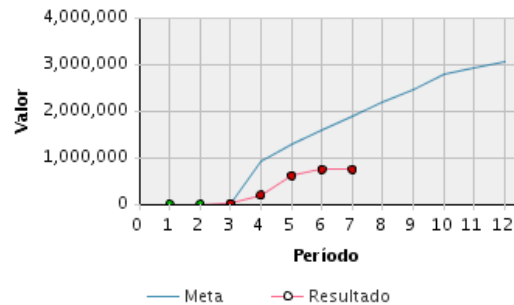

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	14,655.98	0.00	14,655.98	115.00 %		0.48 %
Abr	927,360.67	174,049.95	927,360.67	188,705.93	20.35 %		6.20 %
May	366,163.54	415,462.98	1,293,524.21	604,168.91	46.71 %		19.84 %
Jun	303,985.50	129,912.38	1,597,509.71	734,081.29	45.95 %		24.10 %
Jul	270,184.16	0.00	1,867,693.87	734,081.29	39.30 %		24.10 %
Ago	304,006.30		2,171,700.17				
Sep	286,695.15		2,458,395.32				
Oct	332,584.23		2,790,979.55				
Nov	127,349.39		2,918,328.94				
Dic	127,349.42		3,045,678.36				
Total	3,045,678.36	734,081.29					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2011	A.1.pdf	11/03/2014
2	A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012	A.2.pdf	11/03/2014
3	A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012	A.3.jpg	11/03/2014
4	A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero 2012 - Microempresa	A.4.pdf	13/03/2014
5	A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo 2012 - Microempresa	A.5.pdf	13/03/2014
6	A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012 - Microempresa	A.6.pdf	13/03/2014
7	A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012	A.7.pdf	13/03/2014
8	A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012 - Microempresa	A.8.pdf	13/03/2014
9	A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 - Microempresa	A.9.pdf	13/03/2014
10	Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015	Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf	02/07/2015
11	Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015	Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf	02/07/2015
12	Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015	Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf	02/07/2015
13	Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015	Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba_13-02-2015.pdf	02/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015	Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf	02/07/2015
15	Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015	Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo__13-02-2015.pdf	02/07/2015
16	ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato	D.7.pdf	05/06/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	k009.pdf	03/04/2018
18	B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto 2012 - Microempresa	B.1.pdf	13/03/2014
19	B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre 2012 - Microempresa	B.2.pdf	13/03/2014
20	B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2012 - Microempresa	B.3.pdf	13/03/2014
21	B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre 2012 - Microempresa	B.4.pdf	13/03/2014
22	B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2012 - Microempresa	B.5.pdf	13/03/2014
23	B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal	B.6.pdf	13/03/2014
24	B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2013 - Microempresa	B.6.pdf	13/03/2014
25	B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2013 - Microempresa	B.7.pdf	13/03/2014
26	B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero 2014- microempresas	B.8.pdf	13/03/2014
27	B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal	B.9.pdf	13/03/2014
28	C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal	C.1.pdf	13/03/2014
29	C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero 2014- microempresas	C.2.pdf	13/03/2014
30	C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo 2014- microempresas	C.3.pdf	07/04/2014
31	C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril 2014- microempresas	C.4.pdf	07/05/2014
32	C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo 2014- microempresas	C.5.pdf	06/06/2014
33	C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio 2014- microempresas	C.6.pdf	03/07/2014
34	C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio 2014- microempresa	C.7.pdf	03/08/2014
35	C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto 2014- microempresa	C.8.pdf	11/09/2014
36	C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo septiembre 2014- microempresa	C.9.pdf	06/10/2014
37	CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia_09/12/2016	09/12/2016
38	CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia_09/12/2016	09/12/2016
39	CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia_09/12/2016	09/12/2016
40	CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia_09/12/2016	09/12/2016
41	CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO	cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia_09/12/2016	09/12/2016
42	Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf	02/07/2015
43	Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal 06-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf	02/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf	07/07/2015
45	Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf	07/07/2015
46	Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf	02/07/2015
47	Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo 15-05-2015	Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf	07/07/2015
48	D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre 2014- microempresa	D.1.pdf	07/11/2014
49	D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre 2014- microempresa	D.2.pdf	08/01/2015
50	D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero 2015- microempresa	D.3.pdf	09/02/2015
51	D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015- microempresa	D.4.pdf	09/03/2015
52	D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015- microempresa	D.5.pdf	07/04/2015
53	D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015- microempresa	D.6.pdf	08/05/2015
54	D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado	D.7.pdf	09/06/2015
55	D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	D.8.pdf	09/06/2015
56	D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	D.9.pdf	08/07/2015
57	E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.1	06/08/2015
58	E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo 2016	E.10.pdf	03/06/2016
59	E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio 2016	E.11.pdf	11/07/2016
60	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto 2016	E.12.pdf	01/09/2016
61	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio 2016	E.12.pdf	03/08/2016
62	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre 2016	E.12...pdf	01/11/2016
63	E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Septiembre 2016	E.12..pdf	04/10/2016
64	E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.2.pdf	08/09/2015
65	E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos	E.3.pdf	07/10/2015
66	E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes	E.4	06/11/2015
67	E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo noviembre 2015	E.5.pdf	07/12/2015
68	E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre 2015	E.6	13/01/2016
69	E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero 2016	E.7.pdf	10/02/2016
70	E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero 2016	E.8.pdf	09/03/2016
71	E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo 2016	E.9.pdf	08/04/2016
72	F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Noviembre 2016	F.7.pdf	05/12/2016
73	F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre 2016	F.8.pdf	04/01/2017
74	F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO 2017	F.9..pdf	04/03/2017
75	G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento Administración Directa ENERO 2016	%_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg	04/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
76	G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL 2017	G.2.pdf	05/05/2017
77	G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO 2017	G3.pdf	05/06/2017
78	G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO 2017	G.4..pdf	05/07/2017
79	G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO 2017	K009.pdf	04/08/2017
80	G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO 2017	K009.pdf	05/09/2017
81	G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017	K009.pdf	05/10/2017
82	G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE 20178	G.8.pdf	01/11/2017
83	G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	K009.pdf	04/12/2017
84	H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	k009..pdf	04/01/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Fiscalizador	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Supervisor Conservación Vial	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Supervisor Financiero			
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
35904_1.jpg	05/06/2016
