

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Subsecretaría Zona 7

Dirección Provincial Zamora Chinchipe

PROYECTO: K026 MTOP - Mantenimiento de Infraestructura de la provincia de Zamora Chinchipe

Líder del Proyecto:	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne (xtoledo@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA CARRETERA ZAMORA CHUCHUMBLETZA, Provincia - Zamora Chinchipe, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3861	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,812,733.76
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/01/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	03/04/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de Zamora Chinchipe, ya sea por Administración Directa, contratos con empresas particulares y/o convenios Interinstitucionales.

OBJETO:

Mantener la RVE transitable y en buenas condiciones, con la finalidad de brindar un mejor servicio y seguridad al usuario.

LONGITUD:

RVE E50 tramo Límite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora de 43.735 km
RVE E45 tramo Límite Provincial Morona Santiago (Chuchumbletza)-Zamora de 91.75
RVE E682 tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa de 113.89 km
RVE E45-1 tramo Chumchumbletza- Pte. El Quimi-Tundayme-Valle Del Quimi de 19.05 km
RVE E45-1 tramo Pte. El Quimi-Machinatza-Proy. Hidroelectrico Sta. Cruz (Casa de Maq.) de 7.95 km

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Presupuesto General del Estado

CONTRATISTA:

Dirección Distrital de Zamora Chinchipe

SUPERVISOR:

Ing. German Álvarez - Supervisor de Conservación Vial

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El mantenimiento de la RVE es de gran importancia, ya que manteniendo las vías en buenas condiciones de transitabilidad se disminuyen los tiempos de movilización, incrementando el nivel de seguridad vial y contribuyendo al desarrollo de la Región Amazónica.

PRODUCTO

Se tendrá vías en buen estado, permitiendo un mejor servicio al usuario y mejores condiciones cuales prestarán excelentes condiciones para el tráfico provincial e interprovincial

LÍNEA BASE

DATOS GENERALES

Descripción

- Para la programación de los indicadores se tomará los rubros de mayor ejecución dentro del mantenimiento vial que se ejecuta, considerando el promedio de lo ejecutado el cuatrimestre del año anterior en cada uno de ellos, que son:

Volumen de material desalojado de la vía
Kilómetros de reconfiguración de la rasante de la vía
Kilómetros de mantenimiento rutinario de la RVE.

ESTRATEGIA

- Supervisión permanente
- Comprobación de trabajos de mantenimiento ejecutados, mismos que son informados por los Encargados del mantenimiento Vial.

Beneficios Cualitativos

- * Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de los cantones: Zamora, Palanda y Chinchipe
- * Aumentar el tiempo de vida útil de la vía
- * Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el año
- * Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo
- * Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular

Tipo de Beneficiario

Los habitantes de los cantones de: Zamora, El Pangui, Palanda y Chinchipe en los sectores agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico.


Restricciones

Calidad: No se cuenta con suficiente personal de operadores y conductores (volquetas), así como no se cuenta con el equipo necesario (rodillo, cama baja) que influyen en el rendimiento o avance de los trabajos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO


% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 73.29 %

Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

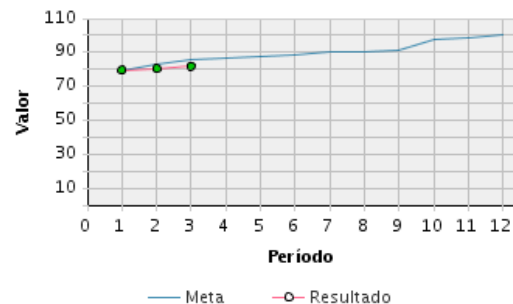

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	80 %	83 %	86 %	86 %	88 %	88 %	90 %	90 %	91 %	98 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	80 %	80 %	82 %									
2019	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes abscisas 31+205, 38+695.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/04/2019 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Cabe indicar que la descarga, limpieza y desalojo de material del km. 38.695 ocurrido el 07 de febrero de 2019 se prolongó hasta el 22 de marzo, debido a la inestabilidad del talud agravado por las continuas lluvias en la zona. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina tramo 20+060-71+200 (varios sectores) .Reposición de material de la calzada tramo 61+400-61+650 .Limpieza de derrumbes a máquina km. 11.8, 35.1, 44.3, 44.8, 46.1, 50.9, 52.0, 52.4, 53.5, 53.7, 54.4, 55.55, 57.7, 58.75, 63.7, 65.5, 66.5, 67.1, 68.8, 69.1, 71.2. Falta por completar la limpieza en varios tramos aproximadamente del 40% del volumen total. .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo) 2720 m3. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con cuatro microempresa de la zona.		
FEBRERO 2019 Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes abscisa 38+695, 38+715, 52+625 Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo .Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 9+200, 11+800, 13+595, 19+210, 42+800, 44+800, 50+100, 51+150, 52+400, 52+780, 53+000, 53+700, 53+950, 54+400, 54+950, 55+550, 55+970, 56+050, 58+750, 64+200, 68+810 .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo)	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	01/03/2019 - 02:34 PM
ENERO 2019 Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reemplazo de tabloncillos de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 .Limpieza de derrumbes abscisa 23+055, 38+715, 44+350 Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe a máquina abscisa 73+740 sector La Saquea. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo 51+500-52+000 .Reconformación de la rasante con motoniveladora tramo 51+900-52+400 .Limpieza de derrumbes a máquina varias abscisas .Movimiento de tierras sin transporte tramo 51+900-53+300 .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo)	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/02/2019 - 09:05 PM
AGOSTO 2015 El mantenimiento de las vías de la red Vial Estatal de la provincia de Zamora Chinchipe se realiza por Administración Directa, en el mes de agosto no se pudo realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes aspectos: - Falta de operadores de motoniveladora y de cargadora - Falta de recursos económicos para la adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para el equipo caminero. - Falta de maquinaria operativa, la mayoría se encuentra dañada y otras ya han cumplido su periodo de vida útil. - Falta de asignación de recursos económicos para la contratación de las microempresas - por estas razones el mantenimiento se ha realizado en un 54% de lo programado Carretera: Loja - El Tiro - Zamora Otros mantenimientos rutinarios 15 CD Limpieza de cunetas a máquina 2 km Reposición de material en calzada 800 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Transporte de material 800 m3	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación d erasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 21 km Reposición de material en calzada 1456 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Movimiento d etiertras sin trnsporte 750 m3 Transporte d ematerial 1456 m3 Explotación de material 2260 m3		
JULIO 2015 El mantenimiento de las vías de la RVE que se la realiza por Administración Directa, en el presente mes no se ha logrado realizar todas las actividades programadas debido a los siguientes factores negativos: -Situación invernal fuerte en la región, que ha provocado continuos deslizamientos y derrumbos. -Falta de asignación de recursos para la contratación de microempresas -Falta de asignación de recursos para la adquisición de combustibles y repuestos -Falta de personal de operadores -Falta de maquinaria operativa, se cuenta con la mayoría de la maquinaria dañada. Por estas razones el mantenimiento rutinario en las vías se ha logrado cubrir únicamente en un 76% de lo programado para este mes de julio. Carretera : Loja - El Tiro Zamora Limpieza de cunetas a máquina (con minicargadora) 5,00 km Otros mantenimientos rutinarios 10 CD Reposición d ematerial en calzada 600,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.000,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Rconformación de rasante con motoniveladora 24,00 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 24,00 km Reposición d ematerial en calzada 1.474,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6.700,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.550,00 m3 Otros mejoraminetos 6 CD Transporte de material 1.474,00 m3 Explotación de material 1.474,00 m3	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
DICIEMBRE 2018 Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reemplazo de tablonces de tablero del puente El Destrozo abscisa 45+370 .Limpieza de derrumbes abscisa 54+525, 55+035 .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona hasta el 07 de diciembre de 2018. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe a máquina abscisa 73+740 sector La Saquea. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona hasta el 06 de diciembre de 2018. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada tramo 50+100-50+200 .Limpieza de derrumbes a máquina abscisas 44+800, 51+200, 64+200 .Transporte de material proveniente de derrumbes (desalojo) .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona hasta el 07 de diciembre de 2018.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	02/01/2019 - 09:57 AM
NOVIEMBRE 2018 Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes a maquina abscisas 36+420, 41+345, 41+800, 44+680 .Limpieza de encauzamiento de quebrada La Voladora, aguas arriba de la alcantarilla 29+245 y en la intersección con el Río San Francisco .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona L= 20.10km.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/12/2018 - 11:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada Cayamatza abscisa. 11+960 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona . Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina 05+200; 06+700; 11+800; 15+170; 15+700; 26+500; 42+800; 44+800; 48+00; 50+100; 52+400; 52+700; 53+850; 54+960; 49+400; 47+400; 44+250; 66+800; 68+900; 69+100; 71+600 .Mantenimiento al tablero del puente sobre el rio Palanda abscisa 34+080. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona L= 22.6 km.		
OCTUBRE 2018 Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de estructura metaliza de puente El Destrozo abscisa 45+370 .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona L= 20.40 km. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Construcción de bypass, derrocamiento de puente colapsado (hormigón), armado y colocación de puente provisional tipo bailey en quebrada Cayamatza abscisa. 11+960 .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Ampliación de vía en la abscisa 40+470 sector Quiríngue. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona L= 83 km. . Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina tramo 60+100-72+100 .Limpieza de cunetas con máquina tramo 60+100-72+100 .Reposición de material de la calzada tramo 62+500-69+100 .Construcción de drenes L= 230 metros. .Colocación de alcantarillas metálicas L= 22 metros .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona L= 46.52 km.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	31/10/2018 - 02:33 PM
SEPTIEMBRE 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 sector La Saquea. .Reposición de material y reconformación de rasante bypass sector La Saquea .Movimiento de tierras con transporte sector La Saquea .Otros mantenimientos rutinarios sector La Saquea .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Limpieza de alcantarillas y zanjas de drenaje con excavadora alquilada. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante con máquina .Limpieza de cunetas con máquina .Reposición de material de la calzada .Transporte de material .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	02/10/2018 - 02:20 PM
AGOSTO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza de derrumbes 15+700, 17+650, 37+650, 55+035	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/09/2018 - 03:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Limpieza de alcantarillas a máquina: cajón de entrada 14+300, 14+320, 14+620, 14+980, 15+250, 15+300, 15+810, 15+850, 16+330, 17+020, 17+900, 19+670, 21+100, 21+450, 22+010, 22+365, 22+435, 23+125, 24+125, 24+230, 24+600, 25+900, 26+436, 29+550, 30+835, 33+660, 34+070, 35+565, 35+715, 38+010, 47+895, 48+250, 52+220, 53+700, 54+800, 55+100, encauzamiento de salida de alcantarilla 17+900, canal 25+220-22+250. .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740. .Reconformación de rasante a máquina - Sector Quiríngue 40+340-40+610 (subtramos en lastre l= 200m) .Limpieza de alcantarillas y zanjas de drenaje con excavadora alquilada. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón .Reposición de material de la calzada tramo 99+390-95+690 El Chorro-El Tablón .Limpieza de derrumbes varios sectores y desalojo de material .Movimiento de tierras sin transporte, ampliación de curva 112+290 .Limpieza de alcantarillas a máquina (alquilada), varias abscisas. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona		
JULIO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de calzada, cunetas, alcantarillas, canales, guardacaminos, derrumbes menores y señalización vertical, roza a mano, recolección de basura etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas Piedra Llza, La Saquea, Panguintza, San Pablo. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Limpieza de cunetas con máquina tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Reposición de material de la calzada tramo 99+390-113+890 El Chorro-La Balsa .Movimiento de tierras tramo 113+590-113+790 ampliación de curva .Rellenos 1604 m3 .Explotación de material 6.584 tres canteras .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/08/2018 - 12:04 PM
JUNIO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 55 .Limpieza de derrumbes a máquina km. 38.15, 44.38. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 59+490, 61+986, 62+785, 63+280, 69+915, 73+740 . .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 51+200-52+000 Palanuma .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 16+116, 23+460, 24+460, 36+100, 50+290, 51+800, 52+700, 53+000, 63+990, 67+100. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/07/2018 - 04:11 PM
MAYO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/06/2018 - 09:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea .Pintura de resaltos y puentes varias abscisas .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación y reposición de material en by pass km. 36.1 .Limpieza de derrumbes a máquina en las abscisas 11+400, 42+300, 48+780, 50+290, 52+700, 56+100, 63+600, 63+990, 64+400. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona		
ABRIL 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Reencauzamiento de quebrada La Zurita km. 25.74 .Pintado de los puentes 25+300 Qda. Navidades, 25+740 La Zurita, 32+515 San Francisco, 32+840 El Tambo, 33+840 Pte. Cruzado, 45+190 La Rapida. .Limpieza y pintado de muros ubicados al filo de calzada y en curva km. 25+300, 30+580, 40+050, 40+600, 50+920 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea .Pintura de resalto abscisa 90+450 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Limpieza de cunetas con máquina 67+300-71+800 San Antonio-El progreso .Reposición de material en la calzada tramo 65+800-69+500 sector Qda. de los muertos .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 43+390, 50+290, 52+700, 63+990, 64+400. .Movimiento de tierras abscisa 65+400, 68+300, 68+900 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	02/05/2018 - 03:31 PM
MARZO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225, 44+410-44+580 .Nivelación con mezcla asfáltica de la calzada (tramos asentados del pavimento rígido) .Limpieza a máquina del encauzamiento de entrada en la abscisas 29+245 .Pintado de los puentes Sabanilla 48+940 , Soñaderos 50+920, Chorrillos 51+645 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresa de la zona Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbe en las abscisas 73+740 La Saquea y reconformación del bypass .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresa de la zona Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reconformación de la rasante tramo 62+900-66+900 .Limpieza de cunetas con máquina 62+900-66+900 .Limpieza de derrumbes a máquina y transporte en las abscisas 19+430, 22+950, 29+000, 29+410, 34+900, 34+950, 35+100, 35+400, 42+850, 46+000, 50+290, 51+200, 52+000, 52+700, 54+200. .Movimiento de tierras abscisa 66+500 . Transporte de material movimiento de tierras) desde la abscisa 22+600 a la abscisa 46+000 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/04/2018 - 03:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Colocación de material de sub base, base y carpeta asfáltica en el tramo 38+506-39+225 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 17+770, 45+330, 49+870, 51+940, 55+010. .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresa de la zona en el tramo Loja-El Tambo de 28.6 km. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Limpieza de derrumbes en las abscisas 73+740, 88+720, 95+520 Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Reposición de material de la calzada en el tramo 51+500-52+200 .Limpieza de derrumbes en las abscisas 10+560, 43+320, 44+306, 49+600, 50+290, 51+360, 52+700, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Transporte de material (limpieza de derrumbes) desde las abscisas 51+360, 53+100, 53+890, 54+205, 56+100, 57+500, 63+990 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con microempresas de la zona en el tramo Santa Ana-Bellavista de 30 km.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/03/2018 - 11:08 AM
ENERO 2018. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, calce de estribo, construcción de muro gavión. .Construcción de cabezales de alcantarillas abs. 38+652, 38+824, 39+023, 39+148 .Construcción de subdren lateral derecho tramo: 38+652-39+024 .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 41+300-41+450, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (base) en el tramo 41+300-41+450 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con una microempresas de la zona. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	01/02/2018 - 02:43 PM
DICIEMBRE 2017. Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: .Obras de protección en Puente La Zurita km. 25.76, construcción de muro. .Reemplazo de alcantarilla abs. 38+650 y construcción de cabezales .Reconformación de rasante en tramos a lastre 38+506-39+225, 43+340-43+400, 44+380-44+510 .Reemplazo y re compactación del material de la estructura del pavimento (subbase, base) en el tramo 41+300-41+450 .Construcción de cabezales de alc. 44+380 .Colocación de base tramo 44+380-44+510 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con dos microempresas de la zona. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: .Limpieza de derrumbes a máquina abs. 52+700, 54+390 .Mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas y calzada, roza a mano, etc.) con cuatro microempresas de la zona.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	04/01/2018 - 11:01 AM
NOVIEMBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: - Limpieza de alcantarillas a máquina entre el km. 40 al 50 - Construcción de subdren longitudinal km. 50+450-50+520 - Reconformación de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 - Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (2 microempresas)	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/12/2017 - 04:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Tendido de material escombrera km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (4 microempresas) Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes a máquina km. 50.29, 50.7 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (3 microempresas)		
OCTUBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.41 y 40.43 Reencauzamiento de cauce en Pte. La Zurita km. 25.74 Reposición de pavimento rígido en tramo 54.96-54.98 Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (2 microempresas) Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc. (4 microempresas) Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 93+990-94+490 Reposición de material en la calzada en el tramo 69+250-94+490 varios sectores. Limpieza de derrumbes a máquina km. 63.990 Explotacion de material para lastrar km. 93+990 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa (4 microempresas)	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	01/11/2017 - 09:51 AM
SEPTIEMBRE 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Calce de muro km. 40.1 Reparacion de resaltos sectr El Retorno, La Fragancia y El Limon Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 43.34-43.4, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Reparación de resaltos sector Cumbaratza. Limpieza de derrumbe km. 72.75 sector La Saquea Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconformación de rasante con motoniveladora en el tramo 105+890-113+890. Limpieza de cunetas con motoniveladora en varios sectores del tramo 105+890-113+890. Reposición de material en la calzada en el tramo 105+890-113+890 Zumba-Pucapamba. Limpieza de derrumbes a máquina km. 5.710 Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/10/2017 - 10:34 AM
AGOSTO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformacion de rasante en tramos a lastre km. 38.5-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de calzada, mto. de resaltos, etc., en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 72.75 y km. 73.85 sector La Saquea	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	01/09/2017 - 03:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reposicion de material en la calzada y reconfiguracion de la calzada en el tramo Zumba-Pucapamba. Mantenimiento rutinario: en los tramos Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Santa Ana, Santa Ana-Bellavista, Bellavista-Zumba y Zumba-La Balsa		
JULIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconfiguracion de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Limpieza de derrumbes a maquina km. 14+960 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km 14+960, 25+050, 29+150, 30+650, limpieza de calzada en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de derrumbe km. 73.85 sector La Saquea Reconfiguración de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización en todo el tramo hasta el 22 de julio de 2017. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Mejoramiento de vía - ampliacion de curvas km. 60.89-71.00 tramo Bellavista-El Progreso. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano km. 54.205, 56.1	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	01/08/2017 - 11:05 AM
JUNIO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconfiguracion de rasante en tramos a lastre km. 38.6-39.225, 41.4-41.635, 44.3-44.51 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización en el tramo Límite Prov. Loja (El Tiro)-El Tambo Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 73.85 sector La Saquea, el 16 de junio se concluye el terrazo se encuentra pendiente culminar el desalojo de material Reconfiguración de rasante en bypass km. 73.85 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconfiguracion de la calzada con motoniveladora km. 78.29-85.89 Limpieza de cunetas con motoniveladora Km. 78.29-85.89 Reposicion de material en calzada km. 78.29-85.89 tramo Isimanchi-Zumba Limpieza de derrumbes km 52.7-63.99. Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	04/07/2017 - 09:53 AM
MAYOL 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Limpieza derrumbe km. 44.4 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconfiguración de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Reconfiguracion de la calzada con motoniveladora Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	02/06/2017 - 10:40 PM
ABRIL 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora:	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/05/2017 - 02:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reconformación de la rasante con motoniveladora, km. 38.506-39.225, 41+4-41.635, 44.38-44.51 Limpieza derrumbe km. 45.35 Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea, desalojo de material Reconformación de rasante km. 22.15 sector La Saquea by-pass Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 63.51, 63.89, 63.99. Reposición de material de la calzada km. 62.11 Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización.		
MARZO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Remoción y desalojo de rocas km. 41.38 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Estabilización de talud km. 22.15 sector La Saquea Mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 10.56, 52.7, 53.89. Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas y alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	04/04/2017 - 08:28 AM
FEBRERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Mantenimiento rutinario: limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de alcantarillas, puentes y señalización. Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamientos km. 22.15 sector La Saquea Estabilización de Talud km. 22.15 sector La Saquea Reconformación de rasante km. 22.1-22.15 sector La Saquea y km. 61.67-61.8 sector Quiringue Tramo Límite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 50.268, 52.7, 56.1, 63.99 Reconformación de rasante km. 10.1-11.5 Limpieza de cunetas con motoniveladora 10.1-11.5 Explotación de material 410 m3	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	06/03/2017 - 01:27 PM
ENERO 2017 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora: Reconformación de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Limpieza de calzada y colocación de puente Bailey km. 45.4 sector Velo de Novia Limpieza y desalojo de material sobre la calzada (alud) km. 46.6 Tramo Limite Provincial Morona Santiago (Chuchumbleta)-Zamora: Limpieza de deslizamiento km. 19.24 sector Chamico Estabilización de Talud km. 22.1 sector La Saquea Limpieza de derrumbe y estabilización talud km. 22.15 sector La Saquea Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa: Limpieza de derrumbes km. 31.6, 33.2, 39.5, 50.268, 50.818, 51.440, 52.7, 56.1, 63.99 Reposición de material en la calzada km. 42.6-82.4	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	03/03/2017 - 01:39 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de deslizamiento km. 63.99 sector Bellavista DICIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (El Tiro)-Zamora Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635, 44.38-44.51 sector Velo de Novia Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (Chuchumbleta)-Zamora Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea Tramo Limite Provincial Loja (Sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de deslizamiento km. 56.1. Limpieza de calzada km. 54.256-54.424 Reposicion de material en calzada Km. 52.6	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	02/02/2017 - 02:52 PM
NOVIEMBRE 2016 En el presente mes se ejecutaron los siguientes trabajos: Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Zamora Estabilizacion de talud mediante conformacion de terrazas km. 30.6 sector San Francisco Estabilizacion de talud mediante la descarga de material suelto km. 35.8 sector Santa Rita Reconformacion de la rasante km. 38.5-39.225 sector El Retorno, km. 41.4-41.635 sector Velo de Novia Tramo Limite Provincial Morona Sntiago (chuchumbleta)-Zamora Reconformacion de rasante km. 61.67-61.8 sector Quiringue Estabilizacion de Talud km. 22.1 sector La Saquea Tramo Limite Provincial Loja (sabanilla)-Bellavista-Zumba-La Balsa Limpieza de cauce y reconformacion de acceso de entrada y salida a Qda. de los Muertos km. 6 Limpieza de derrumbes km. 18.94 Mantenimiento del Puente Agua Dulce km. 43.2	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/12/2016 - 01:42 PM
OCTUBRE 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbleta Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 1008 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 15480 m3 sector El Limón, La Saquea, km 38 vía Loja - Zamora y varios deslizamientos a lo largo de la vía Bellavista Zumba. SEPTIEMBRE 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Chuchumbleta Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 6 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 2078 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 3008 m3 sector La Saquea y otros derrumbes a lo largo de la vía.	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	05/12/2016 - 01:42 PM
JULIO 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatzá Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 3 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 600 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 10000 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía.	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	03/08/2016 - 12:57 PM
MAYO 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatzá Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1 kilómetros. Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 14500 m3 ABS 30+600, 44+000 y otros derrumbes a lo largo de la vía. Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	06/06/2016 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 26,50 km, Se realizó Reposición de material en calzada 6118 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 2000 m3 a lo largo de la vía.		
ABRIL 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora - Yantzatzá Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 16 km Se realizó Reposición de material en calzada 500 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 30980 m3 ABS 30+600 y otros derrumbes a lo largo de la vía. Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 15 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 15 km, Se realizó Reposición de material en calzada 5330 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 1150 m3 a lo largo de la vía.	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	05/05/2016 - 04:52 PM
MARZO 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 1,2 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 1,2 km Se realizó Reposición de material en calzada 240 m3. Se realizó limpieza de derrumbes un volumen de 8.944 m3 ABS 38+600. Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 0,8 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 0,8 km, Se realizó Reposición de material en calzada 504 m3	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	06/04/2016 - 08:25 AM
FEBRERO 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km Se realizó Reposición de material en calzada 608 m3. Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Se realizó trabajos de Reconformación de Rasante con Motoniveladora en una longitud de 12 kilómetros, adicionalmente se realizó limpieza de cunetas con motoniveladora un longitud de 4 km	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	05/04/2016 - 05:05 PM
ENERO 2016 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD Reposición de material en calzada 320 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 3.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 1,7 Km	Arevalo Maldonado, Diego Fernando	05/04/2016 - 04:35 PM
DICIEMBRE 2015 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 2 Km Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Otros mejoramientos 1 CD Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 9.6 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,7 Km Reposición de material en calzada 488 m3	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	05/01/2016 - 04:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2015 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 24,00 km Otros mantenimientos rutinarios 2 CD Otros mejoramientos 3 CD Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 10.90 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 5.30 Km Reposición de material en calzada 1328 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 Reposición de rellenos 672 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Explotación de material 1320 m3	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	07/12/2015 - 10:43 AM
OCTUBRE 2015 Carretera: Loja El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 4,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18,00 km Otros mantenimientos rutinarios 4 CD Reposición de material en calzada 480,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 540,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 250,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 48 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 Km Otros mantenimientos rutinarios 12 CD Reposición de material en calzada 2.810,00 m3 Reposición de rellenos 320,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 3.150,00 m3 Explotación de material 3.160,00 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/11/2015 - 09:37 AM
SEPTIEMBRE 2015 Carretera: Loja - El Tiro - Zamora Reconformación de rasante con motoniveladora 3,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 3,00 km Otros mantenimientos rutinarios 15 CD. Reposición de material en calzada 320,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600,00 m3 Supervisión de campo 22 CD Transporte de material 320,00 m3 Explotación de material 320,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 26,00 Km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26,00 km Reposición de material en calzada 1.300,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1.800,00 m3 Transporte de material 1.10,00 m3 Explotación de material 1.830,00 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/10/2015 - 12:02 PM
Carretera: Loja - Zamora Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 250 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 3000 m3 Supervisión de campo 22 Cd Explotación de material 250 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 37 km Otros mantenimientos rutinarios 8 Cd. Reposición de material en calzada 560 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 8280 m3 Otros mejoramientos 6 CD.	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/07/2015 - 08:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Transporte de material 3710 m3 Explotación de material 560 m3		
MAYO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Otros mantenimientos rutinarios 10 cd. Reposición de material en calzada 60 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4500 m3 Supervisión de campo 20 cd Transporte de material 60 m3 Explotación de material 60 m3 Carretera: El Retorno La Fragancia Vía Antigua Reposición de material en calzada 64 m3 Trasnporte de material 64 m3 Explotación de material 64 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 37 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km Reposición de material en calzada 1956 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6470 m3 Movimiento de tierras sin transporte 17950 m3 Transporte de material 1956 m3 Explotación de material 1956 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	04/06/2015 - 01:50 PM
ABRIL 2015 Carretera Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km Limpieza de cunetas a mano 6.3 km Limpieza de alcantarillas 126.8 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 7 und Roza a mano 5.2 hás Otros mantenimiento rutinarios 6 cd Limpieza de derrumbes a máquina 8400 m3 Otros mejoramientos (colocación de señales verticales) 34 und Supervisión d e campo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 166 m3 Reconformación d erasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas a mano 0.50 km Limpieza de alcanatrillas 136 m3 Roza a mano 4.3 hás Otros mantenimientos rutinarios 6 cd Reposición de material en calzada 1008 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 10102 m3 reposición d erellenos 150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 1000 m3 Explotación d ematerial 1000 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/05/2015 - 10:58 AM
MARZO 2015 Carretera: Loja Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12,75 km Limpieza de alcantarillas 99,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 4 Und. Roza a mano 11,13 hás Limpieza de derrumbes a maquina 2100,00 m3 Reposición de rellenos 150 m3 Supervisión de campo 22 CD Mantenimiento de instalaciones 10 CD Transporte de material 150,00 m3 Explotan de material 150,00 m3 Carretera : Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 468,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 30,00 km	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/04/2015 - 07:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de cunetas con motoniveladora 30,00 km Limpieza de cunetas a mano 1,75 km Limpieza de alcantarillas 142,00 m3 Roza a mano 4,87 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Reposición de material en calzada 1050,00 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 6300,00 m3 Reposición de rellenos 450,00 m3 Transporte de material 1500,00 m3 Explotación de material 1500,00 m3		
FEBRERO 2015 Carretera : Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 6.20 km Limpieza de alcantarillas 115.40 m3 Roza a mano 5.40 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 cd. Reposición de material en calzada 300 m3 Limpieza de derrumbes a maquina 2400 m3 Reposición de rellenos 520 m3 Supervisión de campo 20 cd. Mantenimiento de instalaciones 4 dc. Explotación de material 300 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 38 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 38 km Limpieza de cunetas a mano 5,65 km Limpieza de alcantarillas 10 m3 Roza a mano 10,35 hás Otros mantenimientos rutinarios 3 cd. Reposición de material en calzada 976 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4000 m3 Transporte de material 2264 m3 Explotación de material 976 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/03/2015 - 11:37 AM
ENERO 2015 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 9 km Limpieza de alcantarillas 88.5 m3 Roza a mano 12.22 Hás Otros mantenimiento rutinarios 1 CD Limpieza de derrumbes a máquina 2000 m3 Reposición de rellenos 640 m3 Supervisión de campo 21 CD Mantenimiento de instalaciones 6 CD Transporte de material 640 m3 Explotación de material 640 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 60 m3 Reconformación de rasante con Motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas a mano 6.8 km Limpieza de alcantarillas 28 m3 Roza a mano 9.11 hás Reposición de material en calzada 1650 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2200 m3 Transporte de materiales 1108 m3 Explotación de material 1108 m3 DICIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Bacheo de lastre a mano 10 m3 Limpieza de cunetas a mano 12 km Limpieza de alcantarillas 53,70 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 6,69 hás	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/02/2015 - 11:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reposición de material en calzada 1.081,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 6.500,00 m3 Transporte de material 6.500 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Bacheo de lastre a mano 40 m3 Limpieza de cunetas a mano 4,10 km Limpieza de alcantarillas 91,00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 und Roza a mano 15,50 hás Reposición de material en calzada 2.452,00 m3 Explotación de material 3.221,00 m3		
NOVIEMBRE 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cuentas a mano 12.0 km Limpieza de alcantarillas 54.00 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. Roza a mano 6.75 hás Otros mantenimientos rutinarios 20 CD Reposición de material en calzada 120.00 m3 Limpieza de derrumbes a mano 13.50 m3 Movimiento de tierras sin Transporte 11400.00 m3 Supervisión de campo 19 CD Mantenimiento de instalaciones 5 CD Transporte de materiales 11400.00 m3 Explotación de material 120.00 m3 Limpieza de señales verticales 1295.00 Und Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 65.00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 54.00 km Limpieza de cunetas a mano 4.0 km Limpieza de alcantarillas 91.00 m3 Roza a mano 15.50 Hás Otros mantenimientos rutinarios 3 CD Limpieza de derrumbes a máquina 4750.00 m3 Transporte de material 2852.00 m3 Explotación de material 432 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	02/12/2014 - 11:31 AM
OCTUBRE 2014 carretera Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 13.60 km Limpieza de alcantarillas 196.40 m3 Roza a mano 6.95 hás Reposición de material en calzada 480,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 12000,00 m3 Supervisión de campo 22 cd Mantenimiento de instalaciones 10 cd. Transporte de materiales 12000,00 m3 Explotación de material 480,00 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 60,00 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 54,00 km Limpieza de cunetas a mano 10,40 km Limpieza de alcantarillas 19,50 m3 Roza a mano 13,20 hás Reposición de material en calzada 785,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2500 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4250,00 m3 Transporte de materiales 785,00 m3 Explotación de material 785,00 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/11/2014 - 04:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de cunetas a mano 22.00 km Limpieza de alcantarillas 153 m3 Roza a mano 9.48 hás Otros mantenimientos rutinarios 1 CD Movimiento de tierras sin transporte 13200 m3 Mantenimiento de instalaciones 7 CD Trasnporte de material 13200 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Bacheo de lastre a mano 50 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 21 km Limpieza de cuentas con motoniveladora 21 km Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de alcantarillas 12 m3 Roza a mano 13.89 hás Reposición d ematerial en calzada 2300 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2400 m3 Reposición de rellenos 900 m3 Movimiento de tierras sin trnsporte 600 m3 Otros mejoramientos 24 m3 Explotación de material 3200 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/11/2014 - 04:18 PM
AGOSTO 2014 Carretera: Loja - Zamora Limpieza de alcantarillas 3.060,00 m3 Roza a mano 1.17 Hás Limpieza de derrumbes a máquina 17.940 m3 Supervisión de campo 21 cd. Mantenimiento de instalaciones 5 cd Carretera: El Retorno La Fragancia vía Antigua Reconformación de rasante con motoniveladora 9 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Limpieza de derrumbes a máquina 3.900,00 m3 Movimiento de tierras sin transporte 4.200,00 m3 Carretera: Chuchumbleta - El Quimi - Campamento Mirador y El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 30 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 60 km Otros mantenimientos rutinarias 4 cd Reposición de material en calzada 1.760,00 m3 Trasnporte de material 1.760 m3 Explotación de material 1.760,00 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	03/09/2014 - 04:04 PM
JULIO 2014 Carretera : El Tiro Zamora Limpieza de alcantarillas 1560 m3 Reposición de material en calzada 240 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 15900 m3 Movimiento de tierras sin transporte 600 m3 Supervisión de campo 23 CD Transporte de materiales 240 m3 Explotación de material 200 m3 Carretera :El Retorno La Fraganciaaa Limpieza de cunetas con motoniveladora 9 km Carreterea: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 13 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 26 km Otros mantenimientos rutinarios 19 CD Reposición de material en calzada 1640 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 1350 m3 Transporte de materiales 1640 m3 Explotación de material 1640 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/08/2014 - 02:45 PM
JUNIO 2014 carretera: Loja - Zamora	Román Carrión, Carlos Aníbal	05/08/2014 - 02:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de derrumbes a máquina 11.160,00 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa Reconformación de rasante con Motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Otros mantenimientos rutinarios 26 CD Reposición de material en calzada 200 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 4.100 m3 Trasnporte de material 200 m3 Explotación de material 200 m3		
MAYO 2014 Carretera Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 14.600,00 m3 Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante con motoniveladora 40 km Limpieza de cunetas con Motoniveladora 40 km Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reposición de material en calzada 2.160,00 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 730 m3 Colocación de nueva tubería 10 ml Movimiento de tierras sin transporte 1.790 m3 Transporte de material 2.160,00 m3 Explotación de material 1.500,00 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	03/06/2014 - 03:53 PM
ABRIL 2014 Carretera Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 6900 m3 Supervisión de campo 21 CD Apoyo a otras instituciones 294 E/h (Municipio de Yanzatza, encausamiento del río Chicaña sector la Unión) Carretera El Retorno La Fragancia Reconformación de rasante econ mtooniveladora 3 km Limpieza de cunetas con motoniveladora Carretera Bellavista Zumba La Balsa Reconformación d erasante con motoniveladora 6 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 6 km Reposición d e material en calzada 1680 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 2910 m3 Movimiento d etierras sin transporte 2150 m3 Transporte de materiales 1680 m3 Explotación d ematerial 2150 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	29/05/2014 - 02:21 PM
MARZO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de cunetas a mano 2.5 km Limpieza de derrumbes a máquina 11200 m3 Supervisión de campo 21 CD. Carretera: El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 700 m3 Reposición de rellenos 1200 m3 Transporte de material 700 m3 Carretera: Bellavista Zumba La Balsa Reconformación d erasante con motoniveladora 20 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km Reposición d ematerial en calzada 2730 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 6150 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2730 m3 Transporte de material 2730 m3 Explotación de material 3350 m3	Dávila Cadena, Christian Roberto	23/04/2014 - 02:28 PM
FEBRERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 7500 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia Reconformación d erasante con motoniveladora 16 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km Reposición de material en calzada 1420 m3 Reposición de rellenos 3200 m3 Movimiento de tierras sin trasnporte 3000 m3 Transporte de material 3000 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2014 - 02:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Reposición de material en calzada 2380 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 600 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1840 m3 Explotación de material 1840 m3		
ENERO 2014 Carretera: Loja Zamora Limpieza de derrumbes a máquina 1800 m3 Carretera: El Retorno la Fragancia Reposición de material en calzada 1000 m3 Transporte de material 300 m3 Carretera: Chuchumbleta El Quimi- Tundayme Mirador , El Quimi Manchinatza Santa Cruz Reconformación de rasante con motoniveladora 24 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km Carretera : Bellavista Zumba La Balsa Reconformación de rasante con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Reposición de material en calzada 740 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 7250 m3 Movimiento de tierras sin transporte 2050 m3 Explotación de material 2310 m3 DICIEMBRE 2013 carretera Loja Zamora Limpieza de alcañatillas 245 m3 Roza a mano 2.5 has Carretera El Retorno La Fragancia Reposición de material en calzada 2000 m3 Reposición de rellenos 2000 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 168 m3 reconformación de rasante con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km Limpieza de cunetas a mano 4.8 km Limpieza de alcañatillas 48 m3 Inspección y mantenimiento de puentes 3 Und. Roza a mano 24 has Reposición de material en calzada 2056 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 120 m3 Movimiento de tierras sin transporte 1620 m3 Explotación de material 1740 m3	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	11/03/2014 - 04:32 PM
NOVIEMBRE 2013 Carretera El Tiro Zamora Bacheo de lastre a mano 24 m3 Roza a mano 2.45 Has Otros mejoramientos colocación de tachas 2341 und Carretera El Retorno la Fragancia via Antigua Reconformación de rasante con Motoniv. 15 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km Reposición de material en calzada 430 m3 Reposición de rellenos 1490 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa Bacheo de lastre a mano 102 m3 Reconformación de rasante con motoniveladora 19 km Limpieza de cunetas con motoniveladora 18 km Limpieza de cunetas a mano 1.48 km Limpieza de alcañatillas 48 m3 Roza a mano 23.8 has Reposición de material en calzada 1990 m3 Limpieza de derrumbes a máquina 920 m3 Otros mejoramientos. construcción de 6 muros de piedra 64 m3 Explotación de material 2100 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	04/12/2013 - 09:01 AM
OCTUBRE 2013 Carretera: El Tiro zamora	Román Carrión, Carlos Aníbal	06/11/2013 - 02:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Roza a mano 4.5 hás - Reposición de rellenos 260 m3 Carretera: El Retorno La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 30 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59.59 m3 - Otros mantenimientos rutinarios 12 CD - Supervisión de campo 22 CD Carretera: Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 293 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 24.5 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 24. 5 km - Limpieza de cunetas a mano 8.25 km - Limpieza de alcantarillas 15.00 m3 - Roza a mano 18.4 hás - Reposición de material en calzada 1650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 310 m3 - Movimiento de tierras sin transporte 950 m3 - Otros mejoramientos (construcción de muros secos) 34 m3 - Explotación de material 1270 m3		
SEPTIEMBRE 2013 carretera : Chuchumbleta - Tundayme San Marcos y El Quimi Manchinatza - Reconformación d erasante con motoniveladora 10 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Reposición d ematerial en calzada 750 m3 Carretera El Retorno La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Reconformación d erasnte con motoniveladora 15 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas a mano 3 km - Limpieza de alcantarillas 59,59 m3 - Reposición d e material en calzada 650 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 550 m3 - Inspección y mantenimiento d epuentes 1 und. - Roza a mano 4.26 hás - Mantenimiento d instalaciones 10 CD - Explotación de material 650 m3 Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 233 m3 - Reconformación de rasnte con motoniveladora 36 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 36 - Limpieza de cunetas a mano 8,20 km - Limpieza de alcantarillas 10 m3 - Reposición de material en calzada 2510 m3 -Roza a mano 4.26 hás - Reparación y mantenimiento de señales verticales 150 und. - Movimiento de tierras sin transporte 4880 m3 - Explotación de material 4380 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	02/10/2013 - 11:46 AM
AGOSTO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Bacheo de lastre a mano 63 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3,1 km - Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Limpieza de alcantarilla 4 Und. 24 m3 - Roza a mano 2,94 hás - Limpieza de derrumbes a mano 30 m3 Carretera Chuchumbleta Tundayme San Marcos Campamento Mirador -Reconformación d e rasante con motoniveladora 16 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km -Limpieza de alcantarillas 12 m3 -Servicio de gabarra 96 E/h -Reposición d e material en calzada 1090 m3 - Explotación de material 1090 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	17/09/2013 - 08:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Carretera Bellavista Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 239 m3 -Reconformación d e rasante con motoniveladora 20 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 20 km - Limpieza de cuentas a mano 1,3 km -Limpieza de alcantarillas 60 m3 -Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. - Roza a mano 24,35 há -Reposición de material en calzada 2030 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 200 m3 - Movimiento d eterras sin transporte 1950 m3 - Explotación de material 2070 m3 JULIO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Reposición de material en calzada 100 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 2700 m3 Carretera El Retorno - La Fragancia - Limpieza de cunetas a mano 4,7 km km 561 m3 - Limpieza de alcantarillas 45 m3 - Roza a mano 4,56 há -Inspección y mantenimiento de puentes 1 Und. Carretera Chuchumbleta El Quimi - Tundayme San Marcos - Reconformación de rasante con motoniveladora 7km Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano 187 m3 -Reconformación de rasante con moto 37,8,80 km -Limpieza de cunetas con moto 22,80 km -Limpieza de cunetas a mano 19,1 km -Roza a mano 17,85 há -Reposición de material en calzada 2620 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1320 m3 -Explotación de material 1320 m3 - Inspección y arreglo de señales verticales 42 Und. JUNIO 2013 Carretera El Tiro - Zamora - Otros mantenimiento rutinarios 32 H/h - Reposición de material en calzada 220 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 12450 m3 - Explotación de material 220 m3 Carretera El Retorno - La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 60 m3 - Limpieza de cunetas a mano 3.5 km 418 m3 - Limpieza de alcantarillas 60 m3 - Roza a mano 5.52 há Carretera Bellavista Zumba La Balsa - Bacheo de lastre a mano -Limpieza de cunetas a mano 0.60 km -Roza a mano 19.40 há -Reposición de material en calzada 1550 m3 -Movimiento de tierras sin transporte 1020 m3 -Explotación de material 1020 m3		
MAYO 2013 Carretera: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 3850 m3 -Supervisión de campo 176H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo d elastre a mano 120 m3 -Reconformacion de rasante con motoniveladora 4 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 7 km - Limpieza de alcantarillas 48 m3 - Roza a mano 9.0 há - Reposición de material en calzada 1925 m3 -Supervisión de campo 176 H/h	Román Carrión, Carlos Aníbal	02/07/2013 - 04:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Explotación de material 1925 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 75 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 11.2 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 11.2 km - Roza a mano 19.00 hás - Reposición de material en calzada 515 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 1920 m3 - Explotación de material 515 m3 ABRIL 2013 Carretera: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 5735 m3 - Supervisión de campo 176 H/h Carretera: El Retorno - La Fragancia - Bacheo de lastre a mano 324 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 12 km - Limpieza de cunetas a mano 547.50 m3 - Roza a mano 4.0 hás - Reposición de material en calzada 56 m3 - Supervisión de campo 176 H/h Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Bacheo de lastre a mano 167 m3 - Reconformación de rasante con motoniveladora 9.6 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 9.6 km - Roza a mano 11.53 hás - Reposición de material en calzada 444 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 630 m3 - Explotación de material 680 m3 MARZO 2013 Carretera: Loja - Zamora - Limpieza de derrumbes a máquina 11050 m3 Carretera: El Retorno - La Fragancia - Reconformación de rasante con motoniveladora 17 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 17 km - Roza a mano 2.3 hás - Reposición de material en calzada 1000 m3 - Supervisión de campo 168 H/h - Explotación de material 1000 m3 Carretera: Bellavista - Zumba - La Balsa - Reconformación de rasante con motoniveladora 19.7 km - Limpieza de cunetas con motoniveladora 19.7 km - Roza a mano 6.4 hás - Reposición de material en calzada 800 m3 - Limpieza de derrumbes a máquina 1160 m3 - Explotación de material 800 m3		
FEBRERO 2013 Carretera Loja - Zamora * Limpieza de derrumbes a máquina 21600 m3 * Supervisión de campo 152 H/h Carretera : El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 15 km * Reposición de material en calzada 1605 m3 * Explotación de material 1605 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con motoniveladora 17.8 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 17.8 km * Reposición de material en calzada 970 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 880 m3 * Movimiento de tierras sin transporte 420 m3 * Explotación de material 970 m3 Carretera Chuchumbeta El Quimi Tundayme	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2013 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Servicio de gabarra 152 E/h		
ENERO 2013 Carretera Loja - Zamora * Limpieza de derrumbes a máquina 20400 m3 * Supervisión d e campo 176 H/h Carretera : El Retorno - la Fragancia * Reposición de material en calzada 440 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación d erasante con motoniveladora 6.2 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 6.2 km * Reposición de material en calzada 830 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1100 m3 * Explotación de material 830 m3 Carretera Chuchumbletza El Quimi Tundayme * Servicio de gabarra 176 E/h	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2013 - 03:28 PM
DICIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 16 km * Limpieza de cunetas con moto 16 km * Limpieza de alcantarillas 31 m3 * Roza a mano 2,25 has * Reposición de material en calzada 600 m3 * Transporte de material 600 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 150 m3 * Reconformación de rasante con moto 5,3 km * Limpieza de cunetas con moto 5,3 km * Inspección y mantenimiento de puentes 2 Und * Roza a mano 15,00 has * Reposición d e material en calzada 2770 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 160 m3 * Movimiento de tierras siun transporte 950 m3 * Explotación de material 2770 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2013 - 03:27 PM
NOVIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación de rasante con moto 17 km * Limpieza de cunetas con moto 17 km * Limpieza de alcantarillas 24 m3 * Roza a mano 1,71 has * Reposición de material en calzada 200 m3 * Transporte de material 200 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 21 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo de lastre a mano 80 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantetenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 15,00 has * Reposición d e material en calzada 3060 m3 * Explotación de material 3060 m3	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2013 - 03:26 PM
OCTUBRE 2012 Carretera El Retorno - la Fragancia * Reconformación d erasante con moto 28 km * Limpieza de cunetas con moto 20 km * Limpieza de alcantarillas 32 m3 * Roza a mano 2,49 has * reposición de material en calzada 305 m3 Carretera Chuchumbletza Tundayme * Otros mantenimiento rutinarios 20 CD (Servicio de gabarra) carretera Bellavista Zumba - La Balsa *Bacheo d elastre a mano 55 m3 * Limpieza de alcantarillas 8 m3 * Inspección y Mantenimiento de puentes 2 Und. * Roza a mano 19,00 has	Román Carrión, Carlos Aníbal	25/03/2013 - 03:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
*Reposición de material en calzada 4380 m3 *Explotación de material 4380 m3		
ACTIVIDADES REALIZADAS: SEPTIEMBRE 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformación de rasante con moto 39 km * Limpieza de cunetas con moto 43 km * Limpieza de alcantarillas 36 m3 * Roza a mano 3,9 Hás * Inspección y mantenimiento de puentes 2 Und *Reposición de material en calzada 750 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1440 m3 Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * bacheo de elastre a mano 105 m3 * Reconformación de rasante con moto 8 km *Limpieza de cunetas con moto 8 km * Roza a mano 22,1 hás *Reposición de material en calzada 1020 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 1050 m3 * Mantenimiento de instalaciones 3 Cd AGOSTO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia *Reconformación de rasante con moto 15 km * Limpieza de cunetas con moto 25 km *Reposición de material en calzada 1380 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1200 m3 * Apoyo a otras instituciones 8 E/H Carretera Bellavista Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con moto 26 km *Limpieza de cunetas con moto 48 km *Reposición de material en calzada 3282 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 5000 m3 * reposición de rellenos 1050 m3 * Movimientos de tierras sin transporte 4000 m3 * Mantenimiento de instalaciones 16 Cd JULIO 2012 Carretera El Retorno - La Fragancia * Otros mantenimiento rutinarios 12 CD *Transporte de materiales 120 m3 * Explotación de material 120 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa *Bacheo de elastre a mano 80 m3 *Reconformación de rasante con moto 20 km * Limpieza de cunetas con moto 40 km * Reposición de material en calzada 4000 m3 *Limpieza de derrumbes a máquina 10850 m3 JUNIO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3 Carretera Bellavista - Zumba - La Balsa * Reconformación de rasante con motoniveladora 16 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 16 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 11000 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 2000 m3 MAYO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 48 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 48 km * Reposición de material en calzada 1000 M3	Román Carrión, Carlos Aníbal	10/01/2013 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
* Reposición d e rellenos 1500 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3300 M3 * Transporte de materiales 2000 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 672 E/H carretera Chuchumbletza Tundayme *Reposición d eMaterial en calzada 1000 m3 * Explotación de material 1000 m3 ABRIL 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 10 km * Limpieza de cunetas con motoniveladora 10 km * Reposición de material en calzada 1000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 1400 M3 * Transporte de materiales 600 m3 * Explotación de material 1000 m3 * Apoyo a otras Instituciones 480 E/H MARZO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 4 km * Reposición de material en calzada 5000 M3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400 M3 * Movimiento de tierras sin transporte7500 m3 FEBRERO 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 17 km * Limpiezade cunetas con Motoniveladora 17 km * Reposición de material en calzada 900 m3 * Reposición d e rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 7400 ENERO: 2012 Carretera : El retorno la Francia * Reconformación de rasante con motoniveladora 15 km * Limpiezade cunetas con Motoniveladora 15 km * Reposición de material en calzada 900 m3 *Reposición d e rellenos 600 m3 * Limpieza de derrumbes a máquina 3100 m3 * Explotación de material 1500 m3 * transporte de material 600 m3		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de asignación de recursos para la contratación de obras provocaría el incumplimiento de hitos programados.	03/04/2019	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	50	70	35	0/1
Falta operadores de maquinaria provocaría el incumplimiento de metas programadas	03/04/2019	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	50	70	35	1/2

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Recortes presupuestarios al PAI 2019 CAUSARÍA que no pueda ejecutar todos los trabajos requeridos para la conservación vial	03/04/2019	Ximena del Cisne Toledo Vásquez	60 %	70	42	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Chinchipe
2	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui
3	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda
4	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.5
2	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.5
3	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.5
4	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	0.5
5	EJECUCIÓN. Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 1, terminado	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.5
6	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
7	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía Chuchumbleta-Tundayme-Condor Mirador, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5
8	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. Fase 2, terminado							
9	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista - Zumba - la Balsa, terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante y limpieza de cunetas con motoniveladora en la vía Bellavista - Zumba - La Balsa Fase 2, terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en la vía Bellavista-Zumba-La Balsa, terminado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Roza a mano, limpieza de alcantarillas en todas las vías, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento normalmente en año 2013, terminado	5-Entregables Intermedios	02/01/2013		02/01/2013		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Explotación y reposición de material en calzada en la vía antigua: Zamora-Loja, tramo: La Fragancia-El Retorno, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2012		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal , terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante con motoniveladora en las vías de la Rede Estatal, terminado	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Rede Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
20	Ejecución: Inicio de trabajos de mantenimiento para el año 2014, terminado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2014		02/01/2014		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Explotación de material vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCIÓN: Reconformación de rasante con motoniveladora en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
30	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2015	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
31	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2015	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
35	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2015	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
36	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	1.0
37	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Reposición de material en calzada en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
41	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes a máquina en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Reposición d e material en calzada en las vías de la Rede Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Roza a mano en las vías de la Red Estatal, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2016	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.0
48	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
49	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
50	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2016	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.0
51	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2016	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	1.0
52	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2016	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
53	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2016	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	1.0
54	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2016	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.0
55	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2016	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	1.0
56	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2016	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.0
57	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2016	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.0
58	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		30/12/2016		Sí	1.0
59	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Enero 2017	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	1.0
60	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Febrero 2017	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	1.0
61	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes dEe Marzo 2017	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
62	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Abril 2017	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	1.0
63	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Mayo 2017	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.0
64	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Junio 2017	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
65	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Julio 2017	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	1.0
66	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Agosto 2017	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	1.0
67	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Septiembre 2017	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	1.0
68	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Octubre 2017	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	1.0
69	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Noviembre 2017	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	1.0
70	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Estatal mes de Diciembre 2017	5-Entregables Intermedios	28/12/2017		28/12/2017		Sí	1.0
71	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Enero 2018.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.0
72	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Febrero 2018.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.0
73	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Marzo 2018.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.0
74	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Abril 2018.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.0
75	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Mayo 2018.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.0
76	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Junio 2018.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.5
77	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	emergente de la RVE en el mes de Julio 2018.							
78	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Agosto 2018.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.5
79	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Septiembre 2018.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.5
80	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Octubre 2018.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.5
81	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Noviembre 2018.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.5
82	CIERRE: INFORME FINAL Supervisión de Conservación vial	9-Entregables Formales	31/12/2018		04/01/2019		Sí	0.5
83	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo y/o emergente de la RVE en el mes de Diciembre 2018.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
84	Elaboracion de POA 2019	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.5
85	EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH."	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.5
86	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.5
87	EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA CAYAMATZA"	3-Adjudicación	28/02/2019	28/02/2019			No	0.5
88	EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH."	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.5
89	EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA	3-Adjudicación	28/02/2019	28/02/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	GUAGUAYME, DE LA RVE E45"							
90	EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45"	3-Adjudicación	28/02/2019	28/02/2019			No	0.5
91	EJECUCION: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3-Adjudicación	28/02/2019	28/02/2019			No	0.5
92	EJECUCION: Servicios de Mto. Rutinario de la RVE de la Provincia	3-Adjudicación	28/02/2019		01/03/2019		Sí	0.5
93	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.5
94	EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA CAYAMATZA"	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	0.5
95	EJECUCION: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH."	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.5
96	EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GUAGUAYME, DE LA RVE E45"	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	0.5
97	EJECUCION: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45"	5-Entregables Intermedios	31/03/2019	31/03/2019			No	0.5
98	EJECUCION: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, PINTURA, TABLONES, ETC.)	9-Entregables Formales	31/03/2019	31/03/2019			No	0.5
99	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.5
100	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	0.5
101	EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS Y RESTITUCIÓN DE GUARDAVIAS EN LA RVE E50, TRAMO: LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO) - ZAMORA DE 43,735 KM	3-Adjudicación	31/05/2019	31/05/2019			No	0.5
102	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
103	EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS Y RESTITUCIÓN DE GUARDAVIAS EN LA RVE E50, TRAMO: LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO) - ZAMORA DE 43,735 KM	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	0.5
104	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	0.5
105	EJECUCION: "CONSTRUCCION DE MUROS Y RESTITUCIÓN DE GUARDAVIAS EN LA RVE E50, TRAMO: LÍMITE PROVINCIAL LOJA (EL TIRO) - ZAMORA DE 43,735 KM	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.5
106	EJECUCION: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, PINTURA, TABLONES, ETC.)	9-Entregables Formales	31/07/2019	31/07/2019			No	0.5
107	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.5
108	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	0.5
109	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.5
110	CIERRE: "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA CAYAMATZA"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
111	CIERRE: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO CAMINERO, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SEMIRÍGIDO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE ZAMORA CH."	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
112	CIERRE: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA DELICIA, DE LA RVE E45"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
113	CIERRE: "OBRAS DE PROTECCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN ROQUE, DE LA RVE E45"	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
114	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administracion Directa y Aso. de conservacion vial	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	5.0
115	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Administración Directa y Aso. de conservación vial							
116	CIERRE: Elaboración POA 2020	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5
117	CIERRE: INFORME FINAL Supervisión de Conservación vial	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5
118	EJECUCION: Trabajos de mantenimiento de la RVE por Administración Directa y Aso. de conservación vial	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto se desarrolla de acuerdo a la planificación	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	30/06/2017
2	Se cumplen actividades planificadas en el proyecto"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	21/07/2016
3	"Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: BELLAVISTA-ZUMBA-LA BALSA"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/12/2015
4	"Limitado mantenimiento en la red estatal, carretera: Zamora-Loja"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/07/2015
5	Se realizan trabajos de mantenimiento en la red estatal Zamora-Loja"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	18/03/2015
6	"Verificación de trabajos realizados en el mes de septiembre en las vías de la red estatal: Carretera Bellavista-Zumba-La Balsa	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	14/10/2014
7	Seguimiento del proyecto	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/03/2014
8	ZAMORA 2: Proyecto se encuentra en curso	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/08/2013
9	Seguimiento de cumplimiento y avance del proyecto mantenimiento Red Vial Estatal	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/02/2013
10	Historico - Se ejecutan trabajos de mantenimiento.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/08/2012
11	Historico - Conforme a la visita realizada el 20 de junio de 2012, en el tramo: La Fragancia- El Retorno, se evidenció que los trabajos de mantenimiento de la vía aún no se han llevado a cabo en	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	20/06/2012
12	Historico - En ejecución	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/06/2012
13	Historico - Proyecto en ejecución.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/05/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	volumen de material desalojado de la vía		557.86 %	12,500	69,733	03/01/2012	Marzo
2	Kilómetros de reconformación de rasante de la vía		249.41 %	2.55	6.36	03/01/2012	Marzo
3	Kilómetros de Mantenimiento Rutinario de la RVE		67.92 %	131	88.98	01/01/2018	Marzo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,812,733.76 **
Costo Total:	13,544,464.89
Total Devengado:	15,585,276.80
% Costo Total Devengado:	115.07 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 115.07 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	19,498,962.85	3,977,683.87	0.00	23,476,646.72
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	8,596,164.61	2,227,456.96	0.00	10,823,621.57
Ppto. Codificado	17,875,030.75	2,227,456.96	0.00	20,102,487.71
Ppto. Comprometido	17,243,948.89	0.00	0.00	17,243,948.89
Planeado - Codificado (2019)		1,750,226.91		
Programado a Devengar	12,146,611.89	2,227,456.96	0.00	14,374,068.85
Ppto. Devengado	15,585,276.80	0.00	0.00	15,585,276.80
Pagado Real	12,124,044.73	0.00	0.00	12,124,044.73
Estimado a fin de año	* 15,585,276.80	0.00	0.00	15,585,276.80
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,438,664.91	2,227,456.96	0.00	-1,211,207.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 128.31 %	0.00 %	0.00 %	108.43 %
Ppto. Codificado 998	1,965,667.72	0.00	0.00	1,965,667.72
Ppto. Devengado 998	1,965,667.72	0.00	0.00	1,965,667.72

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

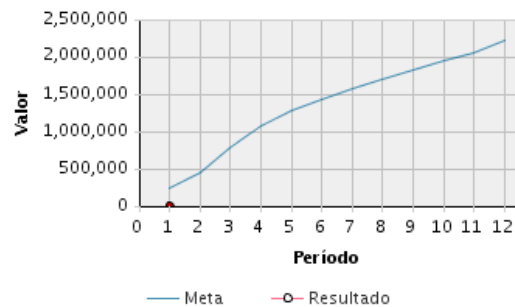

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	243,381.64	0.00	243,381.64	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	210,002.75		453,384.39				
Mar	332,918.09		786,302.48				
Abr	283,314.08		1,069,616.56				
May	210,423.67		1,280,040.23				
Jun	150,818.54		1,430,858.77				
Jul	150,901.07		1,581,759.84				
Ago	119,084.29		1,700,844.13				
Sep	113,677.84		1,814,521.97				
Oct	123,677.84		1,938,199.81				
Nov	113,677.84		2,051,877.65				
Dic	175,579.31		2,227,456.96				
Total	2,227,456.96	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		E.6_Estado_Gráfico_- _Septiembre_2014.xls	06/10/2014
2	A.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2012	A.1_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
3	A.2 Informe Mensual de Conservación - Febrero 2012	A.2_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
4	A.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2012	A.3_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
5	A.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2012	A.4_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
6	A.5 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2012	A.5_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
7	A.6 Trabajos de Conservacion Vial	A.6_Fotos_09mayo2012.pdf	18/03/2014
8	A.7 Informe Mensual de Conservación - Junio 2012	A.7_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
9	A.8 Informe Mensual de Conservación - Julio 2012	A.8_Inf._Mensual.xls	18/03/2014
10	A.9 Trabajos de Conservacion Vial	A.9_Fotos_11jul2012.pdf	18/03/2014
11	AA.4. Informe_de_Conservación_ABRIL_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_ABRIL_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
12	AA.5. Informe_de_Conservación_MAYO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_MAYO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
13	AA.6 Informe_de_Conservación_JUNIO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_JUNIO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
14	AA.7. Informe_de_Conservación_JULIO_2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_JULIO_2016_DIEGO_AREVALO.06/09/2016	06/09/2016
15	AA7. Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016 DIEGO AREVALO	AA7._Informe_de_Conservación_AGOSTO_2016_DIEGO_AREVALO.05/10/2016	05/10/2016
16	AA8. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2016	AA8._INFORME_MENSUAL_SEPTIEMBRE_2016.pdf	05/10/2016
17	AA8. Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016 DIEGO AREVALO	AA8._Informe_de_Conservación_SEPTIEMBRE_2016_DIEGO_AREVALO.05/10/2016	05/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	AA9. Informe de Conservación_OCTUBRE_2016 DIEGO AREVALO	AA9_ Informe de Conservación_OCTUBRE_2016_DIEGO AREVALO.xlsx	18/03/2014
19	B.1 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2012	B.1_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
20	B.2 Ficha Informativa de Proyecto 2012	B.2_Reporte_GPR.pdf	18/03/2014
21	B.3 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2012	B.3_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
22	B.4 Aclaratoria a observaciones del Sr. Gobernador	B.4_Oficio_Nro._MTO-PDPZCH-12-329-OF_08oct2012.pdf	18/03/2014
23	B.5 Informe Mensual de Conservación - Octubre 2012	B.5_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
24	B.6 Informe Mensual Conservación - Noviembre 2012	B.6_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
25	B.7 Informe Mensual Conservación Diciembre 2012	B.7_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
26	B.8 Informe Mensual Conservación Enero 2013	B.8_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
27	B.9 Informe Mensual Conservación - Febrero 2013	B.9_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
28	C.1 Informe Mensual de Conservación - Abril 2013	C.1_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
29	C.2 Informe Mensual de Conservación - Mayo 2013	C.2_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
30	C.3 Informe Mensual de Conservación - Junio 2013	C.3_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
31	C.4 Informe Mensual Conservación - Julio 2013	C.4_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
32	C.5 Informe Mensual de Conservación -Agosto 2013	C.5_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
33	C.6 Informe Mensual Conservación - Septiembre 2013	C.6_informe_Mensual.xls	24/03/2014
34	C.7 Informe Mensual Conservación - Octubre 2013	C.7_Informe_mensual.xls	24/03/2014
35	C.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2013	C.8_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
36	C.9 Informe Mensual Conservación - Diciembre 2013	C.9_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
37	D.1 Informe Mensual de Conservación - Enero 2014	D.1_Inf_ Mensual.xls	18/03/2014
38	D.2 Informe Mensual Conservación - Febrero 2014	D.2__Informe_Mensual.xls	25/03/2014
39	D.3 Informe Mensual de Conservación - Marzo 2014	D.3_Informe_Mensual.xls	04/04/2014
40	D.4 Informe Mensual de Conservación - Abril 2014	D.4_Informe_Mensual.xls	08/05/2014
41	D.5 Estado Gráfico de Equipo - Abril 2014	D.5_Estado_Grafico_de_Equipos.xls	08/05/2014
42	D.6 Informe Mensual Conservación - Mayo 2014	D.6_Informe_Mensual.xls	04/06/2014
43	D.7 Estado Gráfico de Equipo - Mayo 2014	D.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Mayo_2014.xls	04/06/2014
44	D.8 Informe Mensual de Conservación - Junio 2014	D.8__Informe_Mensual.xls	02/07/2014
45	D.9 Estado Gráfico Equipo - Junio 2014	D.9_Estado_gráfico.xls	02/07/2014
46	E. 3 Informe Mensual de Conservación - Agosto 2014	E.3_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2014.xls	08/09/2014
47	E.1 Informe Mensual de Conservación - Julio 2014	E.1_Informe_Mensual_Julio_2014.xls	05/08/2014
48	E.2 Estado gráfico Equipo - Julio 2014	E.2_Estado_Gráfico_Equipo_-_julio_2014.xls	05/08/2014
49	E.4 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2014	E.4_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2014.xls	08/09/2014
50	E.5 Informe Mensual de Conservación - Septiembre 2014	E.5_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Septiembre_2014.xls	06/10/2014
51	E.6 Informe Mensual Conservación - Octubre 2014	E.6_Informe_Mensual_Conservación_-_Octubre_2014.xls	07/11/2014
52	E.7 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2014	E.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Octubre_2014.xls	07/11/2014
53	E.7.1 Verificable. Riesgo 2_Acción 2.	MTO-PDPZCH-12-329-OF_08oct2012.pdf	05/12/2018
54	E.8 Informe Mensual de Conservación - Noviembre 2014	E.8_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Noviembre_2014.xls	02/12/2014
55	E.9 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2014	E.9_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2014.xls	02/12/2014
56	F.1 Informe Mensual de Conservación - Diciembre 2014	F.1_Informe_Mensual_de_Conservación_-_Diciembre_2014.xls	31/12/2014
57	F.2 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2014	F.2_Estado_Grafico_Equipo_-_Diciembre_2014.xls	31/12/2014
58	F.3 Informe Mensual de Conservación - Enero 2015	F.3_Informe_Mensual_Conservación_-_Enero_2015.xls	05/02/2015
59	F.4 Estado Gráfico - Enero 2015	F.4_Estado_Gráfico_Enero_2015.xls	05/02/2015
60	F.5 Informe Mensual Conservación - Febrero 2015	F.5_Informe_Mensual_Conservación_-_Febrero_2015.xls	06/03/2015
61	F.6 Estado Gráfico de Equipo - Febrero 2015	F.6_Estado_Gráfico_de_Equipo_-_Febrero_2015.xls	06/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	F.7 Informe de Conservación - Marzo 2015	F.7_Informe_de_Conservación-__Marzo_2015.xls	05/04/2015
63	F.8 Estado Gráfico Equipo - Marzo 2015	F.8_Estado_Grafico_Equipo_-_Marzo_2015.xls	05/04/2015
64	F.9 Informe de Conservación - Abril 2015	F.9_Informe_de_Conservación_-_Abril_2015.xls	06/05/2015
65	G.1 Estado Gráfico Equipo - Abril 2015	G.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Abril_2015.xls	06/05/2015
66	G.2 Solicitud para contratar operador de motoniveladora	G.2_Solicitud_para_contratar_operador_de_motoniveladora.pdf	04/06/2015
67	G.3 Informe de Conservación - Mayo 2015	G.3_Informe_de_Conservación_-_Mayo_2015.xls	04/06/2015
68	G.4 Estado Gráfico Equipo - Mayo 2015	G.4_Estado_Gráfico_-_Equipo_-_Mayo_2015.xls	04/06/2015
69	G.5 Informe de Conservación - Junio 2015	G.5_Informe_de_Conservación_-_Junio_2015.xls	07/07/2015
70	G.6 Estado Gráfico - Junio 2015	G.6_Estado_Gráfico_-_Junio_2015.xls	07/07/2015
71	G.7 Informe de Conservación - Julio 2015	G.7_Informe_de_Conservación_-_Julio_2015.xls	04/08/2015
72	G.8 Estado Gráfico Equipo Julio 2015	G.8_Estado_Gráfico__Equipo_-_Julio_2015.xls	04/08/2015
73	G.9 Informe de Conservación - Agosto 2015	G.9_Informe_de_Conservación_-_Agosto_2015.xls	02/09/2015
74	H.1 Estado Gráfico Equipo - Agosto 2015	H.1_Estado_Gráfico_Equipo_-_Agosto_2015.xls	02/09/2015
75	H.2 Informe de Conservación - Septiembre 2015	H.2_Informe_de_Conservación_-_Septiembre_2015.xls	05/10/2015
76	H.3 Estado Gráfico Equipo - Septiembre 2015	H.3_Estado_Gráfico__Equipo_-_Septiembre_2015_2015.xls	05/10/2015
77	H.4 Informe de Conservación - Octubre 2015	H.4_Informe_de_Conservación_-_Octubre_2015.xls	04/11/2015
78	H.5 Estado Gráfico Equipo - Octubre 2015	ESTADO_GRAFICO_OCTUBRE_2015.xls	04/11/2015
79	H.6 Informe de Conservación - Noviembre 2015	H.6_Informe_de_Conservación_-_Noviembre_2015..xls	07/12/2015
80	H.7 Estado Gráfico Equipo - Noviembre 2015	H.7_Estado_Gráfico_Equipo_-_Noviembre_2015..xls	07/12/2015
81	H.8 Informe de Conservación - Diciembre 2015	H.8_Informe_de_Conservación_Diciembre_2015..xls	11/01/2016
82	H.9 Estado Gráfico Equipo - Diciembre 2015	H.9_Estado_Gráfico_Equipo_Diciembre_2015.xls	11/01/2016
83	I. 5 informe mensual de trabajos octubre del 2016	informe_mensual_de_trabajos_octubre_del_2016.pdf	08/11/2016
84	I.1 Estado Gráfico Equipo - Enero 2016	I.1_ESTADO_GRAFICO_ENERO_2016.xls	05/02/2016
85	I.2 Estado Gráfico Equipo Febrero 2016	I.2_ESTADO_GRAFICO_FEBRERO.2016.xls	18/03/2016
86	I.3 Informe de Conservación Febrero 2016	I.3_Informe_de_Conservación_Febrero_2016.xls	18/03/2016
87	I.4 Informe de Conservación MARZO 2016 DIEGO AREVALO	Informe_de_Conservación_MARZO_2016_DIEGO_AREVALO.pdf	03/05/2016
88	I.5 Informe de Conservación Noviembre 2016	Inf_mensual_conservacion_nov2016.pdf	03/02/2017
89	I.6 Informe de Conservación Diciembre 2016	Inf_mensual_Dic2016.pdf	03/02/2017
90	I.7 Plan anual de conservación 2017	Doc_Inf.anual_de_conservacion_2017.pdf	03/02/2017
91	I.8 Requerimiento de contratación de personal	MTOP-CON_ZAM-2017-127-ME.pdf	03/02/2017
92	I.9 Informe de Conservación Enero 2017	Inf_mensual_Enero2017.pdf	03/03/2017
93	J.1 Informe de Inversión Enero 2017	Inf_inversiones_ene2017.pdf	03/03/2017
94	J.2 Informe de Conservación Febrero 2017	Inf_mensual_Febrero2017.pdf	04/04/2017
95	J.3 Memorando solicitando personal	MTOP-DDZCH-2017-759-ME.pdf	03/05/2017
96	J.4 Informe inversión Mayo 2017	inf.inversión.mayo.pdf	04/07/2017
97	J.5 Informe Conservación Mayo 2017	inf_conservacion_ultimo_mayo2017.xls	04/07/2017
98	J.6 Solicitando asignación presupuestaria para contratación de personal	MTOP-DDZCH-2017-931-ME.pdf	03/10/2017
99	J.7 Informe Conservación Junio 2017	inf.conservacion_junio2017.pdf	03/10/2017
100	J.8 Informe inversión Junio 2017	inf.conservacion_junio2017b.pdf	03/10/2017
101	J.9 Informe Conservación Julio 2017	inf.conservacion_julio2017.pdf	03/10/2017
102	K.1 Informe Conservación Agosto 2017	inf.conservacion_agosto2017.xls	03/10/2017
103	K.2 Informe trabajos rve E682 septiembre 2017	inf_trabajos_septiembre2017_RVE682.pdf	03/10/2017
104	K.3 Informe Conservación Septiembre 2017	inf.conservacion_septiembre2017.pdf	01/11/2017
105	K.4 Informe trabajos rve E682 octubre 2017	inf_trabajos_octubre2017_RVE682.pdf	01/11/2017
106	K.5 Informe Conservación Octubre 2017	Informe_conservacion_octubre2017.xls	05/12/2017
107	K.6 Informe trabajos rve E682 noviembre 2017	inf_trabajos_noviembre2017_RVE682.pdf	05/12/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
108	K.8 Informe_trabajos rve E682_diciembre2017	inf_trabajos_diciembre2017_RVE682.pdf	04/01/2018
109	K.9 Informe_Conservación_Diciembre2017	inf.conservacion_diciembre2017.pdf	04/01/2018
110	L.1 Verificable. Hito. 71	inf_trabajos_RVE682_ene2018.pdf	05/02/2018
111	L.1.1 Verificable. Problema 1_ Acción 1.	MTOP-CON_ZAM-2018-28-ME__MTOP-CON_ZAM-2018-102-ME.pdf	05/12/2018
112	L.2 Verificable. Problema 2_ Acción 1	MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf	05/03/2018
113	L.2.1 Verificable. Riesgo 2_ Acción 1.	MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf	05/12/2018
114	L.3 Verificable. Hito. 71	Informe_conserv.enero.2018.pdf	05/03/2018
115	L.4 Verificable. Hito. 71	Informe_inversión_enero_2018.pdf	05/03/2018
116	L.5 Verificable. Hito. 72	inf_trabajos_RVE682_febrero2018.pdf	05/03/2018
117	L.5.1 Verificable. Problema 1_ Acción 2.	MTOP-ADMIN_ZAM-2018-83-ME.pdf	05/12/2018
118	L.6 Verificable. Hito. 73	inf_trabajos_RVE682_marzo2018.pdf	03/04/2018
119	L.7 Verificable. Hito. 74	inf_trabajos_RVE682_abr2018.pdf	05/06/2018
120	L.8 Verificable. Hito. 75	inf_trabajos_RVE682_may2018.pdf	05/06/2018
121	L.9 Verificable. Hito. 76	inf_trabajos_RVE682_jun2018.pdf	03/07/2018
122	L2.1 Verificable. Problema 4_ Acción 1.	MTOP-SUBZ7-2018-0227-ME.pdf	05/12/2018
123	M.1 Verificable. Hito. 76	inf_trabajos_RVE45_jun2018.pdf	03/07/2018
124	M.2 Verificable. Hito. 76	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_junio2018.pdf	03/07/2018
125	M.3 Verificable. Hito. 72	Informe_conservación_febrero2018.pdf	02/08/2018
126	M.4 Verificable. Hito. 73	Informe_conservación_marzo2018.pdf	02/08/2018
127	M.5 Verificable. Hito. 74	Informe_conservación_abril2018.pdf	02/08/2018
128	M.6 Verificable. Hito. 75	Informe_conservación_mayo2018.pdf	02/08/2018
129	M.6 Verificable. Hito. 76	Informe_conservación_junio2018.pdf	02/08/2018
130	M.7 Verificable. Hito. 77	inf_trabajos_RVE45_jul2018.pdf	02/08/2018
131	M.8 Verificable. Hito. 77	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_julio2018.pdf	02/08/2018
132	M.9 Verificable. Hito. 77	inf_trabajos_RVE682_jul2018.pdf	02/08/2018
133	N.1 Verificable. Hito. 77	Informe_conservación_julio2018.pdf	03/09/2018
134	N.2 Verificable. Hito. 78	TRABAJOS_EJECUTADOS_E50_agosto2018.pdf	03/09/2018
135	N.3 Verificable. Hito. 78	inf_trabajos_RVE45_ago2018.pdf	03/09/2018
136	N.4 Verificable. Hito. 78	inf_trabajos_RVE682_ago2018.pdf	03/09/2018
137	N.5 Verificable. Hito. 78	Informe_conservación_agosto2018.pdf	01/10/2018
138	N.6 Verificable. Hito. 79	inf_trabajos_RVE45_sep2018.pdf	01/10/2018
139	N.7 Verificable. Problema 5_ Acción 2.	MTOP-CON_ZAM-2018-897-ME.pdf	01/10/2018
140	N.8 Verificable. Problema 5_ Acción 2.	MTOP-CON_ZAM-2018-903-ME.pdf	01/10/2018
141	N.9 Verificable. Problema 5_ Acción 2.	MTOP-CON_ZAM-2018-908-ME.pdf	01/10/2018
142	O.1 Verificable. Problema 5_ Acción 2.	MTOP-CON_ZAM-2018-941-ME.pdf	01/10/2018
143	O.2 Verificable. Hito. 79	Informe_conservación_septiembre2018.pdf	31/10/2018
144	O.3 Verificable. Hito. 80	inf_trabajos_RVE45_oct2018.pdf	31/10/2018
145	O.4 Verificable. Hito. 80	inf_trabajos_RVE50_oct2018.pdf	31/10/2018
146	O.5 Verificable. Hito. 80	inf_trabajos_RVE682_oct2018.pdf	31/10/2018
147	O.6 Verificable. Hito. 81	inf_trabajos_E682_noviembre_2018.pdf	03/12/2018
148	O.7 Verificable. Hito. 81	TRABAJOS_EJECUTADOS_noviembreE50.pdf	03/12/2018
149	O.8 Verificable. Riesgo 2_ Acción 2.	MTOP-CON_ZAM-2018-1253-ME.pdf	05/12/2018
150	O.9 Verificable. Hito. 83	inf_trabajos_RVE_dic2018.pdf	02/01/2019
151	P.1 Verificable. Hito. 82	reporte_final_de_inversion_mtto._dic2018.pdf	18/01/2019
152	P.2 Verificable. Hito. 84	PAI_2019_PROYECTOS_INVERSIÓN_CONSOLIDADO_ZCH2019	29/01/2019
153	P.3 Verificable. Hito. 85	GestionReporteFN_ID22518.pdf	01/03/2019
154	P.4 Verificable. Hito. 86	inf_trabajos_RVE682_ene2019.pdf	05/02/2019
155	P.5 Verificable. Problema 4	MTOP-CONS_ZAM-2019-139-ME.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
156	P.6 Verificable. Problema 3	MTOP-DDZCH-2019-392-ME.pdf	25/03/2019
157	P.7 Verificable. HITO 88, 95 Ampliación de plazo del contrato Construcción de la Cubierta para resguardo del equipo caminero, colocación de pavimento rígido y semirígido en la Dirección Distrital del MTOP Zamora Chinchipe	MTOP-CONS_ZAM-19-06-OF.pdf	03/04/2019
158	P.8 Verificable. Hito. 89, 90 Solicitando componente ambiental	MTOP-DDZCH-2019-394-ME.pdf	03/04/2019
159	P.9 Verificable. Hito. 99	inf.trabajos_RVE_marzo2019.pdf	03/04/2019

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)

1	SITOP
	http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Subsecretario Zonal 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	Director Distrital, Encargado del MTOP Zamora Chinchipe	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Zamora Chinchipe	jluzuriaga@mtop.gob.ec	0985642004
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Observadora GPR, Subsecretaría Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	Supervisora de Obra, Líder del proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 2	xtoledo@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
43169_1.jpg	01/03/2019
