

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Subsecretaría Zona 7

Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K038 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio (jbarriga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.78
CUP:	175200000.506.3851	TIR:	37.96 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	30,360,188.74
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,350,355.41
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	04/09/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, es el ente rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento vial de la red estatal. El Mantenimiento Rutinario, Periodico y de Emergencia de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro, comprende trabajos por Administración Directa, y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas): Bacheo asfáltico común, limpieza de cunetas a mano y a máquina, limpieza de alcantarillas, encausamientos, limpieza de derrumbes, sellos asfálticos, reconformación de rasantes, rellenos, mantenimiento de señalización vertical y horizontal. Se incluye obras de mantenimiento a contratar, señalización, mantenimiento de puentes, obras de emergencia.

Línea Base: La Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro cuenta con 400,94 Km de los cuales 209,44 Km se encuentran actualmente en mantenimiento por Administración Directa, conformada por calzada de pavimento flexible y pavimento rígido en buen estado.

Producto:

- . Porcentaje de mantenimiento de la red Vial Estatal 98%
- . Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados 95%
- . Porcentaje de Kilómetros señalizados de la Red Vial Estatal Nacional 100%
- . Porcentaje de maquinaria operativa 95%

Objetivo General:

- Ejecutar el mantenimiento de 400,94 km de la Infraestructura Vial por administración directa, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio a la transportación y así contribuir con el desarrollo social, cultural, comercial, agrícola y ganadero.

Objetivos Específicos:

- . Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- . Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- . Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- . Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional y en concordancia con la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.

Beneficios:

- Mejorar en el tiempo de viaje
- Bajar costos de transportación

Beneficios Cualitativos

- Mejorar la calidad de vida de la población
- Mejorar la circulación vehicular

Tipo de Beneficiario

La población del área de intervención directa del proyecto que se beneficiará con el Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la provincia de El Oro, se caracteriza por desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, mineras, pesqueras, acuícolas, turísticas y económicas.

El desarrollo de este proyecto contribuirá a fortalecer el Sistema Vial de la Provincia de El Oro, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del área de influencia del proyecto, garantizando una red de transporte seguro y condiciones aceptables de servicio.

Area de influencia: Provincia de El Oro, Cantones:

CANTÓN	POBLACION
ARENILLAS	26.844
ATAHUALPA	5.833
BALSAS	6.861
CHILLA	2.484
EL GUABO	50.009
HUAQUILLAS	48.285
LAS LAJAS	4.794
MACHALA	245.972
MARCABELI	5.450
PASAJE	72.806
PIÑAS	25.988
PORTOVELO	12.200
SANTA ROSA	69.036
ZARUMA	24.097
TOTAL	600.659

Restricciones

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración de 4 años (2018-2021)

Restricción de Costo: \$ 38.726.082,74 (Marco Lógico)

Restricción de Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de trabajos de mantenimiento

Restricción de Recursos: Disponibilidad de maquinaria y operadores, abastecimiento de mezcla asfáltica

Restricción Riesgos: Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de trabajos de mantenimiento vial

Restricción Alcance: Realizar actividades de Mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de los 400,94 km de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro para obtener niveles óptimos de servicio de acuerdo a las NORMAS DE EJECUCIÓN DEL MTOP y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES MTOP-001-F-2002.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación


Ejecución

Cierre

Completado

Congelado


Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO


Transcurrido: 66.87 %

Fecha de Inicio: 01/01/2018

Fecha de Fin: 31/12/2021

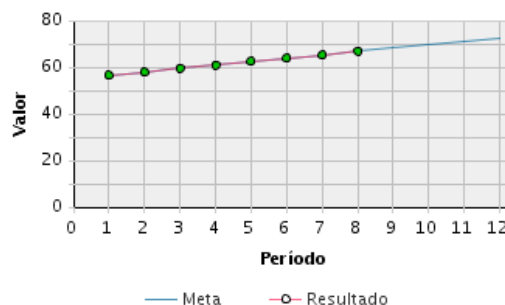AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL


Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	56 %	58 %	59 %	61 %	62 %	64 %	65 %	67 %	68 %	70 %	71 %	73 %
	Avance real acumulado											
	56 %	58 %	59 %	61 %	62 %	64 %	65 %	67 %				
Estado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales). 2.- Limpieza de derrumbes y estabilización de talud en la carretera Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma km 18+000. Hitos Cumplidos en el mes: HITO 34.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado Para el mes de AGOSTO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/09/2020 - 08:16 AM
JULIO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales). 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma. Hitos Cumplidos en el mes: HITO 33.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado Para el mes de JULIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/08/2020 - 10:08 AM
JUNIO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Piñas-Portovelo-Zaruma Hitos Cumplidos en el mes: HITO 32.- Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado Para el mes de JUNIO de 2020 se ejecuta los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/07/2020 - 11:13 AM
MAYO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias viales) (Hito cumplido 31) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Saracay-Balsas-Río Pindo (Hito cumplido 31) Para el mes de MAYO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2020 - 11:48 AM
ABRIL 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (atención de emergencias) (Hito cumplido 30) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopango; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 30) Para el mes de ABRIL de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario y de Emergencia de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/05/2020 - 10:45 PM
MARZO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 29)	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/04/2020 - 02:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma, Pasaje-Quera-Puente Mollopongo (Hito cumplido 29) 3.- Reconstrucción de talud inferior km 22+550 del tramo Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 29) Para el mes de MARZO de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento Rutinario, Periódico y de Emergencia de acuerdo a lo programado.		
FEBRERO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 28) 2.- Limpieza de derrumbes menores en los tramos: Saracay-Piñas, Saracay-Balsas-Río Pindo, Portovelo-Salati-Ambocas, Buenavista-Vega Rivera-Paccha-Zaruma (Hito cumplido 28) Para el mes de Febrero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/03/2020 - 10:16 AM
ENERO 2020 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE por Administración Directa (Hito cumplido 27) 2.- Bacheo Asfáltico en las carreteras Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27) 3.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 27) Para el mes de Enero de 2020 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/02/2020 - 02:06 PM
DICIEMBRE 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 26) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 39+500 (Hito cumplido 26) 3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 26) 4.- Bacheo Asfáltico en las carreteras: Paso Lateral Pasaje y Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 26) 5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 26) Para el mes de Diciembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2020 - 12:28 PM
NOVIEMBRE 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 25) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500, 16+100 y 39+500 (Hito cumplido 25) 3.- Limpieza de derrumbes menores y alcantarillas en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 25) 4.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25) 5.- Limpieza de espaldones y cunetas en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 25) Para el mes de Noviembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2019 - 07:04 AM
OCTUBRE 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 24) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Saracay-Balsas-Puente Río Pindo km 8+500 y 16+100 (Hito cumplido 24) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 24) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 24) 5.- Bacheo Asfáltico en la carretera Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 24) Para el mes de Octubre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2019 - 11:08 AM
SEPTIEMBRE 2019	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/10/2019 - 11:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 23) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 45+500 (Hito cumplido 23) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 23) 4.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 23) 5.- Reposición de señalización vertical (chevrones) en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 23) Para el mes de Septiembre de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.		
AGOSTO 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 22) 2.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 22) 3.- Limpieza de derrumbes menores en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas (Hito cumplido 22) 4.- Bacheo Asfáltico Común en el Paso Lateral Pasaje (Hito cumplido 22) 5.- Estabilización de talud, de reposición de material de mejoramiento, sub base y base en la carretera Piñas-Saracay sector las Bateas (Hito cumplido 22) Para el mes de Agosto de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2019 - 02:19 PM
JULIO 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 21) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: La Avanzada-Saracay; Saracay-Piñas (Hito cumplido 21) 3.- Reconstrucción de talud inferior en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango km 20+400 (Hito cumplido 21) 4.- Reconfiguración de rasante en la carretera Saracay-Piñas sector Monos (Hito cumplido 21) 5.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Piñas-Portovelo-Zaruma y Yee del Cambio-Yee de Tillales (Hito cumplido 21) Para el mes de Julio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/08/2019 - 03:50 PM
JUNIO 2019 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 20) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo y Arenillas-La victoria-Pte. Puyango (Hito cumplido 20) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 20) 4.- Mantenimiento de Señalización Horizontal en reductores de velocidad en la carretera La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 20) 5.- Bacheo Asfáltico Común en la carretera Piñas Portovelo-Zaruma (Hito cumplido 20) Para el mes de Junio de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	03/07/2019 - 02:33 PM
MAYO 2019: 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 19) 2.- Limpieza de derrumbes menores en las carreteras: Portovelo- Salati-Ambocas y Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19) 3.- Estabilización de talud en la carretera Saracay-Piñas sector Las Bateas (Hito cumplido 19) 4.- Mantenimiento de Señalización Vertical en la carretera Saracay-Balsas-Pte. Río Pindo (Hito cumplido 19) Para el mes de Mayo de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2019 - 12:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2019: 1.- Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas (Hito cumplido 18) 2.- Limpieza de derrumbes en las carreteras: Portovelo-Salati-Ambocas; Saracay-Piñas; Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango y Saracay-Balsas-Pte. Rio Pindo (Hito cumplido 18) 3.- Bacheo Asfáltico Común en las carreteras: Saracay-Piñas; Saracay-Balsas y La Avanzada-Saracay (Hito cumplido 18) Para el mes de Abril de 2019 se ejecutan los trabajos de mantenimiento vial de acuerdo a lo programado.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/05/2019 - 11:24 AM
Marzo 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Limpieza de alcantarillas en la carretera Saracay-Piñas sector Las bateas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2019 - 10:39 AM
Febrero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	01/03/2019 - 11:04 AM
Enero 2019: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reposición de rellenos, limpieza de alcantarillas, construcción de bordillos y bacheo asfáltico en la carretera Saracay-Balsas-Rio Pindo; Limpieza de alcantarillas en la carretera la Avanzada-Saracay; Reposición de delineadores retroreflectivos en el Paso Lateral Pasaje; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo-Salati-Ambocas; Bacheo asfáltico y limpieza de derrumbes en la carretera Saracay-Piñas; Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/02/2019 - 08:24 AM
Diciembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas y Piñas - Portovelo, Limpieza de derrumbes en la carretera Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/01/2019 - 04:05 PM
Noviembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores y cunetas en la carretera Saracay - Piñas, Desmontaje y traslado de puente Bailey desde la carretera Buenavista - Paccha hasta el Campamento Piñas, Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/12/2018 - 12:08 PM
Octubre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 38+300 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/11/2018 - 03:01 PM
Septiembre 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario y Periódico en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Reconstrucción de talud inferior en los km 15+500 y 25+750 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo, Mantenimiento Rutinario de la RVE que son atendidas por Administración Directa a través de Microempresas.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/10/2018 - 10:24 AM
Agosto 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de alcantarillas y derrumbes menores a máquina en las carreteras La Avanzada - Saracay; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma; Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/09/2018 - 11:21 AM
Julio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/08/2018 - 08:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
señalización vertical en las carretera La Avanzada - Saracay, Reconstrucción de talud inferior en el km 15+500 de la Carretera Saracay - Balsas - Rio Pindo.		
Junio 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma; Reposición de señalización vertical en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Piñas - Zaruma, Arenillas - La Victoria.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/07/2018 - 08:50 AM
Mayo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carretera Saracay - Piñas; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carretera Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/06/2018 - 11:19 AM
Abril 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: La Avanzada - Saracay, Saracay - Piñas, Piñas - Portovelo - Zaruma.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	04/05/2018 - 01:24 PM
Marzo 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo; Limpieza de derrumbes en la carretera Portovelo - Salati - Ambocas; Bacheo asfáltico en las carreteras: Corralitos - Pasaje, Yee del Enano - Buenavista - Pasaje.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	05/04/2018 - 09:58 AM
Febrero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Limpieza de derrumbes menores a máquina en las carreteras: Saracay - Piñas, Saracay - Balsas - Rio Pindo, Arenillas - La Victoria - Pte. Puyango.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	02/03/2018 - 03:48 PM
Enero 2018: Se ejecutan trabajos de Mantenimiento Rutinario en la Red Vial Estatal por Administración Directa en las siguientes actividades: Reconfiguración de rasante con material de mejoramiento en el km 33+500 de la carretera Arenillas-La Victoria-Pte. Puyango, Limpieza de espaldones, Bacheo asfáltico común, Limpieza de derrumbes a máquina.	Barriga Loaiza, Jorge Antonio	19/02/2018 - 04:37 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la Aprobación de Aavales para la contratación de servicios de Mantenimiento y adquisición de Repuestos para la Maquinaria	04/09/2020	Jorge Antonio Barriga Loaiza	30	30	9	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Presencia del Fenómeno del niño CAUSARÍA retraso en la ejecución de obra	04/09/2020	Jorge Antonio Barriga Loaiza	40 %	40	16	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
2	PLANEACION: Justificativos-técnicos-económicos elaborados y aprobados	1-Solicitud de Información	01/01/2018		01/01/2018		Sí	10.0
3	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.46
4	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.46
5	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.46
6	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.46
7	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.46
8	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.46
9	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.46
10	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.46
11	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.46
12	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.46
13	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.46
14	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2018) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.46
15	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.46
16	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	1.46
18	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.46
19	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.46
20	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.46
21	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.46
22	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.46
23	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.46
24	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.46
25	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.46
26	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2019) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.46
27	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (enero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	1.46
28	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Febrero 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	29/02/2020		29/02/2020		Sí	1.46
29	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Marzo 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	1.46
30	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Abril 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	1.46
31	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Mayo 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Junio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.46
33	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Julio 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	1.46
34	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Agosto 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.46
35	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Septiembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	1.46
36	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Octubre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	1.46
37	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Noviembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.46
38	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro (Diciembre 2020) realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.46
39	CIERRE: Acta de terminación de trabajos	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
40	EJECUCION: Mantenimiento de la Red Vial Estatal de la Provincia de El Oro Año 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	17.44

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de kilómetros mantenidos		92.68 %	212.61	197.04	01/01/2018	Agosto


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,350,355.41 **
Costo Total:	4,564,536.38
Total Devengado:	7,142,733.08
% Costo Total Devengado:	156.48 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 156.48 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,314,429.38	9,170,836.63	0.00	17,485,266.01
Ppto. Externo Planeado	2,715,700.52	0.00	0.00	2,715,700.52
Ppto. Aprobado Inicial	7,717,368.84	1,999,652.03	0.00	9,717,020.87
Ppto. Codificado	9,903,447.30	1,999,652.03	0.00	11,903,099.33
Ppto. Comprometido	4,071,694.62	894,434.51	0.00	4,966,129.13
Planeado - Codificado (2020)		7,171,184.60		
Programado a Devengar	9,903,447.30	1,499,652.03	0.00	11,403,099.33
Ppto. Devengado	6,850,703.38	292,029.70	0.00	7,142,733.08
Pagado Real	3,135,506.44	0.00	0.00	3,135,506.44
Estimado a fin de año	* 6,850,703.38	2,000,000.00	0.00	8,850,703.38
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,052,743.92	-500,347.97	0.00	2,552,395.95
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.17 %	19.47 %	0.00 %	62.64 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

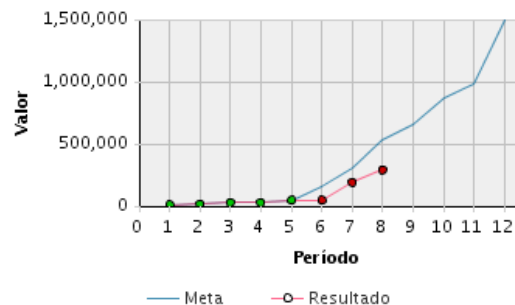

Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	8,034.08	8,034.08	8,034.08	8,034.08	100.00 %		0.54 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	8,644.42	8,644.42	16,678.50	16,678.50	100.00 %		1.11 %
Mar	11,444.42	11,444.42	28,122.92	28,122.92	100.00 %		1.88 %
Abr	610.34	610.34	28,733.26	28,733.26	100.00 %		1.92 %
May	20,678.50	16,678.50	49,411.76	45,411.76	91.90 %		3.03 %
Jun	111,634.64	610.34	161,046.40	46,022.10	28.58 %		3.07 %
Jul	139,404.61	146,040.15	300,451.01	192,062.25	63.92 %		12.81 %
Ago	226,995.45	99,967.45	527,446.46	292,029.70	55.37 %		19.47 %
Sep	131,419.83		658,866.29				
Oct	212,420.82		871,287.11				
Nov	114,086.82		985,373.93				
Dic	514,278.10		1,499,652.03				
Total	1,499,652.03	292,029.70					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Enero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
2	A.2 Febrero 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_FEBRERO_2018.pdf	05/04/2018
3	A.3 Marzo 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial.pdf	05/04/2018
4	A.4 Marzo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MARZO_2018.pdf	04/05/2018
5	A.5 Abril 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	A_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial.pdf	04/05/2018
6	A.6 Abril 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_ABRIL_2018.pdf	05/06/2018
7	A.7 Mayo 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2018.pdf	04/07/2018
8	A.8 Junio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2018.pdf	04/08/2018
9	A.9 Julio 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	A_9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2018.pdf	05/09/2018
10	B.1 Agosto 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_1_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGOSTO_2018.pdf	05/10/2018
11	B.2 Septiembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_Mantenimiento_Vial.pdf	05/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
12	B.3 Octubre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018	
13	B.4 Septiembre 2018 Informe Ejecutivo Conservación Vial	B_4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/11/2018	
14	B.5 Noviembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018	
15	B.6 Diciembre 2018 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_DICIEMBRE_2018.pdf	05/01/2019	
16	B.7 Enero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_ENERO_2019.pdf	05/02/2019	
17	B.8 Febrero 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_FEBRERO_2019.pdf	05/03/2019	
18	B.9 Marzo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	B_9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_MARZO_2019.pdf	05/04/2019	
19	C.1 Abril 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_ABRIL_2019.pdf	05/05/2019	
20	C.2 Mayo 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_MAYO_2019.pdf	05/06/2019	
21	C.3 Mayo 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_MAYO_2019.pdf	03/07/2019	
22	C.4 Junio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.4_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019	
23	C.5 Junio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JUNIO_2019.pdf	05/08/2019	
24	C.6 Julio 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019	
25	C.7 Julio 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_JULIO_2019.pdf	05/09/2019	
26	C.8 Agosto 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	C.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_AGO_2019.pdf	05/09/2019	
27	C.9 Agosto 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	C.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_AGO_2019.pdf	04/10/2019	
28	D.1 Septiembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/10/2019	
29	D.2 Septiembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.2_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	05/11/2019	
30	D.3 Octubre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.3_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019	
31	D.4 Octubre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.4_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_OCTUBRE_2019.pdf	05/12/2019	
32	D.5 Noviembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019	
33	D.6 Diciembre 2019 Respaldo Aprobacion Avals Mantenimiento Maquinaria	D.6_AVALES_APROBADOS_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA	04/01/2020	
34	D.7 Diciembre 2019 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	D.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019	
35	D.8 Noviembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_NOVIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020	
36	D.9 Diciembre 2019 Informe Ejecutivo Conservación Vial	D.9_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MTO EL_ORO_DICIEMBRE_2019.pdf	30/01/2020	
37	E.1 Enero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.1_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_ENERO_2020.pdf	05/02/2020	
38	E.2 Febrero 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.2_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020	
39	E.3 Perfil de Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.3_PERFIL_DE_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_EL_ORO_2017	03/03/2020	FORMATO_SENPLADES

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
40	E.4 Ficha Técnica Proyecto Mantenimiento Vial Formato SENPLADES 2017	E.4_FICHA_TECNICA_PROYECTO_MANTENIMIENTO_VIAL_2017.pdf	03/07/2020
41	E.5 Marzo 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020
42	E.6 ABRIL 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020
43	E.7 MAYO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020
44	E.8 JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	E.8_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020
45	E.9 JUNIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jun 2020	E.9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_JUNIO_2020.pdf	03/07/2020
46	F1. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 1	F1_CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf	03/07/2020
47	F2. CONTRATO MICROEMPRESAS 2020 - ORDENES DE COMPRA PARTE 2	F2_CONTRATO_MICROEMPRESA_2020.pdf	03/07/2020
48	F3. ACCION 1. PROBLEMA 1. SOLICITUD AVAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA	F3_SOLICITUD_AVAL_MANTENIMIENTO_MAQUINARIA.pdf	03/07/2020
49	F4. ACCION 1. RIESGO 1. REPORTE ATENCION DE EMERGENCIAS RVE EL ORO	F4_INFORME_ATENCION_EMERGENCIAS_RVE_EL_ORO.pdf	03/07/2020
50	F5. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	F5_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020
51	F6. JULIO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial Acumulado Ene-Jul 2020	F6_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_JULIO_2020.pdf	03/07/2020
52	F7. AGOSTO 2020 Ejecución Presupuestaria Gastos Operativos Mantenimiento Vial	F7_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_GASTOS_OPERATIVOS_MANTENIMIENTO_VIAL_2020.pdf	03/07/2020

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	SUBSECRETARIO REGION 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Barriga Loaiza, Jorge Antonio	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura Provincial	jbarriga@mtop.gob.ec	023974600
Bazurto Orellana, Pedro	DIRECTOR DISTRITAL	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
González Villavicencio, Volter Hernel	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
125216_1.jpg	02/03/2018
