MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Esmeraldas

PROYECTO: K033 MTOP- Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 - Esmeraldas

Líder del Proyecto:	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito (cvivero@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cruz Chicaiza, Carlos René Alejandro	Programas Relacionados:	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL TERREMOTO 2016
Titular:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.381287	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,999,301.43
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/04/2016 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	26/08/2019	Fecha de Fin Base:	29/12/2017
Modificado por:	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2019

DATOS GENERALES

Descripción
Terremoto de abril 2016 Objetivo: Realizar las demoliciones de las edificaciones que fueron afectadas a raíz del terremoto, para que el MIDUVI u otra entidad pueda construir una nueva vivienda. Línea Base: Este proyecto inicia con la inspección por parte del MIDUVI quien son los encargados de evaluar la estructura y semaforizarla según el riesgo que está presente. Producto: Dar facilidades al propietario en cuanto a costos y evitar un colapso de la estructura. Contratista: MIKLA S.A , AGURICOCHA S.A y Ing. Ricardo Montalvo Monto: 2'000.000
Beneficios Cualitativos
Cantones de Quinindé, Muisne, Atacames y Esmeraldas
Tipo de Beneficiario
El propietario de la vivienda afectada.
Restricciones
Ubicación de la vivienda. El aun no desalojo de las pertenencias. La inestabilidad del suelo.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 90.98 %
Fecha de Inicio: 30/04/2016 **Fecha de Fin:** 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2019	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de agosto 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de agosto 2019.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	02/08/2019 - 05:10 PM
JUNIO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de julio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de julio 2019.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	04/07/2019 - 05:19 PM
MAYO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	05/06/2019 - 09:30 AM
ABRIL 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de junio 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de junio 2019.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	02/05/2019 - 10:23 AM
MARZO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	03/04/2019 - 04:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de abril 2019.		
FEBRERO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de marzo 2019.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	01/03/2019 - 05:13 PM
ENERO 2019: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 04:13 PM
ENERO 2018: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval asignado para este año, por lo que se encuentra congelado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/02/2019 - 03:07 PM
DICIEMBRE 2018: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de marzo 2019, cabe indicar que no existe aval para el pago. Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por parte del GADM. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de febrero 2019.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	04/01/2019 - 11:52 AM
NOVIEMBRE 2018: Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018, cabe indicar que no existe aval para el pago. Demoliciones: Se da por finalizadas las Demoliciones, no se han recibido más solicitudes por parte del GADM. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	03/12/2018 - 12:19 PM
OCTUBRE 2018: Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaría del MTOP. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva, prevista para fines de Diciembre 2018. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM, proyecto terminado. Puente Cupa: Se encuentra terminado con Acta Provisiona del 19 de marzo de 2018, en trámite la Acta Recepción Definitiva, prevista para fines de noviembre 2018.	Ortiz Campos, Lenin Herminio	05/11/2018 - 08:48 AM
SEPTIEMBRE 2018:	Ortiz Campos, Lenin Herminio	02/10/2018 - 02:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizó con maquinaría del MTOP. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%, se espera pronunciamiento jurídico para liquidar y realizar acta definitiva. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.		
AGOSTO 2018: Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaría del MTOP. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	04/09/2018 - 09:19 AM
JULIO 2018: Demoliciones: Pendiente recepción de Demoliciones, la última se realizara con maquinaría del MTOP. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	01/08/2018 - 11:02 AM
JUNIO 2018: Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Estupiñan Echeverria, Victor Hugo	05/07/2018 - 08:39 AM
MAYO 2018: Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/06/2018 - 02:57 PM
ABRIL 2018: Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra legalizada el Acta Recepción Definitiva y el Acta de entrega al GADM Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	04/05/2018 - 05:38 PM
MARZO 2018: Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva Puente Cupa: Se encuentra terminado y en trámite la Acta Recepción Provisional.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/04/2018 - 04:29 PM
FEBRERO 2018:	Rodas Mejía, Vicente Fernando	19/03/2018 - 09:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.		
ENERO 2018: Demoliciones: Pendiente trámites hasta completar documentación conforme protocolos establecidos en los cantones Muisne, Atacames, Quinindé y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en proceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100%. Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Definitiva Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	20/02/2018 - 04:13 PM
DICIEMBRE 2017: Demoliciones: Se culminó con las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en oproceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100% Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional. Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/01/2018 - 03:37 PM
NOVIEMBRE 2017: Demoliciones: Se se ejecutarón las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se termino en oproceso Acta Recepción Provisional, Con un avance de obra del 100% Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional. Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas pendientes de pago.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	05/12/2017 - 07:09 PM
OCTUBRE 2017: Demoliciones: Se se contrataron las demoliciones en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas. Reconstrucción Mataje: El proyecto se encuentra suspendido a partir del 7 de septiembre por motivos de lluvia. Con un avance de obra del 90% Puente Muisne: Se encuentra en legalización el Acta Recepción Provisional. Puente Cupa: Se encuentra terminado en tramite Acta Recepción Provisional y Planillas pendientes de pago.	Vivero Cedeño, Cesar Heraclito	01/11/2017 - 09:30 AM
SEPTIEMBRE 2017: Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/10/2017 - 04:43 PM
AGOSTO 2017: Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en los cantones Muisne, Atacames y Esmeraldas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	05/09/2017 - 03:31 PM
JULIO 2017: Se encuentran en trámite la contratación para iniciar el proceso de derrocamiento remoción y desalojo de escombros en el cantón Muisne, Atacames y Esmeraldas.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/08/2017 - 04:51 PM
JUNIO 2017: Se recepto información por parte de los GAD's de se ha efectuado demoliciones en Esmeraldas 3, en Atacames 3 y en Quinindé 59, se encuentran en tramite de contratación las demoliciones de Chamanga.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	04/07/2017 - 04:55 PM
MAYO 2017: Se recepto información por parte de los GAD's de se ha efectuado 95 demoliciones de las cuales 93 en el cantón de Atacames y 2 en Esmeraldas, se prevé realizar en Quinindé y Chamanga para el mes de junio 2017.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	06/06/2017 - 04:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2017: Se recepto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación de la viviendas se estan ejecutando los planes de trabajo.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/05/2017 - 07:17 PM
MARZO 2017: Se recepto información por parte de los GAD's de Atacames y Esmeraldas, se hizo la verificación de la viviendas para armar los planes de trabajo.	Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	05/04/2017 - 04:28 PM
FEBRERO 2017: Se demolio casas en Atacames y una casa en Esmeraldas, se estan tramitando los pagos correspondientes y se espera informes de GADPE para continuar los trabajos.	Rodas Mejía, Vicente Fernando	03/03/2017 - 05:00 PM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Solicitud del propietario al MIDUVI, entregada	1-Solicitud de Información	03/01/2017		03/01/2017		Sí	2.5
2	ANTEPROYECTO: Inspección por parte del MIDUVI, realizada	1-Solicitud de Información	04/01/2017		04/01/2017		Sí	2.5
3	ANTEPROYECTO: Informe de inspección por parte del MIDUVI, realizada	1-Solicitud de Información	05/01/2017		05/01/2017		Sí	2.5
4	DEFINICIÓN: Aprobación de demolición por parte del propietario, realizada	1-Solicitud de Información	06/01/2017		06/01/2017		Sí	2.5
5	PLANEACIÓN: Orden de demolición por parte del GAD cantonal, emitida	5-Entregables Intermedios	12/01/2017		12/01/2017		Sí	2.0
6	PLANEACIÓN: informe por parte del GAD cantonal de las viviendas a demoler, emitida	5-Entregables Intermedios	13/01/2017		13/01/2017		Sí	3.0
7	PLANEACIÓN: Contratación del proyecto por parte del MTOP, realizada	3-Adjudicación	20/01/2017		20/01/2017		Sí	7.0
8	EJECUCIÓN: Creación del cronograma para la demolición, remoción y desalojos de escombros por parte contratista, realizada	4-Inicio de Trabajo	29/03/2017		29/03/2017		Sí	20.0
9	EJECUCIÓN: Demolición, remoción y desalojos de escombros por parte contratista, realizada	4-Inicio de Trabajo	28/04/2017		28/04/2017		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Construcción del puente sobre el río Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	25/07/2017		15/04/2017		Sí	10.0
11	CIERRE: Liquidación económica - Muisne, pagada	5-Entregables Intermedios	04/08/2017		01/12/2017		Sí	1.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	CIERRE: Recepción Provisional - Muisne, legalizada	9-Entregables Formales	04/08/2017		12/07/2017		Sí	1.11
13	CIERRE: Informe por parte de fiscalización de las edificaciones demolidas, emitido	9-Entregables Formales	08/08/2017		16/12/2017		Sí	1.11
14	CIERRE: Liquidación económica de las demoliciones, emitido	9-Entregables Formales	09/08/2017		31/07/2018		Sí	1.11
15	EJECUCIÓN: Construcción de estructura del pavimento - Mataje, finalizada	4-Inicio de Trabajo	12/12/2017		28/11/2017		Sí	10.0
16	EJECUCIÓN: Construcción de alcantarillas - Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	19/12/2017		31/03/2017		Sí	10.0
17	EJECUCIÓN: Señalización vertical y Horizontal - Mataje, realizada	4-Inicio de Trabajo	22/12/2017		22/12/2017		Sí	8.0
18	CIERRE: Liquidación Económica - Mataje	5-Entregables Intermedios	26/12/2017	30/09/2019			No	1.11
19	CIERRE: Recepción Definitiva legalizada - Mataje	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/12/2017	28/12/2019			No	1.11
20	CIERRE: Recepción provisional legalizada - Mataje	9-Entregables Formales	26/12/2017	30/04/2019			No	1.11
21	CIERRE: Recepción Definitiva - Demoliciones, legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		15/11/2018		Sí	1.11
22	CIERRE: Recepción Definitiva - Muisne, legalizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017		26/01/2018		Sí	1.12

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Obra	—	-	-	-	01/01/2017	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,999,301.43 **
Costo Total:	31,927,094.24
Total Devengado:	14,209,226.22
% Costo Total Devengado:	44.51 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 44.51 %

Perfil Económico 2019				
	Años Previos	**Año Actual (2019)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	18,061,024.60	0.00	0.00	**18,061,024.60**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Codificado	18,061,024.60	4,004,157.72	0.00	**22,065,182.32**
Ppto. Comprometido	5,340,613.37	0.00	0.00	**5,340,613.37**
Planeado - Codificado (2019)		-4,004,157.72		
Programado a Devengar	14,090,012.74	5,909,288.69	0.00	**19,999,301.43**
Ppto. Devengado	14,090,012.74	119,213.48	0.00	**14,209,226.22**
Pagado Real	4,166,187.91	0.00	0.00	**4,166,187.91**
Estimado a fin de año	* 14,090,012.74	0.00	0.00	**14,090,012.74**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	5,909,288.69	0.00	**5,909,288.69**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	2.02 %	0.00 %	**71.05 %**
Ppto. Codificado 998	1,193,249.96	0.00	0.00	**1,193,249.96**
Ppto. Devengado 998	838,352.98	0.00	0.00	**838,352.98**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

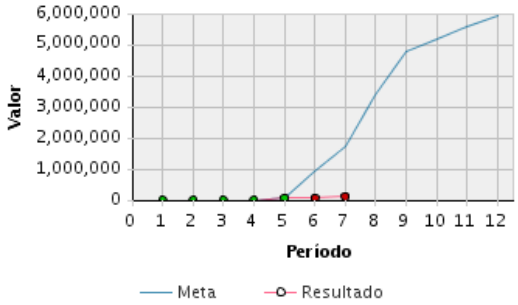

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	54,639.38	54,639.38	54,639.38	54,639.38	100.00 %		0.92 %
Jun	888,385.75	2,744.24	943,025.13	57,383.62	6.09 %		0.97 %
Jul	806,417.74	61,829.86	1,749,442.87	119,213.48	6.81 %		2.02 %
Ago	1,647,106.28		3,396,549.15				
Sep	1,388,558.43		4,785,107.58				
Oct	414,840.83		5,199,948.41				
Nov	354,670.14		5,554,618.55				
Dic	354,670.14		5,909,288.69				
Total	**5,909,288.69**	**119,213.48**					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
16	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
18	Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Listado de casas a demoler	demoliciones.xlsx	03/03/2017
2	A2. INFORME DEMOLICIONES	INFORME_DEMOLICIONES.doc	05/04/2017
3	A3. FOTOS DEMOLICIONES	ANEXO_FOTOGRAFICO.xls	05/04/2017
4	A4.MEMORAMDO MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME	A4.MEMORANDO_MTOP-CONS_ESM-2017-26-ME.pdf	05/07/2017
5	A5. 16552 -acta_definitiva_puente_muisne -2018	A5._16552_-acta_definitiva_puente_muisne_-2018.pdf	16/04/2018
6	A6. 16552-acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne- 2018	A6._16552-acta_entrega_puente_muisne_a_gad_de_muisne-_2018.pdf	16/04/2018
7	A7. 17728-ACTA RECEPCION PROVISIONAL-2018	A7._17728-ACTA_RECEPCION_PROVISIONAL-2018.PDF	07/09/2018
8	A8. ACTA DE CUMPLIMIENTO DEMOLICIONES-2018	A8._ACTA_DE_CUMPLIMIENTO_DEMOLICIONES-2018.pdf	15/11/2018
9	A9. Devengado Esigef enero 2019	A9._Devengado_Esigef_enero_2019.pdf	02/08/2019
10	B1. Devengado Esigef Febrero 2019	B1._Devengado_Esigef_febrero_2019.pdf	05/08/2019
11	B2. Devengado Esigef marzo 2019	B2._Devengado_Esigef_marzo_2019.pdf	05/08/2019
12	B3. Devengado Esigef abril 2019	B3._Devengado_Esigef_abril_2019.pdf	05/08/2019
13	B4. Devengado Esigef mayo 2019	B4._Devengado_Esigef_mayo_2019.pdf	05/08/2019
14	B5. Devengado Esigef junio 2019	B5._Devengado_Esigef_junio_2019.pdf	05/08/2019
15	B6. Devengado Esigef julio 2019	B6._Devengado_Esigef_julio_2019.pdf	05/08/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aldas Palacios, Gustavo Ernesto	Supervisor	Analista de Infraestructura Provincial 1	galdas@mtop.gob.ec	023974600 / 0958988062 / 11615
Ortiz Campos, Lenin Herminio	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas	lortiz@mtop.gob.ec	0989274846 / 11601
Rezabala Zamora, Maritza Del Carmen	Supervisora Financiera	Supervisora Financiera de Esmeraldas	mrezabala@mtop.gob.ec	0988270005 / 11606

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
119360_1.jpg	02/03/2017
