

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Cañar
PROYECTO: K023 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Dután Sanango, Italo Medardo (imdutan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CANAR, Provincia - Cañar, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3657	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,529,277.52
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2008 - 01/05/2023
Fecha de última actualización:	03/12/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Dután Sanango, Italo Medardo	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2021

DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCION:

La conservación de la red vial estatal de Cañar, durante el periodo comprendido entre el año 2008 - 2019, está supeditado por un incremento acelerado de vehículos, que consecuentemente genera un aumento en el uso y desgaste de las vías. Esta situación generó la necesidad de implementar el programa de conservación vial por Administración Directa, generando un compromiso para lograr la permanente movilidad, seguridad, economía y comodidad en la circulación vial, realizar de manera efectiva el mantenimiento de las vías, atender oportunamente las demandas prioritarias de la comunidad y hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Para el efecto, mediante el Acuerdo Ministerial 001-12-2001 en su artículo 3, establece que la Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el MTOP, como única entidad encargada del manejo y control.

El Acuerdo Ministerial No. 059 de 22 de junio de 2015, en su Capítulo 3. DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA, 3.5 PROCESOS DESCONCENTRADOS, 3.5.2 DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: el numeral 14 faculta a Supervisar y controlar la ejecución de las obras de Conservación de Infraestructura del Transporte contratados y los que se realicen por administración directa

Línea base del Proyecto.

Al tratarse de un proyecto de mantenimiento vial, la línea base del proyecto está determinado por el estado en que se encuentra el inventario vial de la provincia, el 75% de las vías estatales de la provincia están intervenidas con mantenimiento vial. Desde este punto de vista, el estado actual de la infraestructura vial que es administrada por el MTOP y forman parte del programa de mantenimiento vial de la provincia de Cañar se presenta de la siguiente manera:

RIO ANGAS LTE PROV/CAÑAR/CHIMBORAZO-ZHUD
 ZHUD-CAÑAR
 CAÑAR-BIBLIAN
 EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN
 ZHUD-DUCUR
 DUCUR-COCHANCA
 COCHANCA-LATRONCAL-MANUEL J. CALLE (EL TRIUNFO)
 LIMITE GUAYAS/CAÑAR - VENTURA LIMITE CAÑAR/CHIMBORAZO
 LA TRONCAL-PANCHO NEGRO-LTE PROV. GUAYAS/CAÑAR
 AZOGUES INTERSECCIÓN ESTADIO-CEMENTERIO- "Y" DE MATRAMA "Y" DE PAUTE
 "Y" DE MATRAMA -MAZAR (REPRESA) - CRUCE CON E40 (PAUTE/SAN PABLO/MENDEZ)

Objetivo General.-

DATOS GENERALES

Descripción

Mantener la infraestructura vial de la provincia en buenas condiciones de movilidad, con requerimientos de infraestructura vial de primer nivel, para garantizar un servicio de calidad y seguridad vial.

Objetivos específicos.

Garantizar la operatividad de la Unidad Ejecutora para intervenir con acciones de mantenimiento vial en la red estatal no concesionada.

Mantener un nivel administrativo óptimo que permita gestionar, ejecutar, supervisar y controlar el uso de los recursos del Estado en la inversión del programa de Mantenimiento vial de la provincia.

Beneficios Cualitativos

Permitir un mayor y mejor desarrollo socio económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad de la población.

Proveer de una vía de comunicación y transporte eficiente y segura para los habitantes del sector y usuarios en general.

Conservar la inversión realizada por el estado en las vías.

Reducir el tiempo de viaje, con lo que se produce un ahorro económico.

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios Directos: Para efectos del proyecto, se considera como beneficiarios directos a aquellos que están intervenidos por las vías estatales a cargo del mantenimiento vial por administración Directa; así, tenemos los Cantones Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Suscal y Troncal; estableciéndose que la población de demanda efectiva es de 219084 habitantes.

Beneficiarios Indirectos: Los beneficiarios indirectos se consideran a las personas que visitan la provincia por motivos turísticos, y/o por comercio, por lo que se considera que la población es de 16730 habitantes.

Restricciones

Tiempo: El plazo para el mantenimiento es anual, el mismo que será programado hasta el 2021, luego de lo cual se solicitará actualización de dictamen para ampliar el plazo.

Costo: El valor total para el mantenimiento es aproximadamente de USD \$500.000,00 por año,

Calidad: Las actividades de mantenimiento necesarias para la conservación de la infraestructura implementada deben cumplir con lo siguiente:

Conservar la inversión existente en la red vial estatal de la provincia.

Brindar adecuados niveles de seguridad, servicialidad y comodidad a los usuarios viales.

Contar con carreteras debidamente señalizadas y con seguridad vial

Mejorar las carreteras existentes a través de inversiones menores.

Recursos: Se considera tres grupos:

Recursos Financieros: La limitación en recursos económicos en el país podría causar que no se disponga de los insumos necesarios para poder ejecutar el mantenimiento vial correctamente.

Recursos Humanos: la falta de personal o gente especializada podría causar retrasos en el desarrollo del proyecto.

Recursos Tecnológico: Existe restricción en el suministro de materiales para la ejecución del mantenimiento, como en la compra de mezcla asfáltica, equipos, pinturas para señalización.

Riesgo: La falta de recursos causaría el retraso en el mantenimiento vial

Alcance: El proyecto de mantenimiento vial se restringe a la Red Vial Estatal que se encuentra geográficamente dentro de los límites de la provincia del Cañar, la cual se compone de los siguientes tramos: El Descanso - Azogues - Biblián, Biblián - Zhud, Zhud - Cochancay - El Triunfo, La Troncal - Puerto Inca y Azogues - Matrama - Mazar. Las actividades planificadas se pueden ver afectadas por la influencia del clima, factores geológicos, desastres naturales y de fuerza mayor.

Localidades: El proyecto está ubicado en la provincia del Cañar, y atraviesa los Cantones: La Troncal, Suscal, El Tambo, Cañar, Biblián y Azogues.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 91.36 %

Fecha de Inicio: 01/01/2008

Fecha de Fin: 01/05/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

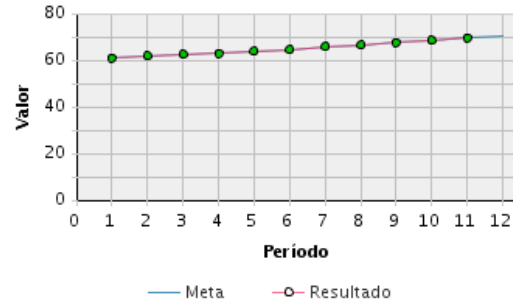

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	61 %	62 %	62 %	63 %	64 %	64 %	66 %	66 %	68 %	68 %	70 %	70 %
	Avance real acumulado											
	61 %	62 %	62 %	63 %	64 %	64 %	66 %	66 %	68 %	68 %	70 %	
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa y micoempresas en el tramo: Matrama - Mazar, Biblían - Descanso (panamericana antigua), y en el Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Además se realiza limpieza de pasos peatonales de la vía rápida Cuenca - Azogues. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 203 y 204. Limpieza de derrumbes a lo largo de la vía Matrama - Mazar. Terminación de trabajos en la alcantarilla del km 30+200 de la vía Matrama Mazar Limpieza de material del cunetas y roza a mano en la vía Matrama - Mazar Limpieza de cunetas con motoniveladora y roza a mano en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Limpieza de alcantarillas y encauzamientos en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/12/2021 - 08:23 AM
OCTUBRE 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa y micoempresas en el tramo: Matrama - Mazar, Biblían - Descanso (panamericana antigua), y en el Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Además se realiza limpieza de derrumbes en la vía rápida Cuenca - Azogues y Zhud - Cochancay - El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 203 y 204. Limpieza de derrumbes a lo largo de la vía Matrama - Mazar, Cuenca - Azogues y Zhud - Cochancay - El Triunfo. Terminación de trabajos en la alcantarilla del km 30+200 de la vía Matrama Mazar Limpieza de material del cunetas y roza a mano en la vía Matrama - Mazar Limpieza de cunetas con motoniveladora y roza a mano en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Limpieza de alcantarillas en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2021 - 09:40 AM
SEPTIEMBRE 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa y micoempresas en el tramo: Matrama - Mazar, Biblían - Descanso (panamericana antigua), en la vía rápida Descanso -Azogues, y en	Dután Sanango, Italo Medardo	01/10/2021 - 09:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
el Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Además se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la vía Zhud - Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 203 y 204. Limpieza de deslizamiento en el km 49+000 de la vía Matrama - Mazar. Colocación de alcantarillas en el km 30+200 de la vía Matrama Mazar Limpieza de material del cunetas y roza a mano en la vía rápida Descanso - Azogues. Limpieza de cunetas y roza a mano en la vía Matrama -Mazar Limpieza de cunetas y roza a mano en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.		
AGOSTO 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa y micoempresas en el tramo: Matrama - Mazar, Biblián - Descanso (panamericana antigua), en la vía rápida Descanso -Azogues, y en el Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Además se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la vía Zhud - Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 198 Y 199 Limpieza de deslizamiento en el km 49+000 de la vía Matrama - Mazar. Trabajos previos para cambio de alcantarilla en el km 33 de la vía Matrama Mazar Terminación de trabajos en la escollera en el km 35+550 de la vía Matrama Mazar. Limpieza de material del cunetas y roza a mano en la vía rápida Descanso - Azogues. Limpieza de cunetas y roza a mano en la vía Matrama -Mazar Limpieza de cunetas y roza a mano en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.	Dután Sanango, Italo Medardo	02/09/2021 - 09:17 PM
JULIO 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa y micoempresas en el tramo: Matrama - Mazar, Biblián - Descanso (panamericana antigua), en la vía rápida Descanso -Azogues, y en el Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo. Además se realizan trabajos de mantenimiento rutinario en la vía Zhud - Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 194 Explotación de materiales para preparar material de filtro. Limpieza de derrumbes y desalojo de material en la carretera Matrama - Mazar Construcción de escollera en el km 35+550 de la vía Matrama Mazar. Limpieza de material del cunetas y roza a mano en la vía rápida Descanso - Azogues. Limpieza de cunetas y roza a mano en las vías Zhud - Biblián. Limpieza de cunetas y roza a mano en la vía Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/08/2021 - 08:29 AM
JUNIO 2021 Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama -Mazar, Biblián - Descanso (panamericana antigua), y en la vía rápida Descanso -Azogues. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 53 Explotación de materiales para preparar material de filtro. Limpieza de derrumbes y desalojo de material en la carretera Matrama - Mazar Trabajos previos para la construcción de escolleras en la vía Matrama Mazar. Limpieza de material del espaldon en la vía rápida Descanso - Azogues. Limpieza de material en la vía, tramo Biblián - Azogues.	Dután Sanango, Italo Medardo	02/07/2021 - 09:05 AM
MAYO 2021. Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Zhud - Biblián, Huigra - El Triunfo, Zhud - Cochancay - El Triunfo, Matrama -Mazar, Biblián - Azogues, panamericana antigua y en la vía rápida Descanso -Azogues. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de derrumbes en la carretera Huigra - El Triunfo. Reconformación de la calzada, bacheo asfáltico en el tramo Zhud - Biblián. Limpieza de derrumbes y alcantarillas en la carretera Matrama - Mazar Reconformación de calzada y limpieza de derrumbes en la carretera Zhud - Cochancay.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/06/2021 - 10:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Bacheo asfáltico en el tramo Biblián Azogues, panamericacna antigua. Limpieza de cunetas en la vía rápida Descanso - Azogues.		
Abril 2021. Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Zhud - Biblián, Huigra - El Triunfo, Zhud - Cochancay - El Triunfo, Zhud - Río Angas. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de sistemas de drenaje, construcción de escollera para proteger taludes inferiores en la carretera Huigra - El Triunfo. Reconformación de la calzada, bacheo asfáltico en el tramo Zhud - Biblián. Limpieza de derrumbes en la carretera Zhud - Río Angas. Reconformación de calzada, limpieza de derrumbes y alcantarillado en la carretera Zhud - Cochancay.	Dután Sanango, Italo Medardo	04/05/2021 - 09:29 PM
Marzo 2021. Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Zhud Biblián, Huigra - El Triunfo, Zhud - Cochancay El Triunfo, Vía Rápida Descanso - Azogues - Biblián y Zhud - Río Angas. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de derrumbes, cunetas y espaldones y reconformación de calzada en tramos puntuales en la vía Zhud - Cochancay. Limpieza de derrumbes en la vía Zhud - río Angas Limpieza de derrumbes, cunetas, espaldones y vegetación de la carretera Huigra - El Triunfo. Limpieza de material de arrastre en cunetas, espaldones y aceras en la vía Rápida Descanso - Azogues. Reconformación de calzada en sitios críticos de la Zhud - Biblián.	Dután Sanango, Italo Medardo	04/04/2021 - 10:42 PM
Febrero 2021. Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Zhud Biblián, Panamericana Azogues - Biblián, Zhud - Cochancay El Triunfo y Zhud - Río Angas. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de derrumbes en la vía Zhud - Cochancay y Zhud - Río Angas. Bacheo en la panamericana Azogues - Biblián Reconformación de calzada en sitios críticos de la Zhud - Biblián. Bacheo asfáltico en la carretera Zhud - Biblián.	Dután Sanango, Italo Medardo	04/03/2021 - 08:24 AM
Enero 2021. Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, Zhud Biblián, vía rápida tramo Azogues - Biblián, Zhud - Cochancay El Triunfo y Zhud - Río Angas. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de derrumbes en la vía Zhud - Cochancay y Zhud - Río Angas. Bacheo con fresado en la Matrama - Mazar . Limpieza de alcantarillas en la vía rápida. Reconformación de calzada en sitios críticos de la Zhud - biblián y Zhud- Cochancay	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/02/2021 - 10:49 AM
Diciembre 2020 Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, Zhud Biblián, Panamericana Descanso - Azogues, vía rápida tramo Azogues - Biblián, Zhud - Cochancay El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Limpieza de derrumbes en la vía rápida Cuenca - Azogues Limpieza de material en la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo. Limpieza en la vía Zhud - Río Angas. Mantenimiento rutinario en la vía Matrama - mazar	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/01/2021 - 04:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2020 Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, Zhud Biblián, Panamericana Descanso - Azogues vía rápida tramo Azogues - Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Mantenimiento emergente en la vía Zhud - Biblián. Limpieza de material en la vía Descanso - Azogues. Bacheo asfáltico en la panamericana Azogues - Biblián. Mantenimiento rutinario de la vía Matrama - Mazar	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/12/2020 - 03:21 PM
OCTUBRE 2020 Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, Zhud Biblián, Panamericana Descanso - Azogues vía rápida tramo Azogues - Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON EL HITO 50 Bacheo asfáltico en tramos puntuales de la Zhud - Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Zhud - Biblián. Limpieza de deslizamiento en el km 7+800 del tramo Azogues - Biblián . Limpieza de material en la vía y de cunetas en el KM 5+900 del tramo Descanso - Azogues. Mantenimiento rutinario de la vía Matrama - Mazar	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/11/2020 - 10:13 PM
SEPTIEMBRE 2020 Se realiza el mantenimiento por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo, y en el tramo Zhud Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo con material reciclado en tramos puntuales de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar. Desalojo del material a los botaderos. Trabajos de recuperación de calzada en la vía Zhu - Biblián sector San Camilo. Limpieza de la vía en zonas puntuales del tramo Límite Guayas/Cañar - Ventura Límite Cañar/ Chimborazo.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/10/2020 - 11:32 AM
AGOSTO 2020 Se realiza un mantenimiento integral por administración directa en el tramo: Matrama - Mazar, y rutinario en el tramo Zhud Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo con material reciclado en tramos puntuales de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar. Desalojo del material a los botaderos. Trabajos de recuperación de calzada.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/09/2020 - 08:00 PM
JULIO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en el tramo: Matrama - Mazar, en la vía Zhud - Cochancay, y en el tramo Zhud Biblián. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo asfáltico en el tramo Javín - Zhud y Zhud- Biblián. Bacheo con material reciclado en el Tramo 2 de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/08/2020 - 09:20 PM
JUNIO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en el tramo: Matrama - Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2020 - 10:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de derrumbes y cunetas en el tramo: Matrama - Mazar.		
MAYO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Río Angas y Zhud - Cochancay - El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS Colocación de material de base en la vía Zhud - Cochancay - El Triunfo (sector Chilchil). Bacheo con material reciclado de carpeta asfáltica en Zhud. Limpieza de derrumbes en el tramo Río Angas- Zhud, Vía rápida Cuenca - Azogues.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/06/2020 - 10:21 PM
ABRIL 2020 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián y Zhud - Cochancay - El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de la calzada en la Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián y en la Zhud - Biblián. Limpieza de derumbes en la vía rápida Cuenca - Azogues, Zhud - Cochancay - El Triunfo. Limpieza de derrumbes en el tramo Río Angas- Biblián.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/05/2020 - 10:04 PM
MARZO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián y Zhud - cochancay - El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo con material de fresado en la vía Matrama - Mazar y en la vía Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián y en la Zhud - Biblián. Limpieza de derumbes en la vía rápida Cuenca - Azogues, Zhud - Cochancay - El Triunfo. Limpieza de derrumbes en el tramo Zhud - Río Angas. Colocación de señales verticales en el tramo Zhud - Biblián.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	06/04/2020 - 11:27 AM
FEBRERO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián y Zhud - cochancay - El Triunfo. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo con material de fresado en la vía Matrama - Mazar y en la vía Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián y en la Zhud - Biblián. Colocación de material de fresado en partes puntuales y limpieza de derrumbes en la vía Zhud - Cochancay Limpieza de derumbes en la vía rápida Cuenca - Azogues.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2020 - 11:45 AM
ENERO 2020 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián. Se contratan 4 microempresas a partir del 26/11/2019 para realizar mantenimiento rutinario en los siguientes tramos: Carretera Matrama Mazar: Tramo 1 (Matrama - Pindilig, de 30 km); Tramo 2 (Pindilig - Mazar, de 30 km) Carretera La Troncal - Puerto Inca, de 27 km.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/02/2020 - 12:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfi: Tramo Chilchil - El Chorro, de 33 km. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de cunetas y alcantarillas en la vía Matrama - Mazar. Limpieza y retiro de material de los taludes en la vía Zhu- Río Angas y Zhud - Cochancay Colocación de tachas reflectivas en la vía rápida Cuenca - Azogues. Matenimiento rutinario con microempresas en los tramos establecidos.		
DICIEMBRE 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián. Se contratan 4 microempresas a partir del 26/11/2019 para realizar mantenimiento rutinario en los siguientes tramos: Carretera Matrama Mazar: Tramo 1 (Matrama - Pindilig, de 30 km); Tramo 2 (Pindilig - Mazar, de 30 km) Carretera La Troncal - Puerto Inca, de 27 km. Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfi: Tramo Chilchil - El Chorro, de 33 km. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de derrumbes, bacheo asfáltico y reconfiguración de calzada en tramos de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes con maquinaria del MTOP provocados por fuertes lluvias en la Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián. Colocación de tachas reflectivas en la Panamericana Azogues-Biblián, sector Puente sucre Matenimiento rutinario con microempresas en los tramos establecidos.	Dután Sanango, Italo Medardo	04/01/2020 - 10:56 AM
NOVIEMBRE 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián, Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, Zhud - Biblián. Se contratan 4 microempresas a partir del 26/11/2019 para realizar mantenimiento rutinario en los siguientes tramos: Carretera Matrama Mazar: Tramo 1 (Matrama - Pindilig, de 30 km); Tramo 2 (Pindilig - Mazar, de 30 km) Carretera La Troncal - Puerto Inca, de 27 km. Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfi: Tramo Chilchil - El Chorro, de 33 km. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de derrumbes, bacheo asfáltico y reconfiguración de calzada en tramos de la vía Matrama - Mazar. Limpieza de derrumbes con maquinaria del MTOP provocados por fuertes lluvias en la Panamericana El Descanso - Azogues - Biblián y en la Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián. Colocación de tachas reflectivas en las zona urbana del cantón Cañar. Carretera Zhud - Biblián Colocación de tachas reflectivas en las zona urbana del cantón La Troncal. Carretera Zhud - Cochancay - El Triunfi. Matenimiento rutinario con microempresas en los tramos establecidos.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2019 - 01:19 PM
OCTUBRE 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. ACTIVIDADES REALIZADAS Bacheo asfáltico en la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2019 - 04:16 PM
SEPTIEMBRE 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar, hasta el 25 de septiembre de 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS	Dután Sanango, Italo Medardo	02/10/2019 - 09:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Río Angas. Reconstrucción de muro de gaviones en la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.		
AGOSTO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Río Angas. Bacheo asfáltico en diferentes tramos de la vía Zhud- Biblián. Limpieza de derrumbes en la vía Matrama - Mazar.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/09/2019 - 05:15 PM
JULIO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar. ACTIVIDADES REALIZADAS Terminación de la construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso. Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Bacheo asfáltico en los sectores de Javin y Chilchil, pertenecientes al Tramo Zhud- Cochancay.	Dután Sanango, Italo Medardo	01/08/2019 - 12:41 PM
JUNIO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar. ACTIVIDADES REALIZADAS Construcción de muro de gaviones sector Rumiurco de la vía Azogues - Descanso. Limpieza de cunetas, roza a mano y alcantarillas en la vía Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2019 - 11:05 AM
MAYO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay; Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/06/2019 - 03:46 PM
ABRIL 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, Zhud - Río Angas. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud - Río Angas y Matrama Mazar.	Dután Sanango, Italo Medardo	02/05/2019 - 08:18 AM
MARZO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay - El Triunfo y Pasos Laterales; y, Zhud - Biblián, panamericana antigua tramo Biblián - Descanso. Se trabaja con 2 microempresas en los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Dután Sanango, Italo Medardo	02/04/2019 - 04:21 PM
FEBRERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:29 AM
ENERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha contratado 2 microempresas desde el 26 y 27 de febrero de 2019, las mismas que atienden los tramos: Zhud Río Angas y Matrama Mazar.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2019 Se realiza mantenimiento por administración en los tramos: Matrama- Mazar, Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Biblián. Se ha iniciado la gestión para obtener recursos para la contratación de microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 08:14 AM
DICIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vía Zhud - Biblián. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; y Zhud - Río Angas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	04/01/2019 - 08:09 AM
NOVIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 05:07 PM
OCTUBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 8 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales; Y Zhud - Río Angas.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 04:09 PM
SEPTIEMBRE 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 12:31 PM
AGOSTO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 05:30 PM
JULIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:45 AM
JUNIO 2018 Se realiza mantenimiento por administración Directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:31 PM
Mayo2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 7 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso, Zhud - Cochancay El Triunfo y Pasos Laterales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:46 PM
Abril 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 02:08 PM
Marzo 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Zhud - Biblián, Zhud - Cochancay. Se ha contratado 4 microempresas para el mantenimiento de la red vial Estatal, las mismas que trabajan en las vía Matrama- Mazar, Troncal - Puerto Inca, y Azogues - Descanso.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 04:18 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2018 Se realiza mantenimiento por administración directa en las vías Descanso - Azogues, y Troncal - Puerto Inca. No se ha logrado contratar a las microempresas por falta de aprobación del aval para el servicio de voluntariado.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:52 AM
ENERO 2018 Se realiza mantenimiento de la vía matrama - Mazar por administración directa, puesto que no se ha podido contratar a las microempresas.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:50 AM
DICIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:48 PM
NOVIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, con el propósito de mantener la vía en condiciones de transitabilidad confiable para los usuarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 04:15 PM
OCTUBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano. Además se coloca tachas en la vía Azogues - Matrama con la ayuda de los microempresarios.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 11:48 AM
SEPTIEMBRE 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 03:38 PM
AGOSTO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:53 PM
JULIO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante mantenimiento rutinario. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 09:29 AM
JUNIO 2017	García González,	05/07/2017 - 10:29 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento en las vías Troncal - Puerto Inca, Matrama - Mazar; Zhud - Descanso de la red vial estatal mediante la limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Además se ejecuto un bacheo asfáltico menor en la vía Descanso Azogues. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana), carretera Matrama_Mazar y Troncal Puerto Inca con cuatro microempresas de conservación vial contratadas, donde se ejecutan actividades de limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano.	Mariana Alexandra	
MAYO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:28 AM
ABRIL 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal en la red vial estatal.. Se realiza mantenimiento rutinario de la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar con tres microempresas de conservación vial contratadas	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:37 PM
MARZO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:13 PM
FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, limpieza constante de derrumbes provocados debido a la fuerte epoca invernal Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 02:12 PM
FEBRERO 2017 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la mantenimiento en la carretera Zhud-Biblián con limpieza de cunetas, bordillos, alcantarillas y roza a mano, Se contrataron 3 microempresas las cuales estan dando mantenimiento rutinario la carretera Descanso_Azogues (Panamericana) y la carretera Matrama_Mazar.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/03/2017 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 07:03 PM
NOVIEMBRE 2016 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes y bacheo en la carretera Matrama-Mazar, en la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana) Y en la carretera Zhud-Biblián se encuentran realizando limpieza de cunetas, bordillos y roza a mano	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 03:07 PM
OCTUBRE 2016 los contratos de las microempresas culmino por falta de recursos . Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazary la carretera descanso-azogues-biblian (panamericana)	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:33 PM
SEPTIEMBRE 2016 La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar		
AGOSTO 2016: La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de alcantarillas desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	01/09/2016 - 07:51 AM
JULIO 2016: La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 5+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/08/2016 - 12:30 PM
JUNIO 2016: La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 10+000 al 19+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 02:32 PM
MAYO 2016: La microempresa Sageo esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos desde el Km 0+000 al 10+000 de la carretera Descanso-Azogues-Biblian. Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 08:12 PM
ABRIL 2016: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 60+000 de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2016 - 07:43 AM
MARZO 2016: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 00+000 al Km 30+000 de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 09:32 PM
FEBRERO 2016: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de cunetas y derrumbes desde el Km 30+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/03/2016 - 05:26 PM
ENERO 2016: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 20+000 al Km 50+000 de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2016 - 10:45 AM
DICIEMBRE 2015: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000 de la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:38 AM
NOVIEMBRE 2015: Personal y maquinaria del MTOP esta realizando	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
la limpieza de derrumbes desde el Km 30+000 al Km 69+000.		
OCTUBRE 2015: Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:25 PM
SEPTIEMBRE 2015 Personal y maquinaria del MTOP continua con la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:22 PM
AGOSTO 2015 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando la limpieza de derrumbes desde el Km 40+000 al Km 69+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 10:24 AM
JULIO 2015 Por la fuerte temporada invernal En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de derrumbes y alcantarillas con personal y maquinaria del MTOP Km 30 +000 al 69+000..	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2015 - 09:28 PM
JUNIO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños desde el Km 40 +000 al 69+000..	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:42 PM
MAYO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 02:17 PM
ABRIL 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 00+000 al 10+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/05/2015 - 07:48 AM
MARZO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y derrumbes pequeños. En la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos en el Km 10+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:35 PM
FEBRERO 2015 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos. E la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:41 AM
ENERO 2014 En la carretera Azogues - Matrama - Mazar se esta realiendo la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza del derecho de via. en la carretera Biblian-Azogues-Descanso se esta realizando el bacheo asfaltico desde el Km 6+000 al 19+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2014 Se esta realizando el bacheo asfáltico en la carretera Biblian-Azogues-Descanso, antigua panamericana, tambien la limioieza de cunetas y bordillos en la carretera Azogues-Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:49 AM
NOVIEMBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos. Tambien se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos del tramo Azogues a Matrama.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:21 PM
OCTUBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos. Tambien se esta realizando la limpieza de derrumbes pequeños en el tramo comprendido entre el Km 50 + 000 al 60 +000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/11/2014 - 09:31 PM
SEPTIEMBRE 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta realizando la limpieza de cunetas, bordillos y limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:09 PM
AGOSTO 2014 Personal y maquinaria del MTOP esta realizando el mantenimiento de la carretera Matrama-Mazar. Se esta restituyendo una alcantarilla en el sector de Buenos Aires en la carretera Matrama-Mazar	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:44 PM
JULIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambien de derrumbes pequeños con personal y maquinaria del MTOP y la microempresa.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:39 PM
JUNIO 2014 En la carretera Matrama-mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos, como tambine de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 08:31 AM
MAYO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos y tambien alcantarillas. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de derrumbes pequeños.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	03/06/2014 - 02:34 PM
ABRIL 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos como tambien la limpieza de alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/05/2014 - 08:05 PM
MARZO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando el sellado de fisuras. En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de cunetas y bordillos. Se esta limpiando alcantarillas con ayuda de la excavadora 320 en el sector de Buenos Aires.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 07:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2014 En la carretera Matrama-mazar desde matrama hasta pindilig se esta realizando mla limpieza de cunetas, En el tramo entre Pindilig y Mazar se esta realizando la limpieza de Alcantarillas.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	28/02/2014 - 09:31 AM
ENERO 2014 En la carrtera Matrama-Mazar, en el tramo entre Buenos Aires y Rivera se esta realizando el bacheo con mezcla asfaltica.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 07:27 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Deformaciones en la red vial estatal.	30/11/2021	Italo Medardo Dután Sanango	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos CAUSARÍA el retraso del mantenimiento de la vía.	02/12/2021	Italo Medardo Dután Sanango	60 %	80	48	1/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Tramos de la red vial estatal a ser intervenidos.	1-Solicitud de Información	15/12/2013		15/12/2013		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Presupuesto para el mantenimiento aprobado.	1-Solicitud de Información	31/12/2013		31/12/2013		Sí	5.0
3	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2014 contratada.	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	1.0
4	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2014 contratada.	3-Adjudicación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	1.0
5	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-mazar febrero 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) febrero 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25
7	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) marzo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25
8	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) marzo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25
9	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-mazar abril 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
10	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) abril 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
11	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		15/05/2014		Sí	0.25
12	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-mazar mayo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.25
13	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) mayo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.25
14	EJECUCION: Bacheo asfaltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2014		15/06/2014		Sí	0.25
15	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-Mazar mayo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.25
16	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) mayo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.25
17	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera Azogues-Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	0.25
18	EJECUCION: Limpieza de derrumbes por administración directa de la carretera Azogues-Matrama-Mazar mayo 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	15/07/2014		15/07/2014		Sí	0.25
19	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera	5-Entregables Intermedios	15/08/2014		15/08/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Biblian-Azogues-Descanso realizado.							
20	EJECUCION: Limpieza de derrumbes por administración directa de la carretera Azogues-Matrama-mazar agosto 2014 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.25
21	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	0.25
22	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el mes de septiembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	15/09/2014		15/09/2014		Sí	0.25
23	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2014		15/10/2014		Sí	0.25
24	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de octubre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.25
25	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de noviembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.25
26	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.25
27	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.5
28	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el mes de diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25
29	EJECUCION; Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de diciembre del 2014 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25
30	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2015 contratada	4-Inicio de Trabajo	10/01/2015		10/01/2015		Sí	1.0
31	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-	4-Inicio de Trabajo	10/01/2015		10/01/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Biblian (antigua panamericana) para el 2015 contratada.							
32	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-Mazar febrero 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
33	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) febrero 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
34	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-Mazar marzo 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
35	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) marzo 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
36	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Azogues-Matrama-mazar abril 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25
37	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) abril 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25
38	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 30+000 al 60+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	0.25
39	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) mayo 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.25
40	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 19+000 en la carretera Descanso-Biblian realizado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.25
41	EJECUCION: Mantenimiento rutinario de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) junio 2015 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.25
42	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el mes de julio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.25
43	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de julio del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.25
44	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Matrama-Mazar realizado.							
45	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de agosto del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.25
46	EJECUCION: Limpieza de Alcantarillas en la carretera biblian-Azogues-Descanso realizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	0.25
47	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-mazar en el mes de septiembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.25
48	EJECUCION: Bacheo asfáltico desde el Km 00+000 al 30+000 en la carretera Matrama-Mazar realizado.	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.25
49	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de octubre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.25
50	EJECUCION: Limpieza de derrumbes en la carretera matrama-mazar concluido.	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	0.25
51	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.25
52	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.5
53	ECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de diciembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.25
54	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar en el mes de diciembre del 2015 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.25
55	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2016 contratada.	5-Entregables Intermedios	10/01/2016		10/01/2016		Sí	0.5
56	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-	5-Entregables Intermedios	10/01/2016		10/01/2016		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Biblian (antigua panamericana) para el 2016 contratada							
57	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el mes de febrero del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.25
58	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de febrero del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.25
59	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el mes de marzo del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.25
60	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de marzo del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.25
61	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el mes de abril del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.25
62	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de abril del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.25
63	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el mes de mayo del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.25
64	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de mayo del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	9-Entregables Formales	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.25
65	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramazar en el mes de junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.25
66	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de junio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.							
67	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el mes de julio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.25
68	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de julio del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.25
69	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el mes de agosto del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.25
70	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de agosto del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.25
71	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el mes de septiembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.25
72	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de septiembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.25
73	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el mes de octubre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.25
74	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de octubre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.25
75	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matramamazar en el mes de noviembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
76	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.25
77	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
78	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar en el mes de diciembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.25
79	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de diciembre del 2016 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.25
80	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2017 contratada.	4-Inicio de Trabajo	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
81	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2017 contratada	4-Inicio de Trabajo	15/01/2017		15/01/2017		Sí	0.5
82	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de febrero de 2017 realizado a satisfaccion del MTOP.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.25
83	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de febrero del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.25
84	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de marzo de 2017 realizado a satisfaccion del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.25
85	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de marzo del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.25
86	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de abril de	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	2017 realizado a satisfacción del MTOP.							
87	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de abril del 2017 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.25
88	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de mayo de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.25
89	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de mayo del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.25
90	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de junio de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
91	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de junio del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
92	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de julio de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/07/2017		30/07/2017		Sí	0.25
93	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de julio del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/07/2017		30/07/2017		Sí	0.25
94	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de agosto de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.25
95	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de agosto del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.25
96	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en la carretera Azogues-Matrama- Mazar en el mes de septiembre de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.							
97	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de septiembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25
98	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de octubre de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.25
99	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de octubre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.25
100	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar en el mes de noviembre de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
101	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
102	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar en el mes de noviembre de 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.25
103	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2017 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.25
104	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.5
105	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2018 contratada.	3-Adjudicación	15/01/2018		15/01/2018		Sí	0.5
106	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2018 contratada	3-Adjudicación	15/01/2018		15/01/2018		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
107	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de enero de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
108	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de enero del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
109	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de febrero de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.25
110	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el mes de febrero del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.25
111	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de marzo de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
112	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el mes de marzo del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
113	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de abril de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.25
114	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el mes de abril del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.25
115	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de mayo de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
116	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso (antigua panamericana) en el mes de mayo del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
117	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de junio de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.25
118	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de junio del 2018 realizado.							
119	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de julio de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.25
120	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de julio del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.25
121	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de agosto de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.25
122	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de agosto del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.25
123	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de septiembre de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.25
124	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de septiembre del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.25
125	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de octubre de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.25
126	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de octubre del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.25
127	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de noviembre de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.25
128	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de noviembre del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.25
129	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar en el mes de diciembre de 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
130	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Biblian-Azogues-Descanso(antigua panamericana) en el mes de diciembre del 2018 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25
131	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de enero de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.25
132	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de enero del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.25
133	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de febrero de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
134	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de marzo de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
135	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Troncal Puerto Inca en el mes de marzo del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
136	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de febrero del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
137	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de marzo de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.25
138	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de marzo del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.25
139	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de abril de 2019 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
140	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de abril del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
141	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de mayo de 2019 realizado							
142	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de mayodel 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25
143	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de junio de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.25
144	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de junio del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.25
145	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de julio de 2019 realizado a satisfacción del MTOP	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.25
146	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de julio del 2019 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.25
147	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de agosto de 2019 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.25
148	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de agosto del 2019 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		30/09/2019		Sí	0.25
149	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.5
150	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de septiembre de 2019 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		31/08/2019		Sí	0.25
151	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de septiembre del 2019 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
152	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de octubre de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
153	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de octubre del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
154	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de noviembre de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
155	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de noviembre del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
156	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de diciembre de 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.25
157	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El triunfo en el mes de diciembre del 2019 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.25
158	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de Enero de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.25
159	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de Enero 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.25
160	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de Febrero de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.25
161	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de febrero 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2020		28/02/2020		Sí	0.25
162	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de marzo de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.25
163	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de marzo 2020 realizado.							
164	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de abril de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25
165	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de abril de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25
166	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de mayo de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.25
167	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de mayo de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.25
168	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de junio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.25
169	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de junio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.25
170	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de julio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
171	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de julio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
172	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de agosto de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.25
173	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de agosto de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.25
174	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, y Descanso -	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Azogues Biblian en el mes de septiembre de 2020 realizado.							
175	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de septiembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
176	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de octubre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
177	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de octubre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
178	EEJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de noviembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
179	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de noviembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
180	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
181	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
182	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de enero de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.25
183	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo en el mes de enero de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.25
184	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de febrero de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.25
185	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de febrero de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
186	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de marzo de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.5
187	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de marzo de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.25
188	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de abril de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.25
189	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de abril de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.25
190	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de mayo de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	0.25
191	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de mayo de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	0.5
192	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, en el mes de junio de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.5
193	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera y Descanso - Azogues Biblián en el mes de junio de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.25
194	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2021 contratada.	4-Inicio de Trabajo	15/07/2021		15/07/2021		Sí	0.5
195	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Dos Bocas - Angas para el 2021 contratada	4-Inicio de Trabajo	15/07/2021		15/07/2021		Sí	0.5
196	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de julio de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.25
197	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Dos Bocas - Angas en el mes	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de julio de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.							
198	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de Agosto de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		31/08/2021		Sí	0.25
199	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Dos Bocas - Angas en el mes de agosto de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		31/08/2021		Sí	0.25
200	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.5
201	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de septiembre de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.25
202	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Dos Bocas - Angas en el mes de septiembre de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.25
203	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de octubre de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.5
204	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de octubre de 2021 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.5
205	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de noviembre de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2021		30/11/2021		Sí	0.5
206	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de noviembre de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2021		30/11/2021		Sí	0.5
207	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de diciembre de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
208	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de diciembre de 2021 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
209	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Azogues-Matrama-mazar para el 2022 contratada	5-Entregables Intermedios	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
210	PLANEACION: Microempresas para el mantenimiento de la carretera Descanso-Azogues-Biblian (antigua panamericana) para el 2022 contratada	5-Entregables Intermedios	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0
211	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de febrero de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2022	28/02/2022			No	0.5
212	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de febrero de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2022	28/02/2022			No	0.5
213	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de marzo de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022	31/03/2022			No	0.5
214	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de marzo de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
215	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de abril de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2022	30/04/2022			No	1.0
216	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de abril de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2022	30/04/2022			No	1.0
217	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, y Descanso - Azogues Biblian en el mes de mayo de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2022	31/05/2022			No	1.0
218	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Zhud Cochancay - El Triunfo, Rio Angas - Zhud - Biblián en el mes de mayo de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2022	31/05/2022			No	1.0
219	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera Azogues-Matrama-Mazar, en el mes de junio de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0
220	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario y emergente en la carretera y Descanso - Azogues Biblián en el mes de junio de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
221	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de julio de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	31/07/2022			No	1.0
222	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de julio de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	31/07/2022			No	1.0
223	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de Agosto de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	1.0
224	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de agosto de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	1.0
225	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de septiembre de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
226	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de septiembre de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022			No	1.0
227	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de octubre de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	1.0
228	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de octubre de 2022 realizado a satisfacción del MTOP.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	1.0
229	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en el mes de noviembre de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	1.0
230	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de noviembre de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	1.0
231	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva firmada	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5
232	EJECUCION: Mantenimiento Rutinario en la carretera Azogues-Matrama- Mazar, en	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el mes de diciembre de 2022 realizado.							
233	EJECUCION:Mantenimiento Rutinario en la carretera Descanso - Azogues Biblian en el mes de diciembre de 2022 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
234	CIERRE: Informes del Supervisor aprobados	9-Entregables Formales	15/01/2023	15/01/2023			No	0.5
235	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	31/01/2023	31/01/2023			No	1.0
236	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado.	9-Entregables Formales	18/02/2023	18/02/2023			No	1.0
237	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	28/02/2023	28/02/2023			No	1.0
238	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/03/2023	31/03/2023			No	1.0
239	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/03/2023	31/03/2023			No	1.0
240	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2023	31/03/2023			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Positiva: Limpieza de cunetas y bordillos	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	31/08/2017
2	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza y mantenimiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
3	Supervisión Positiva - Trabajos de limpieza en la vía.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/04/2016
4	Supervisión Positiva- Se realizan mantenimientos en diferentes vías	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/11/2015
5	Limpieza de cunetas y lastrado de las vías en las Parroquias	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/05/2015
6	Verificación de la terminación del Proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
7	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2014
8	Mantenimiento vial, limpieza de derrumbes	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Km de la Red Vial en buen estado		100.00 %	0.8	0.8	01/01/2014	Noviembre
2	Porcentaje de cumplimiento economico del cronograma		106.25 %	0.8	0.85	01/01/2014	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,529,277.52 **
Costo Total:	10,896,493.82
Total Devengado:	3,640,026.32
% Costo Total Devengado:	33.41 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 33.41 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	12,080,089.65	160,673.54	0.00	12,240,763.19
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,725,463.12	321,244.14	0.00	5,046,707.26
Ppto. Codificado	3,090,465.16	355,673.54	0.00	3,446,138.70
Ppto. Comprometido	2,587,672.74	133,056.19	0.00	2,720,728.93
Planeado - Codificado (2021)		-195,000.00		
Programado a Devengar	3,730,885.63	160,673.54	0.00	3,891,559.17
Ppto. Devengado	3,368,603.98	271,422.34	0.00	3,640,026.32
Pagado Real	2,236,997.52	72,644.32	0.00	2,309,641.84
Estimado a fin de año	* 3,368,603.98	142,605.25	0.00	3,511,209.23
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	362,281.65	18,068.29	0.00	380,349.94
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 90.29 %	168.93 %	0.00 %	93.54 %
Ppto. Codificado 998	0.00	275,661.44	0.00	275,661.44
Ppto. Devengado 998	0.00	133,056.19	0.00	133,056.19

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

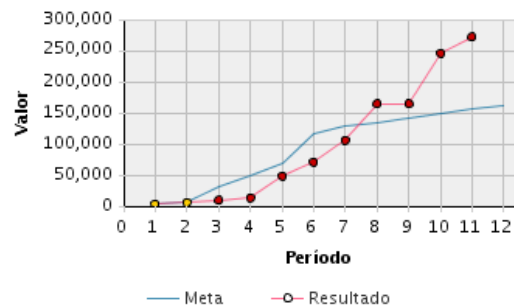

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	3,389.46	2,964.06	3,389.46	2,964.06	87.45 %	▼	1.84 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,389.46	2,964.06	6,778.92	5,928.12	87.45 %		3.69 %
Mar	24,033.11	2,964.06	30,812.03	8,892.18	28.86 %		5.53 %
Abr	17,146.52	4,196.32	47,958.55	13,088.50	27.29 %		8.15 %
May	20,885.55	34,589.23	68,844.10	47,677.73	69.25 %		29.67 %
Jun	48,010.82	22,641.31	116,854.92	70,319.04	60.18 %		43.77 %
Jul	10,839.93	35,292.63	127,694.85	105,611.67	82.71 %		65.73 %
Ago	7,089.46	59,103.31	134,784.31	164,714.98	122.21 %		102.52 %
Sep	6,699.56	0.00	141,483.87	164,714.98	116.42 %		102.52 %
Oct	7,079.43	80,321.38	148,563.30	245,036.36	164.94 %		152.51 %
Nov	7,018.94	26,385.98	155,582.24	271,422.34	174.46 %		168.93 %
Dic	5,091.30		160,673.54				
Total	160,673.54	271,422.34					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1-Informe sitop-mayo-05-micro-Matapin	Inf-sitop-mayo05--micro-Matapin.pdf	09/06/2015
2	A2-Informe-sitop-mayo-05-micro-Zhoray	Inf-sitop-mayo-05-micro-Zhoray.pdf	09/06/2015
3	A3-Informe sitop-junio-05-micro-Sageo	Informe_sitop_junio-05_micro-Sageo.pdf	08/07/2015
4	A4-Informe sitop junio-05-micro-Matapin	Informe_sitop_junio-05_micro-Matapin.pdf	08/07/2015
5	A5 Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
6	A6-Informe-sitop-junio-05-micro-Zhoray	Informe_sitop_junio-05-micro-zhoray.pdf	08/07/2015
7	A7-Inf-micro-sageo-junio-06	A7-Inf-micro-sageo-junio-06.pdf	04/07/2016
8	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin	A8-Inf-sitop-julio-06-Matapin.pdf	04/08/2016
9	A9-Informe-sitop-micro-matapin-agos-05	Inf-sitop-matapin-agos-05.pdf	07/09/2015
10	APERTURA DE PROYECTOS: K020 MTOP-Reconstrucción Vía Rápida Cuenca-Azogues-Biblián, incluido ampliación Tramo El Descanso-Azogues-Biblián de 42 km long. y K023 MTOP- Mantenimiento Vial de la provincia de Cañar.	APERTURA_DE_PROYECTOS_K020_MTOP-Reconstrucción_Vía_Rápida_Cuenca-Azogues-Biblián_y_K023_Mantenimiento_Vial.pdf	05/08/2021
11	B0-Inf-sitop-julio-06-Zhoray	A9-Inf-sitop-julio-06-Zhoray.pdf	04/08/2016
12	B1 Acta de recepción microempresa sageo	19559_-Acta_Definitiva.pdf	05/12/2017
13	B2 Anexo Problema 1 Deformaciones RVE Cañar	Problema_1_DEFORMACIONES_RVE_CAÑAR.pdf	04/01/2020
14	B3-Inf-sitop-junio-2017	Informe_Troncal_Puerto_Inca.pdf	05/07/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	B4 INFORME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_SAGEO.pdf	04/10/2016
16	B5 INFOMRE SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_ZHORAY.pdf	04/10/2016
17	B6 Informe ejecutivo mes de agosto 2017	INFORME_EJECUTIVOMICROEMPRESA_SAGEO.pdf	05/09/2017
18	B7 informe sitop matapin octubre	microempresa_matapin.pdf	05/11/2016
19	B8 informe sitop octubre sageo	miroempresa_sageo.pdf	05/11/2016
20	B9 INFOMRME SITOP SEPTIEMBRE 2016	MICRO_MATAPIN.pdf	04/10/2016
21	C0 informese sitop octubre zhoray	miroempresa_zhoray.pdf	05/11/2016
22	C1 Acta de recepción definitiva	Acta_de_trabajos_microempresa_primavera.pdf	05/08/2017
23	C2 PLANILLA DE TRABAJOS MATRAMA - MAZAR	Planilla_microempresa_Matapin_marzo_2017.pdf	05/05/2017
24	C3 Planilla de Trabajos realizados carretera Azogues - Matrama - Mazar	Planilla_microempresa_Zhoray_marzo_2017.pdf	05/05/2017
25	C4 Informe-sitop-micro-sageo-agos-05	Inf-sitop-sageo-agos-05.pdf	07/09/2015
26	C5 Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 1	PLANILLA_MICROEMPRESA_MATAPIN.pdf	05/07/2017
27	C6 Planilla mes de mayo de 2017 Tramo 2	PLANILLA_MICROEMPRESA_ZHORAY.pdf	05/07/2017
28	C7 Trabajos de mantenimiento en la carretera Biblián - Descanso - Azogues.	Planilla_microempresa_Sageo_marzo_2017.pdf	05/05/2017
29	C8 Acta de recepción microempresa matapin	Acta_de_recepción_parcial_Matrama_mazar_T1.pdf	05/10/2017
30	C9 Informe ejecutivo mes de octubre 2017	Informe_Mensual_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
31	D0 Acta de recepción microempresa matapin	Acta_Microempresa_Matapin_-_Sep.pdf	01/11/2017
32	D1 Acta de recepción microempresa matapin	19561_Acta_de_recepción_parcial_1.pdf	05/12/2017
33	D2 Acta de recepción microempresa sageo	Acta_de_recepción_parcial_Descaso_Biblián.pdf	05/10/2017
34	D3 Acta de recepción microempresa ZHORAY	19561_Acta_de_recepción_parcial_2.pdf	05/01/2018
35	D4 Acta de recepción microempresa sageo	Acta_Microempresa_Sageo_-_Sep.pdf	01/11/2017
36	D5 Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa CHONTAMARCA	22348_Chontamarca_Acta_Recepción_Definitiva_2018.pdf	04/01/2019
37	D6 Informe ejecutivo mes de Marzo 2018 Descanso Biblián	informe_ejecutivo_sageo.pdf	05/04/2018
38	D7 Acta de recepción definitiva año 2018 microempresa MATAPIN	Acta_de_recepcion_definitivo_Matapin.pdf	04/01/2019
39	D8 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_MATRAMA_MAZAR_T2.pdf	03/08/2018
40	D9 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJEC_TRONCAL_PUERTO_INCA.pdf	03/08/2018
41	DESIGNACION LIDER DE PROYECTO K023	DESIGNACIO_LIDER_PROYECTO_K023.pdf	27/04/2021
42	E0 Acta de recepcion parcial mes de diciembre 2018 MICROEMPRESA SAGEO	Acta_de_recepcion_parcial_sageo_diciembre.pdf	04/01/2019
43	E1 Acta de recepción parcial mes de abril 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Abril_2019.pdf	02/05/2019
44	E2 Trabajos de mantenimiento rutinario y emergente en la red vial estatal de la provincia del Cañar.	trabajos_microempresas.pdf	21/08/2019
45	E3 Acta de Recepción Definitiva Septiembre 2019 Nuevo Javin	Acta_de_Recepción_Definitiva_Javin_2019.pdf	02/10/2019
46	E4 Planilla Agosto Septiembre Microempresa Nuevo Javin	Planillas_Julio_Septiembre_Nuevo_Javín_2019.pdf	02/10/2019
47	E5 Acta de recepción parcial mes de marzo 2019	23397_Acta_Recepción_Parcial_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
48	E6 - CEDULAS PRESUPUESTARIAS ENERO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUCION_PRESUP._ENE_-_SEP_2020_(MANTENIMIENTO).pdf	21/10/2020
49	E7 Planilla Nro 1 Microempresa Nuevo Javin	23397_Planilla_1_Nuevo_Javín_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
50	E8. Inf-sitop-junio-2017	informe_ejecutivo_El_Descanso.pdf	05/07/2017
51	E9.-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_2.pdf	05/07/2017
52	F0 Acta de Recepción Definitiva Septiembre 2019 Zhoray	Acta_de_Recepción_Definitiva_Zhoray_2019.pdf	02/10/2019
53	F1 Informe ejecutivo mes de julio 2018	INFORME_EJECT_DESCANSO_-_AZOG-_Bl.pdf	03/08/2018
54	F2 Planilla Agosto Septiembre Microempresa Zhoray	Planillas_Julio_Septiembre_Zhoray_2019.pdf	02/10/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
55	F3-Inf-sitop-junio-2017	Matrama_Mazar_tramo_1.pdf	05/07/2017
56	F4 Planilla Diciembre Microempresa Chontamarca	MICROEMPRESA_CHONTAMARCA_DICIEMBRE.pdf	04/01/2020
57	F5 Planilla Diciembre Microempresa Matapin	MICROEMPRESA_MATAPIN_DICIEMBRE.pdf	04/01/2020
58	F6 Planilla Diciembre Microempresa Pancho Negro	MICROEMPRESA_PANCHO_NEGRO_DICIEMBRE.pdf	04/01/2020
59	F7 Planilla Diciembre Microempresa Primavera	MICROEMPRESA_PRIMAVERA-DICIEMBRE.pdf	04/01/2020
60	F8 Planilla Diciembre Microempresa Zhoray	MICROEMPRESA_ZHORAY_DICIEMBRE.pdf	04/01/2020
61	F9 Acta de recepción parcial mes de marzo 2019 Zhoray	23398_Acta_Recepción_Parcial_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
62	G0 Planilla Nro 1 Microempresa Zhoray 2019	23398_Planilla_1_Zhoray_Marzo_2019.pdf	02/05/2019
63	G1. Acción 1. Problema 2	Problema_2_acción_1.pdf	23/12/2020
64	G2. Formato SENPLADES Julio 19	2019-07-16_09-37-54_FORMATOMANTENIMIENTOSENPLADES2019.pdf	01/02/2019
65	G3. Orden de compra Microempresa Zhoray	23398_Orden_de_Compra_Septiembre_2019.pdf	28/11/2019
66	G4. Riesgo 3. Acción 1.	Riesgo_3_accion_1..pdf	31/12/2020
67	G5. Acción 1. Problema 3	Problema_3_acción_1-signed-signed.pdf	30/11/2021
68	G6. Riesgo 4. Acción 1.	Riesgo_4_Acción_1.pdf	03/12/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Dután Sanango, Italo Medardo	Lider de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar, Encargado	imdutan@mtop.gob.ec	072240227 ext 62801
Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	gizquierdo@mtop.gob.ec	
López Guillén, Ramiro Santiago	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario/a de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	rlopez@mtop.gob.ec	
Torres Jara, Julia Brumilda	Coordinador Administrativo Financiero	Analista Administrativa Financiero	jtorres@mtop.gob.ec	072240227 ext 62814

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
75724_1.jpg	04/01/2020
