

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Morona Santiago

PROYECTO: K043 MTOP- Mantenimiento Vial de la Provincia de Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando (jtipan@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, Provincia - Morona Santiago
Titular:	Saavedra Correa, Jose Luis	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3661	TIR:	20.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,193,843.65
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2012 - 31/01/2022
Fecha de última actualización:	05/11/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

La realización del Manteamiento de las vías que se encuentran a cargo del MTOP en la Provincia de Morona Santiago.

Contratista: Varios contratos con diferentes contratistas, como Microempresas, etc.

Microempresas: 21 de Marzo, Valle del río, Esperanzas del futuro, Luchando por el Futura, Brisas del Sangay, Brisas del Upano,

Objetivo: Mejorar el nivel de servicio del usuario, integrando zonas productivas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras, implementando mano de obra directa e indirecta, servicio directo a las poblaciones de las Provincias del Azuay, Morona y el resto del país.

Linea base.- proyecto se encuentra a nivel de carpeta asfáltica con cunetas revestidas, con señalización horizontal y vertical.

monto mantenimiento año 2012\$ 4.408.599,39
 monto mantenimiento año 2013\$ 1.287.429,58
 monto mantenimiento año 2014\$ 924.557,59
 monto mantenimiento año 2015\$ 3.058.380,48
 monto mantenimiento año 2016\$ 2.000.000,00
 Valor Total \$ 11.678.967,04

Beneficios Cualitativos

Realizando el Mantenimiento se tiene las vías en buenas condiciones, lo que mejora el Comercio, la fácil salida de los productos agrícolas y ganaderos, se incrementa el Turismo tanto nacional como internacional. Es decir, mejorar el nivel de servicio, seguridad vial y costo de viaje.

Tipo de Beneficiario

Directos:
 Indirectos:
 Población de la Provincia de Morona Santiago y Provincia aledañas


Restricciones

Tiempo: la fecha limite para culmiar las obras es el 31 de Diciembre de 2014

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 78.15 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2012 Fecha de Fin: 31/01/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

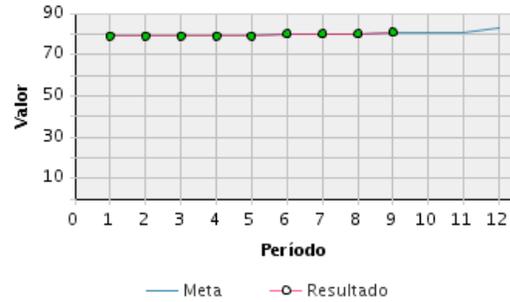

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %	80 %	80 %	81 %	81 %	81 %	83 %
	Avance real acumulado											
	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %	80 %	80 %	80 %	81 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2019 - 05:14 PM
SEPTIEMBRE 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 23 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/10/2019 - 11:26 AM
AGOSTO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM
JULIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/09/2019 - 04:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de drenajes, derrumbes, Señalización, etc, se cuenta con 22 Asociaciones de Conservación Vial a lo largo de la Provincia para la ejecución del mantenimiento rutinario.		
JUNIO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/07/2019 - 03:23 PM
MAYO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/07/2019 - 11:36 AM
ABRIL 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/05/2019 - 09:56 AM
MARZO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/04/2019 - 07:17 AM
FEBRERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc a nivel de la red vial estatal.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/03/2019 - 07:38 AM
ENERO 2019.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucua, Sucua - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/02/2019 - 10:58 AM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2019 - 09:13 AM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/12/2018 - 09:05 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTUBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/11/2018 - 04:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(HITO ASOCIADO 9) SEPTIEMBRE 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2018 - 01:28 PM
(HITO ASOCIADO 9) AGOSTO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/09/2018 - 11:58 AM
HITO ASOCIADO 9) JULIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, Señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	02/08/2018 - 02:58 PM
HITO ASOCIADO 9) JUNIO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Idrovo Aguirre, Romeo Alexander	06/07/2018 - 07:25 PM
MAYO 2018. Con fecha 28 de mayo de 2018, se analizo y aprobó los avales de servicio de voluntariado, se inicio con el proceso para la contratación, mientras tanto el mes de mayo hubieron fuertes precipitaciones a lo largo de la RVE, los mismos que provocaron el cierre parcial en algunos tramos, se trabajo con maquinaria por administración directa y con colaboración de la empresa privada se despejo las vías, además existió el apoyo de maquinarias de otras Direcciones Distritales.	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/06/2018 - 09:52 AM
HITO ASOCIADO 9) ABRIL 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/05/2018 - 03:07 PM
(HITO ASOCIADO 9) MARZO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/04/2018 - 04:14 PM
(HITO ASOCIADO 9) FEBRERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbletza, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc		
(HITO ASOCIADO 9) ENERO 2018.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	20/03/2018 - 02:33 PM
(HITO ASOCIADO 9) DICIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	04/01/2018 - 04:45 PM
(HITO ASOCIADO 9) NOVIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	06/12/2017 - 11:06 AM
(HITO ASOCIADO 9) OCTURE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	01/11/2017 - 03:42 PM
SEPTIEMBRE 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Tramos: Puente Pastaza - Macas, Macas - Sucúa, Sucúa - Logroño, Logroño - Bella Unión, Bella Unión - Limón, Limón - Plan de Milagro, Plan de Milagro - Gualaquiza, Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y Cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Tipan Guañuna, Jairo Fernando	05/10/2017 - 11:46 AM
AGOSTO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	06/09/2017 - 04:08 PM
JULIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	04/08/2017 - 12:18 PM
JUNIO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de	Saavedra Correa, Jose Luis	04/07/2017 - 03:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc		
MAYO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/06/2017 - 04:57 PM
ABRIL 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	03/05/2017 - 02:42 PM
MARZO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., realiza trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón - Plan de Milagro - Gualaquiza - Chuchumbleta, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Méndez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc	Saavedra Correa, Jose Luis	05/04/2017 - 09:58 AM
FEBRERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., ha realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/03/2017 - 12:25 PM
ENERO 2017.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	07/02/2017 - 09:26 AM
DICIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Saavedra Correa, Jose Luis	05/01/2017 - 05:33 PM
NOVIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a realizado trabajos de mantenimiento rutinario con las siguientes modalidades: orden de compra microempresas, carretera E45, Puente Pastaza Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco - Kalaglas, además por administración directa en las carreteras tramos Puente Pastaza - Macas - Bella Unión Limón - Limón Plan de Milagro - Plan de Milagro - Gualaquiza, carretera Mendez - Morona y la 9 de octubre Macas y cebadas 9 de octubre, se trabaja priorizando estabilización de rellenos, limpieza de drenajes, derrumbes, roza a mano, señalización, etc.	Arias Castro, Franklin	02/12/2016 - 12:25 PM
OCTUBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón, además se ha tenido el aporte de maquinaria de otras Direcciones Provinciales para afrontar sectores críticos y evitar que se suspenda el tráfico vehicular.	Arias Castro, Franklin	01/11/2016 - 11:15 AM
SEPTIEMBRE 2016.- La Dirección Distrital del MTOP MS., en este periodo ha realizado labores de mantenimiento rutinario especialmente en los rubros limpieza y estabilización de taludes, limpieza de drenaje, señalización, roza a mano y bacheo menor y mayor de la calzada, especialmente con contratos de microempresas, y por administración directa con maquinaria de la Dirección Distrital, dandose énfasis y prioridad al paso de la vía Cebadas - 09 de Octubre km. 49+000, vía Mendez Morona y Bella Unión - Limón.	Arias Castro, Franklin	04/10/2016 - 10:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2016.- La Dirección Distrital del MTOP M.S., a trabajado con microempresas de acuerdo a orden de compra en la red vial estatal, además se a ejecutado trabajos por administración directa en sitios criticos para habilitar el paso vehicular debido a derrumbes por desestabilización de taludes, se debe informar que toda la red estatal de la provincia se encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Morona Santiago a excepción de la carretera SIgSIG - Matanga - Gualaquiza que se encuentra en construcción y cargo de la Cia. Sinohydro, es necesario repotenciar la maquinaria para cubrir el mantenimiento rutinario de toda la red vial	Arias Castro, Franklin	06/09/2016 - 04:20 PM
JULIO 2016.- La Dirección Distrital de Morona Santiago ha realizado el mantenimiento por administración directa, con microempresas, y con las Cias. Contratistas dando prioridad a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Bella Unión, Macas 09 de octubre, Cebadas 09 de octubre, Méndez Morona, Sigsig - Gualaquiza; Méndez Guarumales.	Arias Castro, Franklin	05/08/2016 - 03:15 PM
JUNIO 2016.- Se ha realizado mantenimiento rutinario de la provincia con el siguiente detalle: via Plan de Milagro - Limón a cargo de la Cia. Hidrobo Estrada, Méndez - Morona a cargo de la Cia. Foepca, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral a cargo de la Cia. Foepca, Plan de Milagro - San Juan Bosco a cargo de la microempresa Transformando Vías, Sucua Logroño - Bella Unión Tramo Sucua - Logroño a cargo de la microempresa Brisas del Upano, Tramo Logroño Méndez a cargo de la microempresa Esperanza del Futuro, Bella Unión - Limón; Bella Unión - Cumtza, a cargo de la microempresa Luchando por el futuro, San Juan Bosco - Gualaquiza, a cargo del MTOP M.S., Macas - Puente Pastaza a cargo del MTOP M.S., Cebadas 09 de octubre a cargo del MTOP M.S., Sigsig - Matanga - Gualaquiza a cargo de la Cia. Sinohydro	Arias Castro, Franklin	05/07/2016 - 12:50 PM
MAYO 2016.- Maquinaria de la Dirección Distrital del MTOP M.S., se encuentra realizando mantenimiento a las siguientes vías: Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Bella Unión - Cumtza - Limón, Cebadas - 09 de octubre, además la Cia. Hidrobo Estrada pro medio de contrato vigente se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario de la via Plan de Milagro - Limón, Cia Foepca de las vías Mendez - Morona, 09 de octubre - Macas y Paso Lateral, via Mendez - Guarumales, además por medio de orden de trabajo se contrato trabajos de conservación vial con la Asociación Brisas del Upano, tramo Sucua - Logroño, con fecha 12 de mayo de 2016, se adjunta respaldo.	Arias Castro, Franklin	03/06/2016 - 11:06 AM
ABRIL 2016.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., debido a la fuerte estación imperante en la red vial estatal ha priorizado los trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, especialmente en la via 9 de Octubre -Cebadas, Bella Unión - Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco, además la Cia. Foepca ha realizado el mantenimiento de la via, Macas - 9 de octubre y Paso Lateral, Méndez - San José de Morona, lograndose habilitar el tráfico vehicular de manera oportuna	Arias Castro, Franklin	04/05/2016 - 12:04 PM
MARZO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Foepca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión - Limón y Cebadas 9 de octubre y Plan de Milagro - Gualaquiza, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales y habilitación al tráfico vehicular	Arias Castro, Franklin	04/04/2016 - 02:32 PM
FEBRERO 2016.- Los trabajos de mantenimiento rutinario se han realizado con los Contratistas Foepca e Hidrobo Estrada por medio de contratos vigentes, en el mantenimiento rutinario por administración directa estamos trabajando en la via Bella Unión -- Limón y Cebadas 9 de octubre, donde se han producido deslizamientos de taludes, taponamiento de vías, por lo que se a priorizado algunos sectores procediendo a la limpieza de materiales.	Arias Castro, Franklin	02/03/2016 - 11:44 AM
ENERO 2016.- Las empresas contratistas Cia. Hidrobo Estrada, Foepca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de febrero 2016, a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año, se adjuntan documentos de respaldo	Arias Castro, Franklin	04/02/2016 - 03:46 PM
DICIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Foepca estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la via Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa, situación que deberá definirse en el mes de enero a fin de poder programar los indicadores de cumplimiento para este año	Arias Castro, Franklin	05/01/2016 - 02:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2015.- Las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas, la Supervisión del MTOP M.S., en el informe para el año 2016 solicito se incluya la contratación para la remediación sectores criticos, e implementación de maquinaria para cumplir con el mantenimiento de administración directa</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>02/12/2015 - 02:40 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015.- Autoridades Superiores del MTOP deberán pronunciarse y darles disposiciones referente a la remediación de fallas geologicas, a la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>04/11/2015 - 03:35 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>07/10/2015 - 08:31 AM</p>
<p>AGOSTO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza, se insiste en los requerimientos economicos para contratar microempresas</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>01/09/2015 - 10:15 AM</p>
<p>JULIO 2015.- Hasta la presente fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de microempresas de mantenimiento rutinario y emergente para la red via l estatal E45, a cargo de la Dirección Provincial del MTOP Morona Santiago, con Memorando Nro. MTOP-DPMS-2015-605-ME, de fecha Macas, 21 de julio de 2015, solicitando se tramite recursos economicos para el proceso de contratación, unicamente se trabaja en sectores puntuales con maquinaria (equipo básico) limpiando derrumbes con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago, especialmente en la vía cebadas 9 de octubre, Macas Puente Pastaza, Bella Unión Limón, además las empresas contratistas Cia. Verdú, Cuerpo de Ingenieros, Hidrobo Estrada, Fopeco estan cumpliendo con el mantenimiento rutinario de las siguientes vías. Chuchumbleta - Gualaquiza, San Juan Bosco - Gualaquiza, Plan de Milagro - Limón, Mendez - Morona, 9 de octubre Macas, finalmente debo informar que la Cia. Sinohydro tiene a cargo la construcción y mantenimiento de la vía Sigsig - Matanga - Gualaquiza.</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>12/08/2015 - 11:51 AM</p>
<p>JUNIO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de</p>	<p>Arias Castro, Franklin</p>	<p>08/07/2015 - 11:28 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.		
Mayo 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015, estos trabajos deberán ser de manera permanente sin interrupciones.	Arias Castro, Franklin	04/06/2015 - 04:13 PM
Abril 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá realizar los procesos de contratación para contratación de microempresas de mantenimiento rutinario, se trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañía Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros, El Consorcio Rosario, realizan mantenimiento rutinario que está estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Sector El Rosario, Méndez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa de acuerdo con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	06/05/2015 - 03:51 PM
MARZO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores críticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	06/04/2015 - 03:29 PM
FEBRERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por dministración directa continuará con lo programado en el año 2015.	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 10:49 AM
ENERO 2015.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeco, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas el periodo 2015 continuarán, las contratistas deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus	Arias Castro, Franklin	05/03/2015 - 10:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa continuará con lo programado en el año 2015.		
<p>DICIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza, los contratos con microempresas se han cumplido totalmente el periodo 2014, no ha si con las contratistas que deberán continuar hasta cumplir lo que estipula en cada uno de sus contratos, el mantenimiento rutinario por administración directa se ha cumplido con lo programado en el año 2014.</p>	Arias Castro, Franklin	07/01/2015 - 10:41 AM
<p>NOVIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p>	Arias Castro, Franklin	02/12/2014 - 02:23 PM
<p>OCTUBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p>	Arias Castro, Franklin	07/11/2014 - 11:33 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S, trabaja en mantenimiento rutinario: roza a mano, limpieza de drenaje, limpieza de señalización con 7 microempresas desde el puente pastaza hasta la población de limón, además trabaja realizando mantenimiento rutinario por administración directa en los siguientes rubros: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, estabilización de sectores criticos, desde Sucua hasta San Juan Bosco, debo informar que las compañías Fopeca, Consermin, Hidrobo Estrada y Cuerpo de Ingenieros realizan mantenimiento rutinario que esta estipulado en los contratos de construcción, los mismos que trabajan con microempresas contratadas y maquinaria de su propiedad en los siguientes tramos: Cebadas - 9 de octubre, 9 de octubre - Macas y Paso Lateral de Macas, Mendez - Morona, Plan de Milagro - Limón, Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza.</p>	Arias Castro, Franklin	03/10/2014 - 10:01 AM
<p>AGOSTO 2014.- Se trabaja con 7 microempresas de conservación vial en el mantenimiento de la red vial troncal amazonica E45 desde Puente Pastaza hasta Llmón, además existen microempresas de conservación vial a cargo de la Cia Fopeca 9 de octubre - Macas y Paso lateral de Macas y la Carretera Méndez - San José, realizandose los siguientes trabajos: limpieza de derrumbes, limpieza de drenajes, roza a mano, sello de fisuras, mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, arreglo de sectores de hundimientos y asentamientos además se trabaja con maquinaria de la Dirección Provincial de Morona Santiago en los tramos: Sucua - Limón y Plan de Milagro - San Juan Bosco, limpieza de derrumbes, colocación de material en asentamientos, hundimientos, sello de fisuras y nivelación de hundimientos con material asfáltico.</p>	Arias Castro, Franklin	02/09/2014 - 03:58 PM
<p>JULIO 2014.- Se encuentra ejecutando mantenimiento vial limpieza de alcantarillas, limpieza de drenaje, derrumbes a mano, desde el Puente Pastaza hasta Limón. con 6 microempresas, además se encuentra ejecutando mantenimiento rutinario por administración directa en el tramo Bella Unión Limón, Plan de Milagro - San Juan Bosco y Gualaquiza Chiguinda, especialmente en el rubro limpieza de derrumbes y reconfiguración de rasante existente.</p>	Arias Castro, Franklin	05/08/2014 - 11:39 AM
<p>JUNIO 2014.- Las Microempresas continuan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la via troncal amazonica Puente Pastaza - Macas - Limón, además también se encuentra trabajando la maquinaria del MTOP M.S., en el mantenimiento de la carretera Plan de Milagro - Indanza - Gualaquiza; Tramo Plan de Milagro - San Juan Bosco y Carretera Sigsig - Matanga - Gualaquiza; Tramo: El Ideal - La Pradera.</p>	Arias Castro, Franklin	01/08/2014 - 10:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2014.- Las Microempresas continúan trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la vía troncal amazónica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	04/06/2014 - 09:43 AM
ABRIL 2014.- Microempresas se encuentran trabajando en rubros de roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas, en la vía troncal amazónica Puente Pastaza - Macas - Limón	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:03 PM
MARZO 2014.- La Dirección Provincial se encuentra realizando los trámites para el proceso de contratación en el portal de compras públicas en el mantenimiento rutinario	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:02 PM
FEBRERO 2014.- La Dirección Provincial del MTOP M.S., deberá iniciar el proceso para la contratación de las microempresas a nivel provincial.	Arias Castro, Franklin	06/05/2014 - 06:01 PM
ENERO 2014: Trabajos de mantenimiento rutinario con microempresas, están suspendidos hasta efectuar el proceso de contratación para el año 2014.	Arias Castro, Franklin	18/02/2014 - 01:35 PM
DICIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	06/01/2014 - 09:21 AM
NOVIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
OCTUBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre Izquierdo Campoverde,	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	01/12/2013 - 03:14 PM
SEPTIEMBRE 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/11/2013 - 09:49 AM
AGOSTO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/10/2013 - 07:09 AM
JULIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/09/2013 - 07:33 AM
JUNIO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
MAYO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	29/06/2013 - 03:20 PM
ABRIL 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	28/05/2013 - 02:39 PM
MARZO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	04/05/2013 - 08:30 AM
FEBRERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:05 PM
ENERO 2013: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
DICIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	05/04/2013 - 01:04 PM
<p>OCTUBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Se concluye los Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>AGOSTO 2012.- Se continúa realizando obras de Mantenimiento vial, dentro de estas obras están: El trabajo de las Microempresas que realizan mantenimiento de cunetas, alcantarillas, desbroce. Contratos de colocación de Señalización en diferentes tramos de la Red Provincial, Contratos de Mantenimiento de vías que se encuentran a nivel de material de lastre</p> <p>JULIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>JUNIO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>MAYO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>ABRIL 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>MARZO 2012.-Se continúa realizando varias obras de Mantenimiento</p> <p>FEBRERO 2012.-Se ha iniciado con varios trabajos de mantenimiento como la Señalización Vertical y Horizontal en varios tramos de las vías de la Provincia de Morona Santiago, Microempresas para realizar mantenimiento rutinario,</p> <p>ENERO 2012.-Se han considerado varios Proyectos de Mantenimiento dentro de la Provincia</p>	Vásconez Vásquez, Hugo Francisco	02/12/2012 - 10:06 AM

Problemas cerrados: 9, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. El fuerte temporada invernal CAUSARÍA el retraso de la obra</p>	05/11/2019	Jairo Fernando Tipan Guañuna	30 %	10	3	1/2

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/03/2012		01/03/2012		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Inicio Mantenimiento vial con empresas constructoras ejecutado	4-Inicio de Trabajo	02/01/2015		02/01/2015		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento rutinario por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 10%	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/01/2015		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Mantenimiento Vial por administración directa, limpieza de derrumbes, ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	02/06/2015		02/06/2015		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Contratos con Microempresas de mantenimiento rutinario ejecutado	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/05/2016		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Mantenimiento por administracion directa , limpieza de derrumbes ejecutado 60%	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario con Microempresas contrato legalizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		16/05/2016		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano con microempresas ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	01/09/2015		31/08/2016		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario limpieza de drenajes con microempresa ejecutado 50%	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/08/2016		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario roza a mano, con microempresas ejecutado 100%	5-Entregables Intermedios	30/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Culminación trabajos mantenimiento rutinario por administración directa concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Limpieza del Campamento Patuca ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Mantenimiento vial con microempresas, drenaje ejecutado 100%	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2017		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2019	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019			No	1.0
18	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2019	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.0
19	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2019	5-Entregables Intermedios	31/01/2020	31/01/2020			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2020							
21	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2020	5-Entregables Intermedios	30/12/2020	30/12/2020			No	1.0
23	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
24	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2021	31/01/2021			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo ABRIL - JUNIO 2021	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Red Vial Estatal de la Provincia de Morona Santiago periodo OCTUBRE - DICIEMBRE 2021	5-Entregables Intermedios	30/12/2021	30/12/2021			No	1.0
28	CIERRE: Liquidación Económica aprobada 2021	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita 2021	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/01/2022	26/01/2022			No	0.5
30	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	27/01/2022	27/01/2022			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	28/01/2022	28/01/2022			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	29/01/2022	29/01/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	30/01/2022	30/01/2022			No	1.0
34	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2022	31/01/2022			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión positiva se pudo verificar los trabajos de mantenimiento	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	16/03/2016
2	Supervisión positiva del mantenimiento vial en el via del sector del Rosario a General Plaza en Limón Indanza	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/10/2015
3	Supervisión negativa de la ejecución de proyecto de acuerdo al hito 3 de Mantenimiento Vial por administración directa programado	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	17/07/2015
4	Historico - Existen inconvenientes en el mantenimiento de la vía, en el tramo Bella Unión # Cumtza, por falta de equipo caminero.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	02/05/2012
5	Historico - El Ministerio ha procedido a contratar los servicios de conservación vial de la Troncal Amazónica, los mismos que mantienen un buen nivel de servicio.	Arcos Tuitza, Juan Rafael	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	30/03/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Estatal en Buen Estado		99.01 %	0.6363	0.63	01/01/2012	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,503,690.11
Estimado Al Fin Del Proyecto:	12,193,843.65 **
Costo Total:	11,678,967.04
Total Devengado:	10,408,211.01
% Costo Total Devengado:	89.12 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 89.12 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	8,545,508.00	18,228,932.08	0.00	26,774,440.08
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	19,267,292.71	2,441,839.82	0.00	21,709,132.53
Ppto. Codificado	17,140,900.47	2,441,839.82	0.00	19,582,740.29
Ppto. Comprometido	7,526,305.91	0.00	0.00	7,526,305.91
Planeado - Codificado (2019)		15,787,092.26		
Programado a Devengar	15,022,870.50	2,603,786.75	0.00	17,626,657.25
Ppto. Devengado	9,590,056.90	818,154.11	0.00	10,408,211.01
Pagado Real	4,712,727.08	0.00	0.00	4,712,727.08
Estimado a fin de año	* 9,590,056.90	0.00	0.00	9,590,056.90
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,432,813.60	2,603,786.75	0.00	8,036,600.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 63.84 %	31.42 %	0.00 %	59.05 %
Ppto. Codificado 998	290,816.35	0.00	0.00	290,816.35
Ppto. Devengado 998	290,816.35	0.00	0.00	290,816.35

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

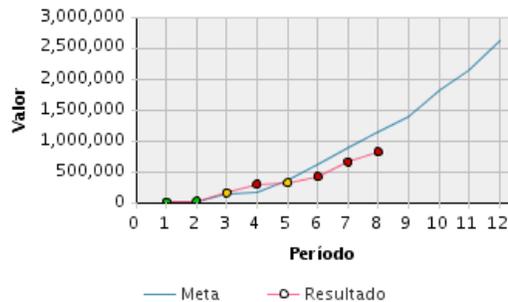

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	11,022.82	11,022.82	11,022.82	11,022.82	100.00 %	●	0.42 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	11,785.53	11,785.53	22,808.35	22,808.35	100.00 %		0.88 %
Mar	119,930.21	137,010.53	142,738.56	159,818.88	111.97 %		6.14 %
Abr	11,785.53	138,044.81	154,524.09	297,863.69	192.76 %		11.44 %
May	209,675.34	22,827.05	364,199.43	320,690.74	88.05 %		12.32 %
Jun	242,325.93	102,570.88	606,525.36	423,261.62	69.78 %		16.26 %
Jul	287,171.06	227,266.39	893,696.42	650,528.01	72.79 %		24.98 %
Ago	236,475.96	167,626.10	1,130,172.38	818,154.11	72.39 %		31.42 %
Sep	255,115.64		1,385,288.02				
Oct	438,239.21		1,823,527.23				
Nov	322,476.91		2,146,004.14				
Dic	457,782.61		2,603,786.75				
Total	2,603,786.75	818,154.11					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
18	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
19	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
20	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo
21	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		23606_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
2	16 DE ABRIL - KALAGLAS	W.5.pdf	05/08/2016
3	1_Informe de cumplimiento_Mantenimiento Vial	1_Informe_de_cumplimiento_Mantenimiento_Vial.pdf	23/01/2018
4	22609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
5	22681_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	22681_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
6	23604_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
7	23604_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
8	23605_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
9	23605_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
10	23606_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
11	23606_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23606_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
12	23607_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
13	23607_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23607_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
14	23608_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
15	23608_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23608_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
16	23609_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
17	23609_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23609_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
18	23610_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
19	23610_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	23611_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
21	23611_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23611_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
22	23612_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
23	23612_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23612_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
24	23614_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
25	23614_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23614_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
26	23615_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
27	23615_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23615_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
28	23616_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
29	23616_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23616_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
30	23617_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
31	23617_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23617_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
32	23618_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
33	23618_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23618_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
34	23619_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
35	23619_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23619_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
36	23620_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23620_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
37	23621_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
38	23621_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23621_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
39	23622_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
40	23622_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23622_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
41	23623_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
42	23623_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23623_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
43	23624_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
44	23624_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23624_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
45	23625_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
46	23625_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23625_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
47	23626_INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
48	23626_INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	23626_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
49	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	T.2.pdf	06/05/2015
50	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18637_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(9_DE_OCTUBRE)2017.pdf	04/01/2018
51	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18639_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(21_MARZO).pdf	04/01/2018
52	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18640_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_SANGAY)2017.pdf	04/01/2018
53	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18641_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(BRISAS_UPANO)2017.pdf	04/01/2018
54	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18643_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(ESPERANZAS_DEL_FUTURO)2017.pdf	04/01/2018
55	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18644_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(HEROES_AMAZONIA)2017.pdf	04/01/2018
56	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 2017	18659_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_(RIO_BLANCO).pdf	04/01/2018
57	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 21 DE MARZO	G.6.pdf	06/05/2014
58	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	G.7.pdf	06/05/2014
59	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL SANGAY	T.1.pdf	06/05/2015
60	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA BRISAS DEL UPANO	G.8.pdf	06/05/2014
61	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CHIGUINDA MATANGA	G.9.pdf	06/05/2014
62	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ESPERANZAS DEL FUTURO	T.3.pdf	06/05/2015
63	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LA ESPERANZA	H.1.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LAS 3 CHORRERAS	H.2.pdf	06/05/2014
65	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	H.3.pdf	06/05/2014
66	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LUCHANDO POR EL FUTURO	T.4.pdf	06/05/2015
67	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA TRES DE OCTUBRE	T.5.pdf	06/05/2015
68	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	H.4.pdf	06/05/2014
69	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA VALLE DEL RIO	T.6.pdf	06/05/2015
70	ACTA RECEPCIÓN DEFINITVA 21 DE MARZO	S.9.pdf	06/05/2015
71	certificacion_presupuestaria_microempresas	certificacion_presupuestaria_microempresas_201160802527008/06/2015	06/06/2015
72	CONTRATO COMPLEMENTARIO ING. JENRY MENDOZA	A.1.pdf	06/05/2014
73	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO	A.5.pdf	06/05/2014
74	CONTRATO MANTENIMIENTO 21 DE MARZO 2014	I.2.pdf	07/05/2014
75	CONTRATO MANTENIMIENTO 3 DE OCTUBRE 2014	I.5.pdf	07/05/2014
76	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY	A.6.pdf	06/05/2014
77	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL SANGAY 2014	I.1.pdf	07/05/2014
78	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO	A.9.pdf	06/05/2014
79	CONTRATO MANTENIMIENTO BRISAS DEL UPANO 2014	I.4.pdf	07/05/2014
80	CONTRATO MANTENIMIENTO ESPERANZA DEL FUTURO	A.4.pdf	06/05/2014
81	CONTRATO MANTENIMIENTO LA ESPERANZA	A.3.pdf	06/05/2014
82	CONTRATO MANTENIMIENTO LAS 3 CHORRERAS	A.8.pdf	06/05/2014
83	CONTRATO MANTENIMIENTO LUCHANDO POR EL FUTURO	A.2.pdf	06/05/2014
84	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO	A.7.pdf	06/05/2014
85	CONTRATO MANTENIMIENTO VALLE DEL RIO 2014	I.3.pdf	07/05/2014
86	FOTOS DE MANTENIMIENTO	S.9.doc	04/06/2015
87	FOTOS DE MANTENIMIENTO ENERO 2016	W.1.doc	04/02/2016
88	FOTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	M.6.doc	06/10/2014
89	FOTOS DEL PROYECTO	T.8.doc	01/12/2015
90	FOTOS DEL PROYECTO	U.1.doc	01/12/2015
91	FOTOS HIDROBO ENERO 2016	W.2.PDF	04/02/2016
92	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA NOVIEMBRE 2014	O.3.doc	05/12/2014
93	FOTOS MANTENIMIENTO DE LA VIA OCTUBRE 2014	N.5.pdf	05/11/2014
94	FOTOS MANTENIMIENTO PROVINCIA	FOTOS_MANTENIMIENTO_PROVINCIA.pdf	05/07/2016
95	FOTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	J.8.pdf	31/07/2014
96	INFORME 074 C - Nov. 2015	U.2.doc	02/12/2015
97	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.1.pdf	06/05/2014
98	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.2.pdf	06/05/2014
99	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.3.pdf	06/05/2014
100	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.4.pdf	06/05/2014
101	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.5.pdf	06/05/2014
102	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.6.pdf	06/05/2014
103	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	B.7.pdf	06/05/2014
104	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.7.pdf	07/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
105	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	I.9.pdf	07/05/2014
106	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.2.pdf	07/05/2014
107	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.4.pdf	07/05/2014
108	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	J.6.pdf	07/05/2014
109	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	9_DE_OCTUBRE.pdf	04/05/2017
110	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	16_DE_ABRIL_- _KALAGLAS.pdf	04/05/2017
111	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	21_DE_MARZO.pdf	04/05/2017
112	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	04/05/2017
113	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	04/05/2017
114	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	04/05/2017
115	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	ESPERANZA_DEL_FUTURO.pdf	04/05/2017
116	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LOS_CEDROS.pdf	04/05/2017
117	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	04/05/2017
118	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	MIRADOR_SHAIME.pdf	04/05/2017
119	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	04/05/2017
120	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TIWINTZA.pdf	04/05/2017
121	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	04/05/2017
122	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	18932.pdf	04/05/2018
123	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20556.pdf	04/05/2018
124	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20557.pdf	04/05/2018
125	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20558.pdf	04/05/2018
126	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20560.pdf	04/05/2018
127	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20561.pdf	04/05/2018
128	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20562.pdf	04/05/2018
129	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20563.pdf	04/05/2018
130	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20564.pdf	04/05/2018
131	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20565.pdf	04/05/2018
132	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20566.pdf	04/05/2018
133	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20567.pdf	04/05/2018
134	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20568.pdf	04/05/2018
135	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20559.pdf	04/05/2018
136	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	20569.pdf	04/05/2018
137	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.8.pdf	06/05/2014
138	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	B.9.pdf	06/05/2014
139	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.1.pdf	06/05/2014
140	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.2.pdf	06/05/2014
141	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.3.pdf	06/05/2014
142	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.4.pdf	06/05/2014
143	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.5.pdf	06/05/2014
144	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	C.6.pdf	06/05/2014
145	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.7.pdf	03/09/2014
146	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.8.pdf	03/09/2014
147	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	J.9.pdf	03/09/2014
148	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.1.pdf	03/09/2014
149	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.2.pdf	03/09/2014
150	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.3.pdf	03/09/2014
151	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	K.4.pdf	05/09/2014
152	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21489.pdf	04/09/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
153	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21493.pdf	04/09/2018
154	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21494.pdf	04/09/2018
155	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21495.pdf	04/09/2018
156	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21498.pdf	04/09/2018
157	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21499.pdf	04/09/2018
158	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21500.pdf	04/09/2018
159	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21501.pdf	04/09/2018
160	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21502.pdf	04/09/2018
161	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21503.pdf	04/09/2018
162	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21504.pdf	04/09/2018
163	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21505.pdf	04/09/2018
164	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21507.pdf	04/09/2018
165	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21508.pdf	04/09/2018
166	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21509.pdf	04/09/2018
167	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21510.pdf	04/09/2018
168	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21512.pdf	04/09/2018
169	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21513.pdf	04/09/2018
170	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21514.pdf	04/09/2018
171	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21515.pdf	04/09/2018
172	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21545.pdf	04/09/2018
173	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21546.pdf	04/09/2018
174	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	21560.pdf	04/09/2018
175	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	H.7.pdf	07/05/2014
176	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.7.pdf	06/01/2015
177	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.8.pdf	06/01/2015
178	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	P.9.pdf	06/01/2015
179	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.1.pdf	06/01/2015
180	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.2.pdf	06/01/2015
181	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.3.pdf	06/01/2015
182	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	Q.4.pdf	06/01/2015
183	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21493.pdf	04/01/2019
184	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21494.pdf	04/01/2019
185	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21495.pdf	04/01/2019
186	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21498.pdf	04/01/2019
187	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21500.pdf	04/01/2019
188	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21503.pdf	04/01/2019
189	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21504.pdf	04/01/2019
190	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21507.pdf	04/01/2019
191	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21508.pdf	04/01/2019
192	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21512.pdf	04/01/2019
193	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21513.pdf	04/01/2019
194	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21514.pdf	04/01/2019
195	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21546.pdf	04/01/2019
196	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21489.pdf	04/01/2019
197	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21509.pdf	04/01/2019
198	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018	21515.pdf	04/01/2019
199	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	H.8.pdf	07/05/2014
200	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.5.pdf	04/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
201	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.6.pdf	04/03/2015
202	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.7.pdf	04/03/2015
203	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.8.pdf	04/03/2015
204	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	Q.9.pdf	04/03/2015
205	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.1.pdf	04/03/2015
206	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	R.2.pdf	04/03/2015
207	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21493.pdf	05/02/2019
208	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21501.pdf	05/02/2019
209	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21502.pdf	05/02/2019
210	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21505.pdf	05/02/2019
211	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21508.pdf	05/02/2019
212	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21510.pdf	05/02/2019
213	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21512.pdf	05/02/2019
214	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21513.pdf	05/02/2019
215	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21545.pdf	05/02/2019
216	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21546.pdf	05/02/2019
217	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21560.pdf	05/02/2019
218	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21507.pdf	05/02/2019
219	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21500.pdf	05/02/2019
220	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	21498.pdf	05/02/2019
221	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	H.9.pdf	07/05/2014
222	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.3.pdf	04/03/2015
223	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.4.pdf	04/03/2015
224	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.5.pdf	04/03/2015
225	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.6.pdf	04/03/2015
226	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.7.pdf	04/03/2015
227	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.8.pdf	04/03/2015
228	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	R.9.pdf	04/03/2015
229	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21493.pdf	01/03/2019
230	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21494.pdf	01/03/2019
231	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21495.pdf	01/03/2019
232	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21503.pdf	01/03/2019
233	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21504.pdf	01/03/2019
234	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21508.pdf	01/03/2019
235	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21512.pdf	01/03/2019
236	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21513.pdf	01/03/2019
237	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21514.pdf	01/03/2019
238	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21546.pdf	01/03/2019
239	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21510.pdf	01/03/2019
240	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21505.pdf	01/03/2019
241	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21560.pdf	01/03/2019
242	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21545.pdf	01/03/2019
243	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21502.pdf	01/03/2019
244	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21499.pdf	01/03/2019
245	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21501.pdf	01/03/2019
246	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21498.pdf	01/03/2019
247	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21507.pdf	01/03/2019
248	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21500.pdf	01/03/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
249	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21489.pdf	01/03/2019
250	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21515.pdf	01/03/2019
251	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	21509.pdf	01/03/2019
252	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.7.pdf	06/05/2014
253	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.8.pdf	06/05/2014
254	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	C.9.pdf	06/05/2014
255	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.1.pdf	06/05/2014
256	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.2.pdf	06/05/2014
257	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.3.pdf	06/05/2014
258	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.4.pdf	06/05/2014
259	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.5.pdf	06/05/2014
260	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	D.6.pdf	06/05/2014
261	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.5.pdf	05/08/2014
262	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.6.pdf	05/08/2014
263	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.7.pdf	05/08/2014
264	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.8.pdf	05/08/2014
265	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	H.9.pdf	05/08/2014
266	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	I.1.pdf	05/08/2014
267	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21489.pdf	02/08/2018
268	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21494.pdf	02/08/2018
269	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21495.pdf	02/08/2018
270	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21498.pdf	02/08/2018
271	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21499.pdf	02/08/2018
272	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21501.pdf	02/08/2018
273	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21502.pdf	02/08/2018
274	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21505.pdf	02/08/2018
275	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21507.pdf	02/08/2018
276	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21509.pdf	02/08/2018
277	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21510.pdf	02/08/2018
278	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21514.pdf	02/08/2018
279	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21515.pdf	02/08/2018
280	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21545.pdf	02/08/2018
281	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	21560.pdf	02/08/2018
282	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.7.pdf	06/05/2014
283	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.8.pdf	06/05/2014
284	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	D.9.pdf	06/05/2014
285	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.1.pdf	06/05/2014
286	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.2.pdf	06/05/2014
287	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.3.pdf	06/05/2014
288	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.4.pdf	06/05/2014
289	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	E.5.pdf	06/05/2014
290	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.8.pdf	08/07/2014
291	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	K.9.pdf	08/07/2014
292	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.1.pdf	08/07/2014
293	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.2.pdf	08/07/2014
294	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.3.pdf	08/07/2014
295	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.4.pdf	08/07/2014
296	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	L.5.pdf	08/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
297	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	5_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
298	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	9_de_octubre.pdf	06/07/2018
299	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	16_DE_ABRIL-KALAGLAS.pdf	06/07/2018
300	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	21_DE_MARZO.pdf	06/07/2018
301	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	06/07/2018
302	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	BRISAS_DEL_UPANO.pdf	06/07/2018
303	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	EL_FUTURO_DE_PATUCA.pdf	06/07/2018
304	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	06/07/2018
305	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA.pdf	06/07/2018
306	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	KIMIUS.pdf	06/07/2018
307	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LOS_CEDROS.pdf	06/07/2018
308	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	06/07/2018
309	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	MIRADOR_SHAIME.pdf	06/07/2018
310	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	PACHECO_ALVAREZ.pdf	06/07/2018
311	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	RIO_BLANCO.pdf	06/07/2018
312	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	06/07/2018
313	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	SAN_VICENTE_FERRER.pdf	06/07/2018
314	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TIWINZA.pdf	06/07/2018
315	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
316	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	TRES_DE_OCTUBRE.pdf	06/07/2018
317	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS.pdf	06/07/2018
318	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	VALLE_DEL_RIO.pdf	06/07/2018
319	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	ZUÑAG-19_DE_AGOSTO.pdf	06/07/2018
320	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23604.pdf	05/07/2019
321	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23605.pdf	05/07/2019
322	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23606.pdf	05/07/2019
323	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23607.pdf	05/07/2019
324	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23608.pdf	05/07/2019
325	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23609.pdf	05/07/2019
326	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23610.pdf	05/07/2019
327	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23611.pdf	05/07/2019
328	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23612.pdf	05/07/2019
329	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	23614.pdf	05/07/2019
330	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.6.pdf	06/05/2014
331	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.7.pdf	06/05/2014
332	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.8.pdf	06/05/2014
333	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	E.9.pdf	06/05/2014
334	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.1.pdf	06/05/2014
335	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.2.pdf	06/05/2014
336	INFORME EJECUTIVO MARZO 2012	F.3.pdf	06/05/2014
337	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.6.pdf	07/05/2014
338	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	I.8.pdf	07/05/2014
339	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.1.pdf	07/05/2014
340	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.3.pdf	07/05/2014
341	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	J.5.pdf	07/05/2014
342	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.1.pdf	06/04/2015
343	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.2.pdf	06/04/2015
344	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.3.pdf	06/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
345	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.4.pdf	06/04/2015
346	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.5.pdf	06/04/2015
347	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.6.pdf	06/04/2015
348	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	S.7.pdf	06/04/2015
349	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	3_DE_OCTUBRE_20564.pdf	05/04/2018
350	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	9_DE_OCTUBRE_20559.pdf	05/04/2018
351	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	16_DE_ABRIL_- KALAGLAS_20565.pdf	05/04/2018
352	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	21_DE_MARZO_20557.pdf	05/04/2018
353	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	BRISAS_DEL_SANGAY_20558.pdf	05/04/2018
354	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	ESPERANZA_DEL_FUTURO_20561.pdf	05/04/2018
355	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	FUTURO_DE_PATUCA_20568.pdf	05/04/2018
356	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	HEROES_DE_LA_AMAZONIA_20556.pdf	05/04/2018
357	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	KIMIUS_20569.pdf	05/04/2018
358	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LOS_CEDROS_20566.pdf	05/04/2018
359	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	LUCHANDO_POR_EL_FUTURO_20563.pdf	05/04/2018
360	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	RIO_BLANCO_20560.pdf	05/04/2018
361	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_20567.pdf	05/04/2018
362	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	VALLE_DEL_RIO_20562.pdf	05/04/2018
363	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	20566.pdf	04/05/2018
364	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21489.pdf	05/04/2019
365	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21493.pdf	05/04/2019
366	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21494.pdf	05/04/2019
367	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21495.pdf	05/04/2019
368	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21498.pdf	05/04/2019
369	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21500.pdf	05/04/2019
370	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21503.pdf	05/04/2019
371	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21504.pdf	05/04/2019
372	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21507.pdf	05/04/2019
373	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21508.pdf	05/04/2019
374	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21509.pdf	05/04/2019
375	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21512.pdf	05/04/2019
376	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21513.pdf	05/04/2019
377	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21514.pdf	05/04/2019
378	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21515.pdf	05/04/2019
379	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21546.pdf	05/04/2019
380	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21501.pdf	05/04/2019
381	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21499.pdf	05/04/2019
382	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21545.pdf	05/04/2019
383	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21560.pdf	05/04/2019
384	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21510.pdf	05/04/2019
385	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21505.pdf	05/04/2019
386	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	21502.pdf	05/04/2019
387	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.4.pdf	06/05/2014
388	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.5.pdf	06/05/2014
389	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.6.pdf	06/05/2014
390	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.7.pdf	06/05/2014
391	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.8.pdf	06/05/2014
392	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	F.9.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
393	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.1.pdf	06/05/2014
394	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	G.2.pdf	06/05/2014
395	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.8.pdf	04/06/2014
396	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	J.9.pdf	04/06/2014
397	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.1.pdf	04/06/2014
398	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.2.pdf	04/06/2014
399	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.3.pdf	04/06/2014
400	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	K.4.pdf	04/06/2014
401	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	H.6.pdf	07/05/2014
402	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.5.pdf	02/12/2014
403	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.6.pdf	02/12/2014
404	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.7.pdf	02/12/2014
405	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.8.pdf	02/12/2014
406	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	N.9.pdf	02/12/2014
407	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.1.pdf	02/12/2014
408	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	O.2.pdf	02/12/2014
409	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18638.pdf	04/12/2017
410	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18642.pdf	04/12/2017
411	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18645.pdf	04/12/2017
412	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18646.pdf	04/12/2017
413	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18656.pdf	04/12/2017
414	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18658.pdf	04/12/2017
415	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18660.pdf	04/12/2017
416	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18661.pdf	04/12/2017
417	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18662.pdf	04/12/2017
418	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18682.pdf	04/12/2017
419	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	id_contrato_18931.pdf	04/12/2017
420	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18644_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
421	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18659_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
422	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18932_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
423	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_19118_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
424	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18641_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
425	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18643_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
426	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18640_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
427	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18639_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
428	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	ID_18637_INFORME_EJECUTIVO.pdf	06/12/2017
429	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
430	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21493.pdf	05/12/2018
431	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21503.pdf	05/12/2018
432	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21504.pdf	05/12/2018
433	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21508.pdf	05/12/2018
434	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21509.pdf	05/12/2018
435	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21512.pdf	05/12/2018
436	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21513.pdf	05/12/2018
437	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21515.pdf	05/12/2018
438	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21546.pdf	05/12/2018
439	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21489.pdf	05/12/2018
440	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21494.pdf	05/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
441	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21495.pdf	05/12/2018
442	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21498.pdf	05/12/2018
443	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21500.pdf	05/12/2018
444	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21507.pdf	05/12/2018
445	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	21514.pdf	05/12/2018
446	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	H.5.pdf	07/05/2014
447	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.7.pdf	05/11/2014
448	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.8.pdf	05/11/2014
449	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	M.9.pdf	05/11/2014
450	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.1.pdf	05/11/2014
451	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.2.pdf	05/11/2014
452	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.3.pdf	05/11/2014
453	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	N.4.pdf	05/11/2014
454	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18637.pdf	01/11/2017
455	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18639.pdf	01/11/2017
456	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18641.pdf	01/11/2017
457	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18643.pdf	01/11/2017
458	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18644.pdf	01/11/2017
459	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18659.pdf	01/11/2017
460	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_18932.pdf	01/11/2017
461	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	ID_CONTRATO_19118.pdf	01/11/2017
462	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21493.pdf	05/11/2018
463	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21498.pdf	05/11/2018
464	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21500.pdf	05/11/2018
465	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21503.pdf	05/11/2018
466	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21504.pdf	05/11/2018
467	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21507.pdf	05/11/2018
468	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21508.pdf	05/11/2018
469	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21512.pdf	05/11/2018
470	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21513.pdf	05/11/2018
471	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	21546.pdf	05/11/2018
472	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23604_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
473	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23605_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
474	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	23610_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
475	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.3.pdf	06/05/2014
476	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.4.pdf	06/05/2014
477	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	G.5.pdf	06/05/2014
478	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.8.pdf	06/10/2014
479	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	L.9.pdf	06/10/2014
480	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.1.pdf	06/10/2014
481	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.2.pdf	06/10/2014
482	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.3.pdf	06/10/2014
483	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.4.pdf	06/10/2014
484	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	M.5.pdf	06/10/2014
485	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21489.pdf	04/10/2018
486	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21493.pdf	04/10/2018
487	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21494.pdf	04/10/2018
488	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21495.pdf	04/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
489	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21499.pdf	04/10/2018
490	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21501.pdf	04/10/2018
491	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21502.pdf	04/10/2018
492	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21503.pdf	04/10/2018
493	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21504.pdf	04/10/2018
494	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21505.pdf	04/10/2018
495	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21508.pdf	04/10/2018
496	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21509.pdf	04/10/2018
497	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21510.pdf	04/10/2018
498	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21512.pdf	04/10/2018
499	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21513.pdf	04/10/2018
500	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21514.pdf	04/10/2018
501	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21515.pdf	04/10/2018
502	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21545.pdf	04/10/2018
503	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21546.pdf	04/10/2018
504	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	21560.pdf	04/10/2018
505	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23604.pdf	04/10/2019
506	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23605.pdf	04/10/2019
507	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23606.pdf	04/10/2019
508	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23607.pdf	04/10/2019
509	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23609.pdf	04/10/2019
510	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	23611.pdf	04/10/2019
511	INFORME MECANICO JULIO 2016	W.7.xls	05/08/2016
512	INFORME MECANICO ABRIL 2015	S.8.xls	06/05/2015
513	INFORME MECANICO ABRIL 2016	W.3.xls	04/05/2016
514	INFORME MECANICO AGOSTO 2014	K.4.xls	05/09/2014
515	INFORME MECANICO DICIEMBRE 2015	U.6.xls	06/01/2016
516	INFORME MECANICO ENERO 2016	U.8.xls	03/02/2016
517	INFORME MECANICO JULIO 2015	T.2.xls	12/08/2015
518	INFORME MECANICO JUNIO 2015	T.1.xls	08/07/2015
519	INFORME MECANICO MARZO 2015	S.8.xls	06/04/2015
520	INFORME MECANICO MARZO 2016	INFORME_MECANICO_MARZO_2016.xls	05/04/2016
521	INFORME MECANICO MAYO 2015	S.9.xls	05/06/2015
522	INFORME MECANICO MAYO 2016	V.8.xls	03/06/2016
523	INFORME MECANICO NOVIEMBRE 2015	U.4.xls	03/12/2015
524	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2014	M.6.xls	07/10/2014
525	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.1.pdf	04/10/2016
526	INFORME MECANICO SEPTIEMBRE 2016	Y.2.xls	04/10/2016
527	INFORME MECÁNICO NOVIEMBRE 2014	O.3.xls	05/12/2014
528	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.8.doc	08/09/2014
529	INSPECCIÓN FALLAS GEOLOGICAS PARA MANTENIMIENTO	K.9.doc	08/09/2014
530	MANTENIMIENTO CARRETERA GUALAQUIZA - MATANGA	K.6.pdf	03/07/2014
531	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	T.8.doc	06/11/2015
532	MANTENIMIENTO VIAL PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO	K.7.pdf	03/07/2014
533	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA	K.5.pdf	03/07/2014
534	MTOP-ADM_MOR-2016-8-ME	V.1.pdf	03/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
535	mtop-cgp-2016-30-me	V.4.pdf	04/02/2016
536	MTOP-CON_MOR-2016-22-ME	V.2.pdf	03/02/2016
537	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.3.pdf	03/02/2016
538	MTOP-CON_MOR-2016-24-ME	V.5.pdf	04/02/2016
539	MTOP-CONS_MOR-2016-1-ME	V.6.pdf	04/02/2016
540	MTOP-DDMS-2016-390-ME	W.5.pdf	04/05/2016
541	MTOP-DDMS-2016-465-ME	V.9.pdf	03/06/2016
542	MTOP-DDMS-2016-491-ME	MTOP-DDMS-2016-491-ME.pdf	05/07/2016
543	MTOP-DDMS-2016-609-ME	W.9.pdf	05/08/2016
544	MTOP-DDMS-2016-808-ME	W.9.pdf	05/12/2016
545	MTOP-DPMS-2015-605-ME	T.3.pdf	12/08/2015
546	MTOP-DPMS-2015-945-ME-1	U.3.pdf	03/12/2015
547	MTOP-DPMS-2016-53-ME	V.7.pdf	04/02/2016
548	MTOP-DPMS-2016-79-ME	V.8.pdf	04/02/2016
549	MTOP-FINAN_MOR-2016-3-ME	V.9.pdf	04/02/2016
550	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS.pdf	05/04/2017
551	ORDEN DE COMPRA 16 DE ABRIL - KALAGLAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_16_DE_ABRIL_-_KALAGLAS_2019.pdf	02/05/2019
552	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO.pdf	05/04/2017
553	ORDEN DE COMPRA 21 DE MARZO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_21_DE_MARZO_2019.pdf	02/05/2019
554	ORDEN DE COMPRA 5 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_5_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
555	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE 2019	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE_2019.pdf	02/05/2019
556	ORDEN DE COMPRA 9 DE OCTUBRE/2017	ORDEN_DE_COMPRA_9_DE_OCTUBRE.pdf	05/04/2017
557	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY.pdf	05/04/2017
558	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL SANGAY 2019	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_SANGAY_2019.pdf	02/05/2019
559	ORDEN DE COMPRA BRISAS DEL UPANO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_BRISAS_DEL_UPANO.pdf	05/04/2017
560	ORDEN DE COMPRA CASCADAS DE CUGUSHA	ORDEN_DE_COMPRA_CASCADAS_DE_CUGUSHA.pdf	03/05/2017
561	ORDEN DE COMPRA EL FUTURO DE PATUCA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_EL_FUTURO_DE_PATUCA_2019.pdf	02/05/2019
562	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO.pdf	05/04/2017
563	ORDEN DE COMPRA ESPERANZAS DEL FUTURO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ESPERANZAS_DEL_FUTURO_2019.pdf	02/05/2019
564	ORDEN DE COMPRA HEROES DE LA AMAZONIA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_HEROES_DE_LA_AMAZONIA_2019.pdf	02/05/2019
565	ORDEN DE COMPRA KIMIUS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_KIMIUS_2019.pdf	02/05/2019
566	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS.pdf	05/04/2017
567	ORDEN DE COMPRA LOS CEDROS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_LOS_CEDROS_2019.pdf	02/05/2019
568	ORDEN DE COMPRA LUCHANDO POR EL FUTURO 2017	ORDEN_DE_COMPRA_LUCHANDO_POR_EL_FUTURO.pdf	05/04/2017
569	ORDEN DE COMPRA MARZO2017_MIRADOR SHAIME 2017	ORDEN_DE_COMPRA_MARZO2017_MIRADOR_SHAIME-10540	05/04/2017
570	ORDEN DE COMPRA PACHECO ALVAREZ	ORDEN_DE_COMPRA_PACHECO_ALVAREZ.pdf	03/05/2017
571	ORDEN DE COMPRA RIO BLANCO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_RIO_BLANCO_2019.pdf	02/05/2019
572	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA.pdf	05/04/2017
573	ORDEN DE COMPRA SAN PEDRO DE GUALAQUIZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_PEDRO_DE_GUALAQUIZA_2019.pdf	02/05/2019
574	ORDEN DE COMPRA SAN VICENTE FERRER 2019	ORDEN_DE_COMPRA_SAN_VICENTE_FERRER_2019.pdf	02/05/2019
575	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA.pdf	05/04/2017
576	ORDEN DE COMPRA TIWINTZA 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TIWINTZA_2019.pdf	02/05/2019
577	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2017	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS.pdf	05/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
578	ORDEN DE COMPRA TRANSFORMANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_TRANSFORMANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
579	ORDEN DE COMPRA UNIDOS CONSERVANDO VIAS 2019	ORDEN_DE_COMPRA_UNIDOS_CONSERVANDO_VIAS_2019.pdf	02/05/2019
580	ORDEN DE COMPRA VALLE DEL RIO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_VALLE_DEL_RIO_2019.pdf	02/05/2019
581	ORDEN DE COMPRA ZUÑAC 19 DE AGOSTO 2019	ORDEN_DE_COMPRA_ZUÑAC_19_DE_AGOSTO_2019.pdf	02/05/2019
582	orden de compra_mantenimiento vial-sucua-logroño	V.7.pdf	03/06/2016
583	PINTURA DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS JURUMBAINO, BLANCO, TIMBIANA Y ARAPICOS	L.6.pdf	16/09/2014
584	RECORRIDO INSPECCION FUNCIONARIOS	T.9.doc	01/12/2015
585	REPORTE DE MAQUINARIA NOVIEMBRE 2015	U.5.pdf	03/12/2015
586	REPORTE DE PRESUPUESTO ABRIL 2014	O.7.pdf	24/12/2014
587	REPORTE DE PRESUPUESTO AGOSTO 2014	P.2.pdf	24/12/2014
588	REPORTE DE PRESUPUESTO DICIEMBRE 2014	P.6.pdf	24/12/2014
589	REPORTE DE PRESUPUESTO ENERO 2014	O.4.pdf	24/12/2014
590	REPORTE DE PRESUPUESTO FEBRERO 2014	O.5.pdf	24/12/2014
591	REPORTE DE PRESUPUESTO JULIO 2014	P.1.pdf	24/12/2014
592	REPORTE DE PRESUPUESTO JUNIO 2014	O.9.pdf	24/12/2014
593	REPORTE DE PRESUPUESTO MARZO 2014	O.6.pdf	24/12/2014
594	REPORTE DE PRESUPUESTO MAYO 2014	O.8.pdf	24/12/2014
595	REPORTE DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014	P.5.pdf	24/12/2014
596	REPORTE DE PRESUPUESTO OCTUBRE 2014	P.4.pdf	24/12/2014
597	REPORTE DE PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2014	P.3.pdf	24/12/2014
598	REPORTE GRAFICO ABRIL 2016	W.4.pdf	04/05/2016
599	REPORTE LEGALIZADO ENERO 2016	U.9.pdf	03/02/2016
600	REPORTE MECANICO OCTUBRE 2015	T.7.xls	06/11/2015
601	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.5.pdf	07/10/2015
602	REPORTE MECANICO SEPTIEMBRE	T.6.xls	07/10/2015
603	resolucion_de_contratacion_transformando_vias	resolucion_de_contratacion_transformando_vias.doc	05/07/2016
604	RESUMEN DICIEMBRE 2015	U.7.pdf	06/01/2016
605	RESUMEN INFORME MECANICO JULIO 2016	W.8.pdf	05/08/2016
606	SAN PEDRO DE GUALAQUIZA	W.6.pdf	05/08/2016
607	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA GUALAQUIZA - CHIGUINDA	J.7.pdf	07/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	FINANCIERO MTOP			
	ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MTOP			
Jaramillo Vintimilla, José Francisco	PATROCINADOR EJECUTIVO MTOP	Subsecretario Zonal 6	jjaramillo@mtop.gob.ec	
Saavedra Correa, Jose Luis	ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MTOP	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Morona Santiago	jsaavedra@mtop.gob.ec	64021
Tipan Guañuna, Jairo Fernando	SUPERVISOR VIAL MTOP ETAPA DE MANTENIMIENTO	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital/ Líder de Proyecto	jtipan@mtop.gob.ec	64213

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
38711_1.jpg	02/07/2019
